


**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING
(BATC)
BATC/24/0030**

Pembangunan FTTH Perumahan agung permai Tahap II

Pada hari ini, Rabu tanggal 9 Oktober 2024 telah dilaksanakan Pembangunan FTTH Perumahan agung permai Tahap II sesuai dengan No. PUO/24/0163 tanggal 4 September 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Terpal Alas bongkar alas piping blok ,dan Galian Tanah	PCS	1	1	
2	Material Pasir dan semen perbaikan CANSTEN dan PIPING blok dan dudukan SUB ODP	LS	1	1	
	Jasa				
1	Boring ASPAL /BETON jalan Masuk Perumahan 3 Titik	MTR	40	40	
2	BONGKAR PASANG PIPING BLOK/CANSTENN jalur kabel distribusi	MTR	900	900	
3	GALIAN TANAH dalam Perumahan jalur DISTRIBUSI dan Ikr	MTR	1,050	1,050	
4	Penarikan FO 48 core dari Sub ODP ke masing2 ODP	MTR	900	900	
5	Penarikan Subduct HDPE Kabel DISTRIBUSI sampai	MTR	900	900	
6	PenarikanSubduct HDPE jalur IKR antara BOX KWH	MTR	1,050	1,050	
7	Bobok beton kwh Jalur Kabel	TITIK	54	54	
8	Pengecoran Pondasi Sub ODP splitter 1 :16	UNT	1	1	
9	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	10	10	
10	Splacing dan otdr	COR	24	24	
11	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			PT Sinar Kasih Teknologi Indonesia
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Senior FO Officer	 Eddy Naibaho Deputy CORO	 Timbul Nainggolan CORO GM Kepri	 Romulo Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0278

Pembangunan FTTH Perumahan agung permai Tahap II

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 09 October 2024

Purchase Order : PUO/24/0163
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Terpal Alas bongkar alas piping blok ,dan Galian Tanah	PCS	1.00	1.00	
2.	Material Pasir dan semen perbaikan CANSTEN dan PIPING blok dan dudukan SUB ODP	LS	1.00	1.00	
3.	Boring ASPAL /BETON jalan Masuk Perumahan 3 Titik	MTR	40.00	40.00	
4.	BONGKAR PASANG PIPING BLOK/CANSTENN jalur kabel distribusi	MTR	900.00	900.00	
5.	GALIAN TANAH dalam Perumahan jalur DISTRIBUSI dan Ikr	MTR	1,050.00	1,050.00	
6.	Penarikan FO 48 core dari Sub ODP ke masing2 ODP	MTR	900.00 ✓	900.00	
7.	Penarikan Subduct HDPE Kabel DISTRIBUSI sampai ke setiap ODP (Distribusi)	MTR	900.00 ✓	900.00	
8.	PenarikanSubduct HDPE jalur IKR antara BOX KWH	MTR	1,050.00 ✓	1,050.00	
9.	Bobok beton kwh Jalur Kabel	TITIK	54.00	54.00	
10.	Pengecoran Pondasi Sub ODP spliter 1 :16	UNT	1.00 ✓	1.00	
11.	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	10.00 ✓	10.00	
12.	Splacing dan otdr	COR	24.00	24.00	
13.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 9 Oct 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi
User Mengetahui

**SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,
PT**

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0278

Pembangunan FTTH Perumahan agung permal Tahap II


Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 09 October 2024

Purchase Order : PUO/24/0163
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

 Ibrahim	 Eddy Naibaho		Vendor  ROMULO NADEAK		
--	---	--	---	--	--

Menyetujui,


Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN 21/	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah








BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)

BAL/24/0278

Pembangunan FTTH Perumahan agung permai Tahap II

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 09 October 2024


Purchase Order : PUO/24/0163
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan								
 Ibrahim	 Eddy Naibaho		Vendor  ROMULO NADEAK										
Menyetujui,													
 Timbul Nainggolan, General Manager													
<table><tr><td colspan="2">IT-GRN 24/000226.....</td></tr><tr><td>Input & Check By</td><td>Posted By</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Risna Ulri Susanti</td><td>Apriansah</td></tr></table>						IT-GRN 24/000226.....		Input & Check By	Posted By			Risna Ulri Susanti	Apriansah
IT-GRN 24/000226.....													
Input & Check By	Posted By												
													
Risna Ulri Susanti	Apriansah												

DOKUMENTASI FTTH AGUNG PERMAI TAHAP2



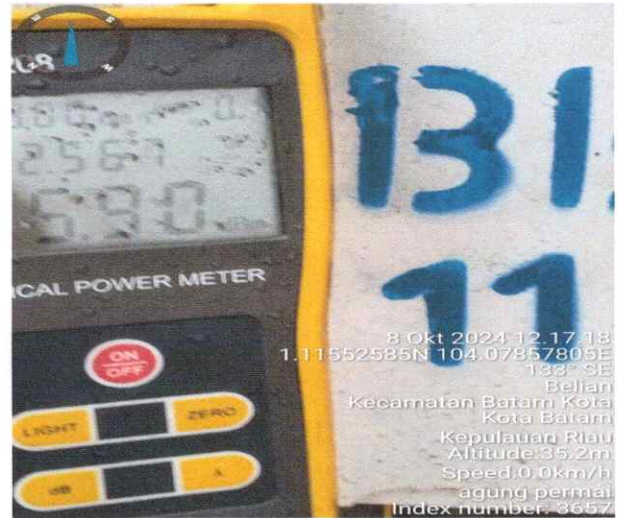ODP 10




ODP 11



ODP 12



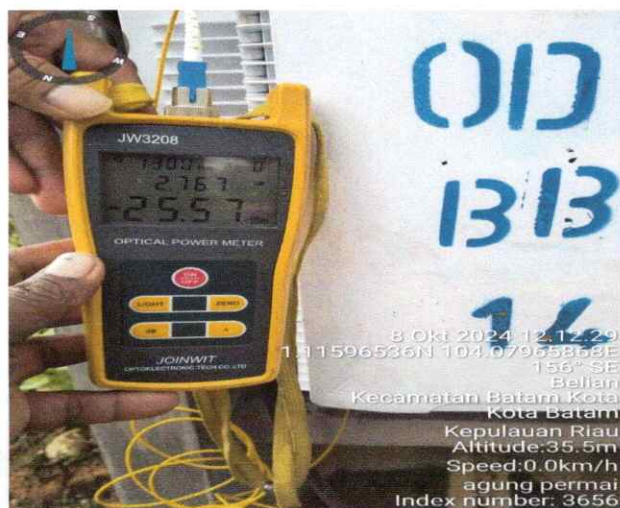ODP 13



ODP 14



ODP 15

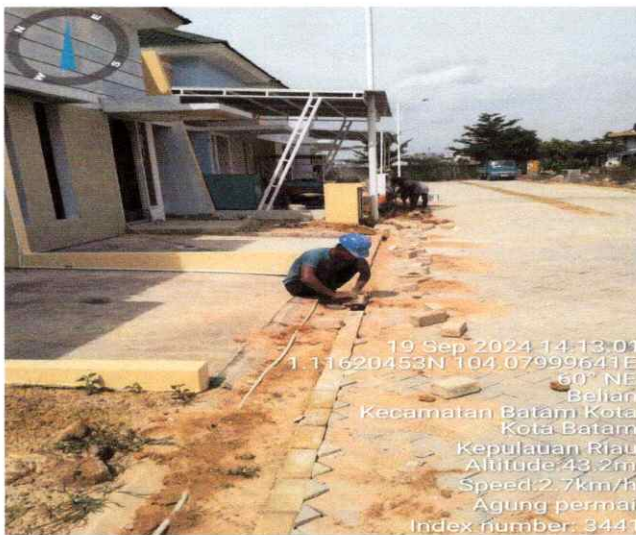
DOKUMENTASI FTTH AGUNG PERMAI TAHAP2




SUB ODP



GALIAN TANAH



PASANG PAVING

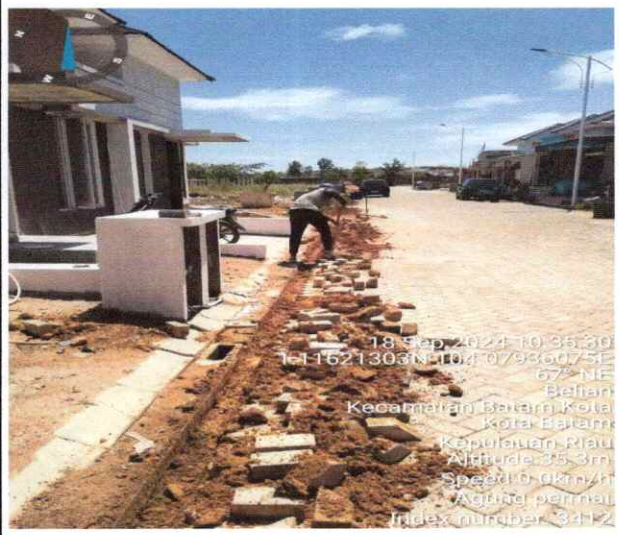

BONGKAR PAVING



SUB ODP TERBUKA

DOKUMENTASI FTTH AGUNG PERMAI TAHAP2




ODP 16



ODP 17



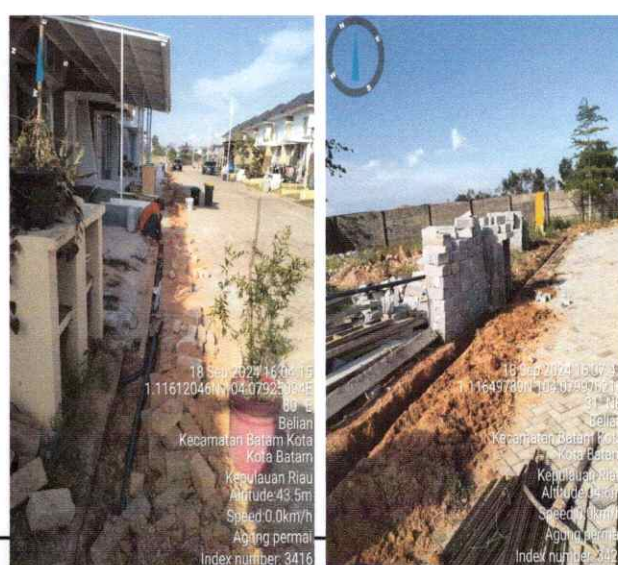ODP 18



DOKUMENTASI FTTH AGUNG PERMAI TAHAP2



BONGKAR PAVING



DOKUMENTASI FTTH AGUNG PERMAI TAHAP2



BOBOK BETON KWH JALUR KABEL



PASANG HDPE



PEMBERSIHAN LOKASI KERJA



GALIAN FINISING



KWH DAN PAVING



PAVING BLOK FINISING

DOKUMENTASI FTTH AGUNG PERMAI TAHAP2



TARIK HDPE



BONGKAR PASANG PAVING BLOK



BONGKAR PASANG PAVING BLOK



HDPE



BONGKAR PAVING



PASANG PAVING KEMBALI

DOKUMENTASI FTTH AGUNG PERMAI TAHAP2



TERMINASI ODP



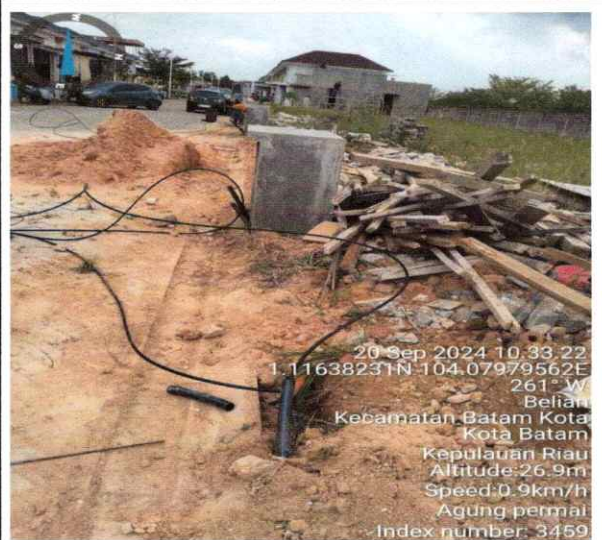
TARIK KABEL



TERMINASI ODP



TARIK KABEL



TARIK KABEL



TARIK KABEL

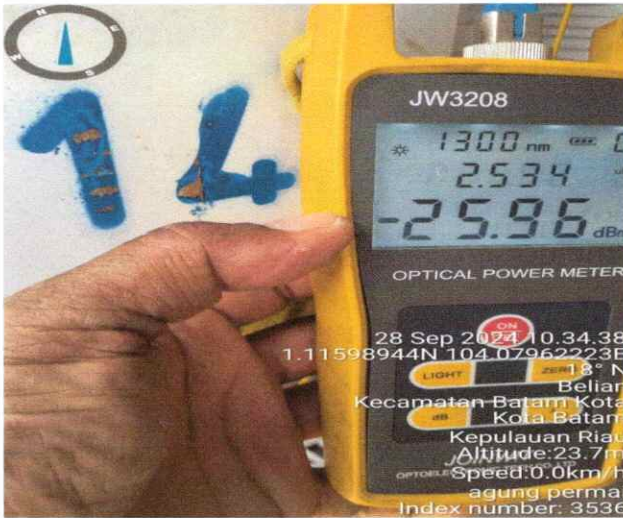
DOKUMENTASI FTTH AGUNG PERMAI TAHAP2



GALIAN TANAH



GALIAN TANAH



TEST POWER PON DI ODP



GALIAN TANAH



GALIAN TANAH



PEMASANGAN ODP

DOKUMENTASI FTTH AGUNG PERMAI TAHAP2



UJI TERIMA



POWER PON ODP



UJI TERIMA SUB ODP



TEST POWER DI SUB ODP



UJI TERIMA SUB ODP



UJI TERIMA

