

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/  
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

**BAL/24/0279**

**IKG Penarikan Kabel 6 Core Lot 142 Dan Lot 3**

Supplier Code : VOB-0120  
Document Date : 09 October 2024

Purchase Order : PUO/24/0185  
Page No. : 1

| No. | DESCRIPTION               | UOM    | BOQ   | Realisasi | Keterangan |
|-----|---------------------------|--------|-------|-----------|------------|
| 1.  | pipa pvc paralon 1 inch   | BATANG | 30.00 | 30.00     |            |
| 2.  | Penarikan kabel FO 6 core | MTR    | 65.00 | 65.00     |            |
| 3.  | Splasing Optic            | COR    | 24.00 | 24.00     |            |
| 4.  | Pemasangan OTB rack       | UNT    | 2.00  | 2.00      |            |

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 9 Oct 2024

**PT. Batam Bintang Telekomunikasi**

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Naibaho

**SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,  
PT**

Vendor



ROMULO NADEAK

Menyetujui,



**Timbul Nainggolan,**

**General Manager**

| IT-GRN 24/                                                                           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Input & Check By                                                                     | Posted By |
|  |           |
| Risna Uli Susanti                                                                    | Apriansah |

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/  
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)  
BAL/24/0279  
IKG Penarikan Kabel 6 Core Lot 142 Dan Lot 3

|               |                   |                |               |
|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| Supplier Code | : VOB-0120        | Purchase Order | : PUO/24/0185 |
| Document Date | : 09 October 2024 | Page No.       | : 1           |

| No. | DESCRIPTION               | UOM    | BOQ   | Realisasi | Keterangan |
|-----|---------------------------|--------|-------|-----------|------------|
| 1.  | pipa pvc paralon 1 inch   | BATANG | 30.00 | 30.00     |            |
| 2.  | Penarikan kabel FO 6 core | MTR    | 65.00 | 65.00     |            |
| 3.  | Splasing Optic            | COR    | 24.00 | 24.00     |            |
| 4.  | Pemasangan OTB rack       | UNT    | 2.00  | 2.00      |            |

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.  
Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya


Batam , 9 Oct 2024  
PT. Batam Bintang Telekomunikasi  
User Mengetahui


  
Ibrahim  
  
Eddy Naibaho


SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,  
PT  
Vendor





ROMULO NADEAK

Menyetujui,  
  
Timbul Nainggolan  
General Manager

|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IT-GRN 24/000 227                                                                    |                                                                                       |
| Input & Check By                                                                     | Post By                                                                               |
|  |  |
| Risna Uli Susanti                                                                    | Apriansah                                                                             |



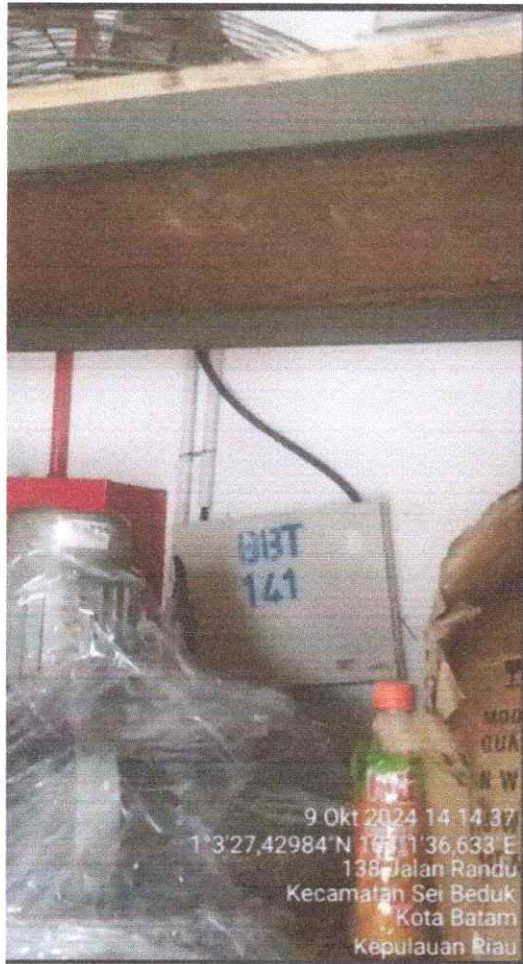




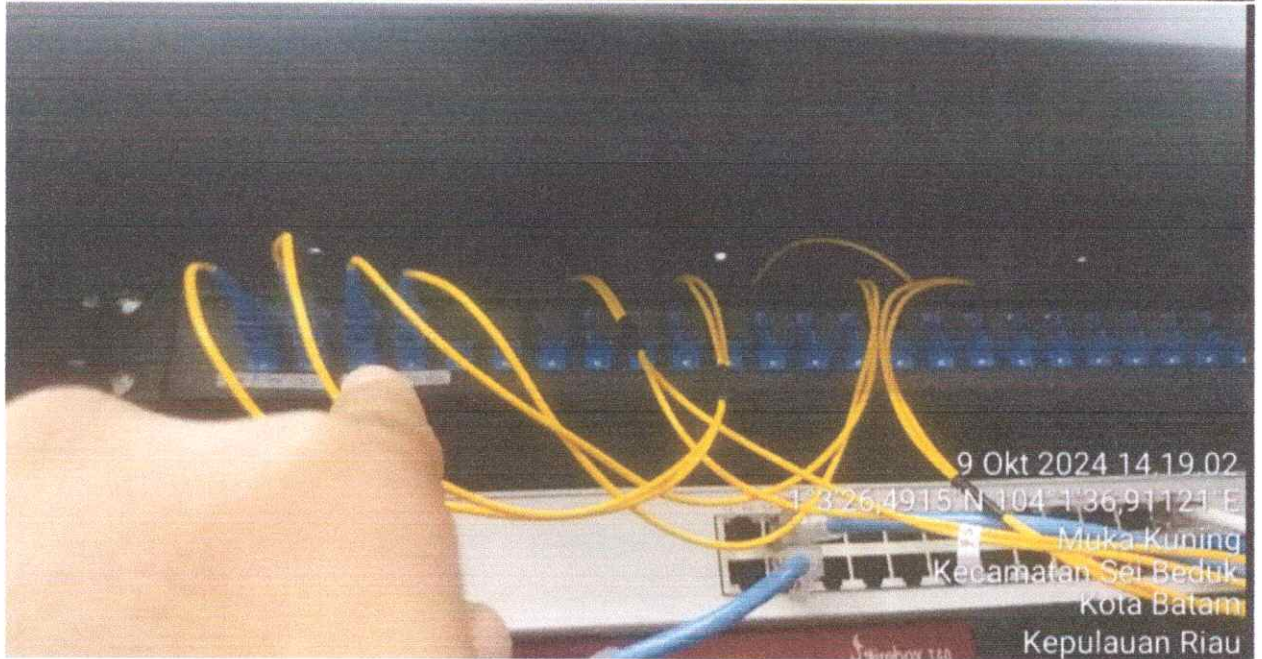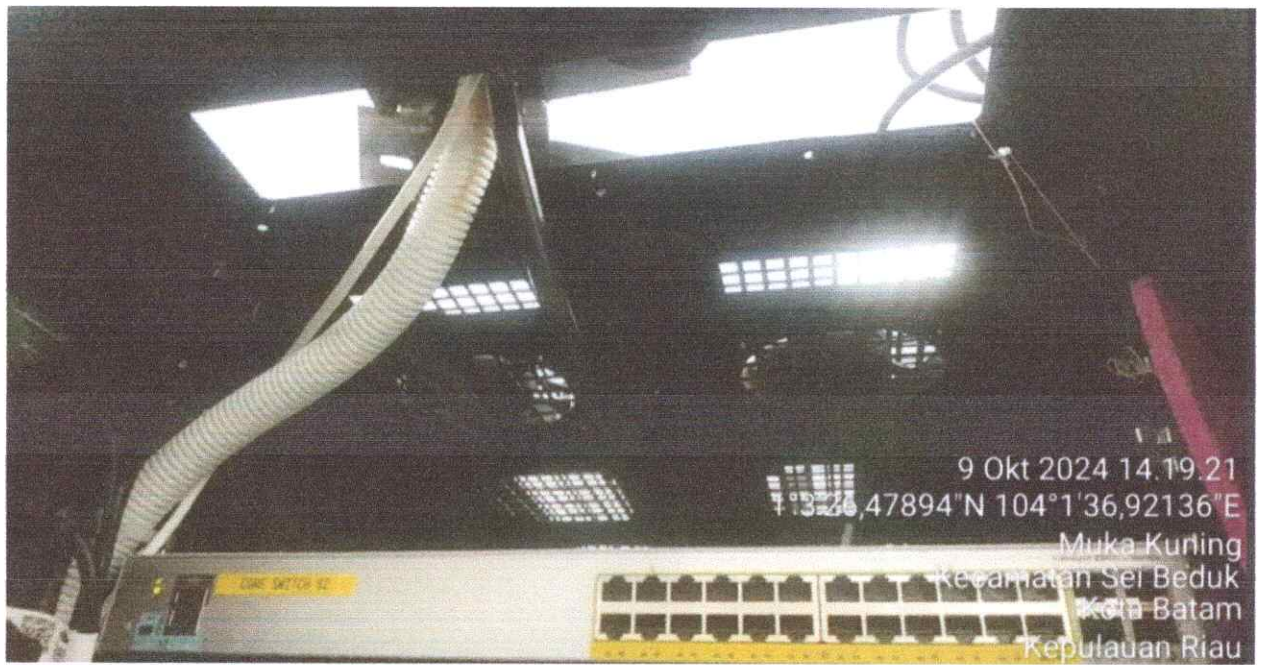



IKG Penarikan Kabel 6 Core Lot 142 Dan Lot 3

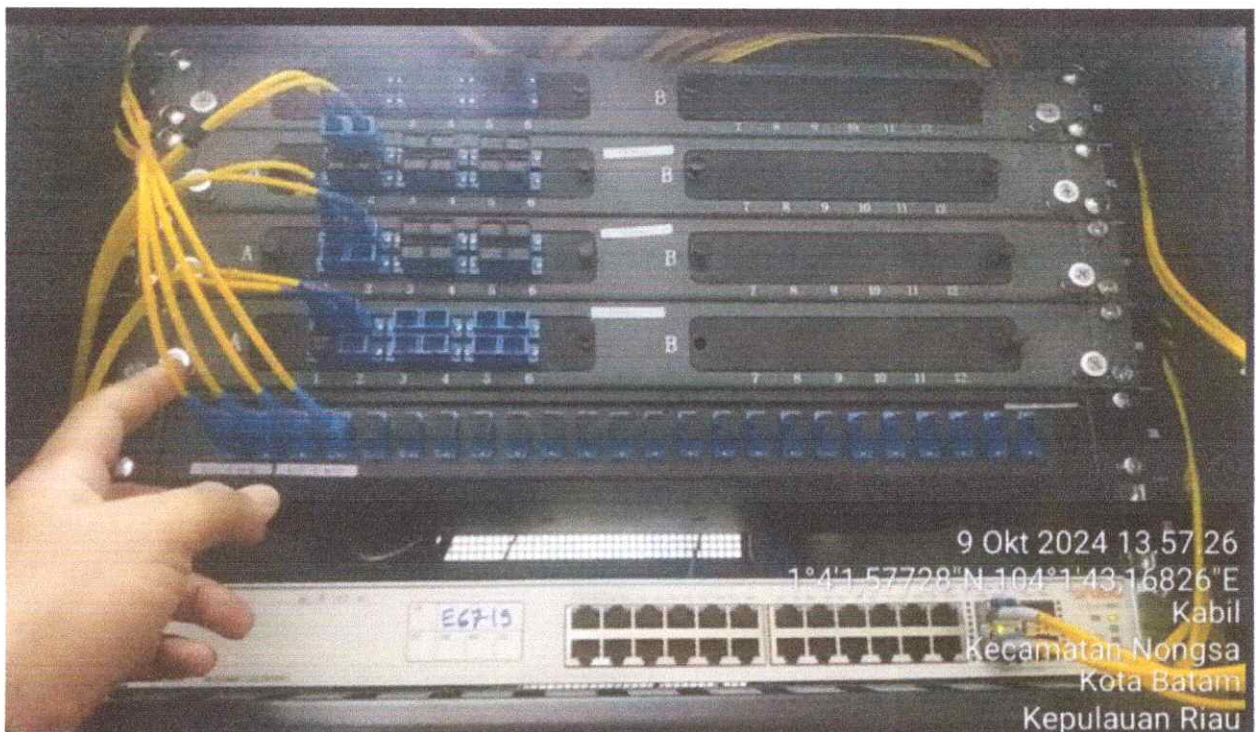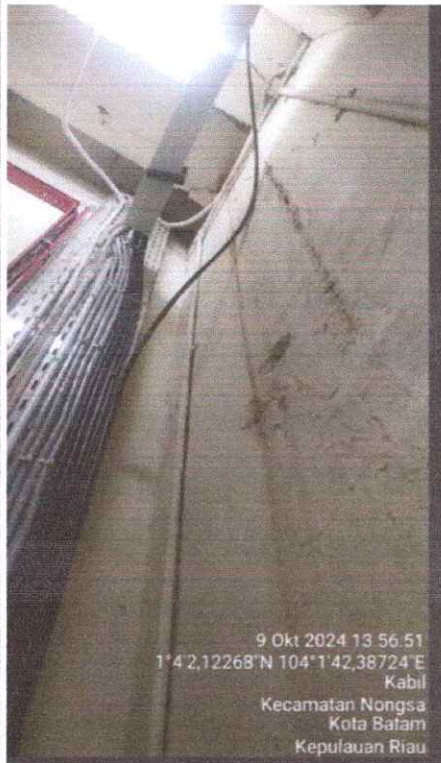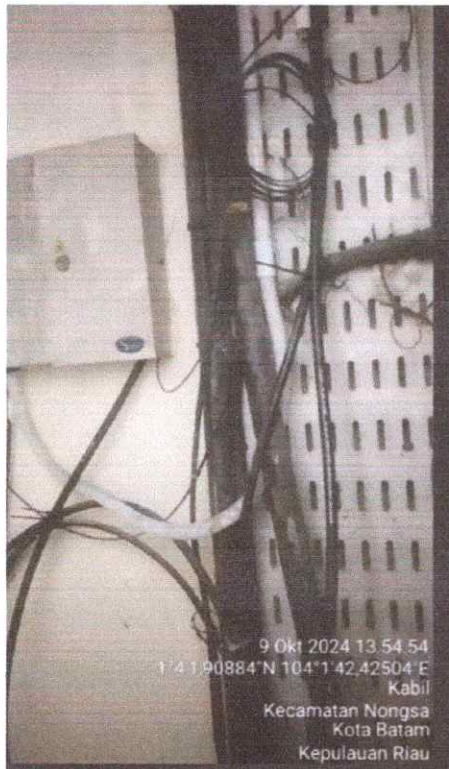

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2024-0369 IKG Penarikan Kabel 6 Core Lot 142 Dan

CIP2024-039

Lot 3

Main asset No.

3,466,500.00

Fixed Assets Data

3,466,500.00

Runus Runus

PRK 3

TE-Infrastruktur (INFRA) 10

TE-Perangkat Kecil (PRK) 3

Usage

Start Dep

Group

UOM

QTY

Completed Document

Completed Date

AMOUNT DEBIT/KREDIT

Ext Doc No

Description

Doc No

Posting date

Nama Proyek

2024-0369

IKG Penarikan Kabel 6 Core Lot 142 Dan Lot 3

10/9/2024

OTB Rack 24 Core

PUJ/24/0185

9-Oct-24

BAL/24/0279

1

UNT

PRK

9-Oct-24

3

TE-Infrastruktur (INFRA)

TE-Perangkat Kecil (PRK)

Usage

Start Dep

Group

UOM

QTY

Completed Document

Completed Date

AMOUNT DEBIT/KREDIT

Ext Doc No

Description

Doc No

Posting date

Nama Proyek

2024-0369

IKG Penarikan Kabel 6 Core Lot 142 Dan Lot 3

10/9/2024

OTB Rack 24 Core

PUJ/24/0185

9-Oct-24

BAL/24/0279

1

UNT

PRK

9-Oct-24

3

TE-Infrastruktur (INFRA)

TE-Perangkat Kecil (PRK)

Usage

Start Dep

Group

UOM

QTY

Completed Document

Completed Date

AMOUNT DEBIT/KREDIT

Ext Doc No

Description

Doc No

Posting date

Nama Proyek

2024-0369

IKG Penarikan Kabel 6 Core Lot 142 Dan Lot 3

10/9/2024

OTB Rack 24 Core

PUJ/24/0185

9-Oct-24

BAL/24/0279

1

UNT

PRK

9-Oct-24

3

TE-Infrastruktur (INFRA)

TE-Perangkat Kecil (PRK)

Usage

Start Dep

Group

UOM

QTY

Completed Document

Completed Date

AMOUNT DEBIT/KREDIT

Ext Doc No

Description

Doc No

Posting date

Nama Proyek

2024-0369

IKG Penarikan Kabel 6 Core Lot 142 Dan Lot 3

10/9/2024

OTB Rack 24 Core

PUJ/24/0185

9-Oct-24

BAL/24/0279

1

UNT

PRK

9-Oct-24

3

TE-Infrastruktur (INFRA)

TE-Perangkat Kecil (PRK)

Usage

Start Dep

Group

UOM

QTY

Completed Document

Completed Date

AMOUNT DEBIT/KREDIT

Ext Doc No

Description

Doc No

Posting date

Nama Proyek

2024-0369

IKG Penarikan Kabel 6 Core Lot 142 Dan Lot 3

10/9/2024

OTB Rack 24 Core

PUJ/24/0185

9-Oct-24

BAL/24/0279

1

UNT

PRK

9-Oct-24

3

TE-Infrastruktur (INFRA)

TE-Perangkat Kecil (PRK)

Usage

Start Dep

Group

UOM

QTY

Completed Document

Completed Date

AMOUNT DEBIT/KREDIT

Ext Doc No

Description

Doc No

Posting date

Nama Proyek

2024-0369

IKG Penarikan Kabel 6 Core Lot 142 Dan Lot 3

10/9/2024

OTB Rack 24 Core

PUJ/24/0185

9-Oct-24

BAL/24/0279

1

UNT

PRK

9-Oct-24

3

TE-Infrastruktur (INFRA)

TE-Perangkat Kecil (PRK)

Usage

Start Dep

Group

UOM

QTY

Completed Document

Completed Date

AMOUNT DEBIT/KREDIT

Ext Doc No

Description

Doc No

Posting date

Nama Proyek

2024-0369

IKG Penarikan Kabel 6 Core Lot 142 Dan Lot 3

10/9/2024

OTB Rack 24 Core

PUJ/24/0185

9-Oct-24

BAL/24/0279

1

UNT

PRK

9-Oct-24

3

TE-Infrastruktur (INFRA)

TE-Perangkat Kecil (PRK)

Usage

Start Dep

Group

UOM

QTY

Completed Document

Completed Date

AMOUNT DEBIT/KREDIT

Ext Doc No

Description

Doc No

Posting date

Nama Proyek

2024-0369

IKG Penarikan Kabel 6 Core Lot 142 Dan Lot 3

10/9/2024

OTB Rack 24 Core

PUJ/24/0185

9-Oct-24

BAL/24/0279

1

UNT

PRK

9-Oct-24

3

TE-Infrastruktur (INFRA)

TE-Perangkat Kecil (PRK)

Usage

Start Dep

Group

UOM

QTY

Completed Document

Completed Date

AMOUNT DEBIT/KREDIT

Ext Doc No

Description

Doc No

Posting date

Nama Proyek

2024-0369

IKG Penarikan Kabel 6 Core Lot 142 Dan Lot 3

10/9/2024

OTB Rack 24 Core

PUJ/24/0185

9-Oct-24

BAL/24/0279

1

UNT

PRK

9-Oct-24

3

TE-Infrastruktur (INFRA)

TE-Perangkat Kecil (PRK)

Usage

Start Dep

Group

UOM

QTY

Completed Document

Completed Date

AMOUNT DEBIT/KREDIT

Ext Doc No

Description

Doc No

Posting date

Nama Proyek

2024-0369

IKG Penarikan Kabel 6 Core Lot 142 Dan Lot 3

10/9/2024

OTB Rack 24 Core

PUJ/24/0185

9-Oct-24

BAL/24/0279

1

UNT

PRK

9-Oct-24

3

TE-Infrastruktur (INFRA)

TE-Perangkat Kecil (PRK)

Usage

Start Dep

Group

UOM

QTY

Completed Document

Completed Date

AMOUNT DEBIT/KREDIT

Ext Doc No

Description

Doc No
