



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : **CITRA INDOTAMA, CV**

Cheque No. : **2102 0562 9221**

P/V No. : **PV-MBR2406/061**

Date : **21-Jun-2024**

External Document No. **PV2406070**

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	SS / Rp
Being Payment Of :			
FTTH Griya KDA Tiban	VOB-000:		30,200,000
PPh 23 (Rp. 22.600.000,- X 2%)	121303		(452,000)
			-
			-
			-
			-
			-
Total in words : Twenty Nine Million Seven Hundred Forty Eight Thousand Rupiah Only			Rp 29,748,000
Prepared by : Fransiska Citra Ayu	Checked by : Apriansah	Approved by : Robby Susilo	Received by :
Date : 21-Jun-2024	Date :	Date :	Date :

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. :	Cheque No. :	2102 0562 9221
Batch No. :	P/V No. :	PV-MRR2406/061
Pav To :	Date :	21-Jun-2024
CITRA INDOTAMA, CV		

External Document No. PV2406070

PARTICULARS						A/C CODE	DIV	\$ / Rp
Being Payment Of :								
FTTH Griya KDA Tiban								30,200,000
PPh 23 (Rp. 22,600,000,- X 2%)								(452,000)
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total in words : Twenty Nine Million Seven Hundred Forty Eight Thousand Rupiah Only								Rp 29,748,000
Prepared by :  Fransiska Citra Ayu		Checked by :  Apriansah		Approved by :  Robby Susilo		Received by :		
Date : 21-Jun-2024			Date :		Date :			



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

Kepada Yth : PROCURMENT
Perusahaan : PT.Batam Bintang Telekomunikasi
Alamat : Jln Markisa No.1 Mukakuning Batamindo
ttn : Ibu Ferawaty Marpaung

Invoice No : 0056/ INV/CI/V/2024
PO No : PUO/24/0039
Tgl PO : 29 Maret 24

Hal: Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban

No	JENIS	SATUAN	PO		
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH
	Material				
1	Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP Pedestal	LS	1	1,200,000	1,200,000
2	Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	LS	1	400,000	400,000
3	Handhole pit 20x20x20	PCS	12	500,000	6,000,000
	Total Material				7,600,000
	Jasa				
1	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali lebar 20 cm ke dalaman	MTR	300	20,000	6,000,000
2	Pemasangan ODP dan Instalasi	PCS	3	500,000	1,500,000
3	Penarikan Subduct antar kwh	MTR	300	8,000	2,400,000
4	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	MTR	250	8,000	2,000,000
5	Boring rojok	MTR	18	90,000	1,620,000
6	Splasing di ODP dan OTDR	COR	16	55,000	880,000
7	Pemasangan Handhole Pit	PCS	12	275,000	3,300,000
8	Gambar autocad	LS	1	300,000	300,000
9	Biaya Administrasi Perumahan	LS	1	3,000,000	3,000,000
10	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1,600,000	1,600,000
					22,600,000
Grand Total					30,200,000

Terbilang : Dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah

Kami mohon di bayarkan melalui rekening Giro BCA
A/C : 326.239.5500 AN CV CITRA INDOTAMA

Batam, 21 Mei 2024
CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG
Direktur



Fransiska Citra Ayu

From: cia Dongan <indotama_cia@yahoo.co.id>
Sent: Friday, May 24, 2024 11:47 AM
To: Fransiska Citra Ayu
Cc: Ferawaty Marpaung
Subject: INVOICE FTTH Perumahan TIBAN KDA
Attachments: FTTH KDA TIBAN.pdf

Dengan Hormat,

Siang Bu Siska, terlampir Invoice Pekerjaan FTTH Perumahan Tiban KDA

Terimakasih,

Charles

Jenis	Justifikasi umum						
Dasar Pengajuan	1. Perumahan Griya KDA adalah Lokasi yang dipilih oleh marketing untuk dibangun jaringan FTTH nya. proses perizinan dan survey kelayakan sudah dilakukan, sehingga diivisi pembangunan segera melaksanakan pembangunan ini. 2. Pekerjaan pembangunan jaringan FTTH mengikuti dari progress pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak Developer perumahan.						
Informasi Tambahan	<table border="0"> <tr> <td>Kriteria</td> <td>: Jaringan FTTH</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Pengiriman</td> <td>: Gudang Muka Kuning</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pengiriman</td> <td>: 12 Mar 2024</td> </tr> </table>	Kriteria	: Jaringan FTTH	Lokasi Pengiriman	: Gudang Muka Kuning	Tanggal Pengiriman	: 12 Mar 2024
Kriteria	: Jaringan FTTH						
Lokasi Pengiriman	: Gudang Muka Kuning						
Tanggal Pengiriman	: 12 Mar 2024						

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 2102 0562 9221

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP Pedestal	500,000	1	ls	500,000
2.	Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	500,000	1	ls	500,000
3.	Handhole pit 20x20x20	350,000	12	pcs	4,200,000
				TOTAL	5,200,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali, lebar 20 cm ke dalaman 60 cm	29,000	300	m	N/A	1	8,700,000
2.	Pemasangan ODP dan Instalasi	500,000	2	pcs	N/A	1	1,000,000
3.	Penarikan Subduct antar kwh	8,000	300	m	N/A	1	2,400,000
4.	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	8,000	250	m	N/A	1	2,000,000
5.	Boring rojok	90,000	18	m	N/A	1	1,620,000
6.	Splacing di ODP dan OTDR	55,000	16	core	N/A	1	880,000
7.	Pemasangan Handhole Pit	150,000	12	pcs	N/A	1	1,800,000
8.	Gambar autocad	500,000	1	ls	N/A	1	500,000
9.	Documentasi	400,000	1	ls	N/A	1	400,000
10.	Transportasi / Mobilisasi	500,000	1	ls	N/A	1	500,000
TOTAL							19,800,00

Kode	JUST/24/0074
Judul	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban
Tanggal Pengajuan	12 Mar 2024

NO		SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang		5,200,000
2.	Jasa		19,800,000
Total			25,000,000

CHEQUE

BANK : mandiri

NUMBER : 2102 0562 9221

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Splitter 1:16 SC/PC Biru	799,239	1	PCS	799,239
2.	Splitter 1:8 SC/PC Biru	550,000	2	PCS	1,100,000
3.	Pigtail SC/PC SM Biru	15,000	16	PCS	240,000
4.	Protection Slave FO	1,000	16	PCS	16,000
5.	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	15,300	300	MTR	4,590,000
6.	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	17,380	250	MTR	4,345,000
TOTAL					11,090,239

B. Sumber Anggaran

Anggaran : Telecom Equipment (# BMN21-0001)		Kontrol Anggaran	
Sub Anggaran		Rencana Pemakaian	
Fiber to The Home (# BCM21-0014)		Rp. 25,000,000	
Sisa Budget		18,641,716,441	
Diajukan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,	Disetujui oleh,
			
IBRAHIM Senior Field Operation Officer DateTime : 2024-03-13 10:00:00	EDDY NAIBAHO Deputy CORO DateTime : 2024-03-13 07:50:45	TIMBUL NAINGGOLAN Chief Operational & Regulatory Officer DateTime : 2024-03-13 08:23:17	 DESMIATI MARUAO Accounting Manager DateTime : 2024-03-13 11:44:07
		Disetujui oleh,	Disetujui oleh,
			
		ROBBY SUSILO Chief Financial & HR Officer DateTime : 2024-03-13 14:40:35	ABDULLAH PRATAMA HABIBIE Direktur Operasional DateTime : 2024-03-13 12:44:05

Judul	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban
Tanggal	24 Mar 2024
Kode Referensi	JUST/24/0074

Vendor :CITRA INDOTAMA, CV

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali, lebar 20 cm ke dalaman 60 cm	300	m	29,000	6,000,000	5,700,000	8,700,000
2	Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP Pedestal	1	ls	500,000	1,200,000	1,200,000	500,000
3	Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	1	ls	500,000	400,000	400,000	500,000
4	Handhole pit 20x20x20	12	pcs	350,000	7,200,000	6,000,000	4,200,000
5	Pemasangan ODP dan Instalasi	2	pcs	500,000	0	1,000,000	1,000,000
6	Penarikan Subduct antar kwh	300	m	8,000	2,700,000	2,250,000	2,400,000
7	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	250	m	8,000	2,375,000	2,000,000	2,000,000
8	Boring rojok	18	m	90,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000
9	Splacing di ODP dan OTDR	16	core	55,000	800	800,000	880,000
10	Pemasangan Handhole Pit	12	pcs	150,000	4,200,000	3,300,000	1,800,000
11	Gambar autocad	1	ls	500,000	400,000	300,000	500,000
12	Documentasi	1	ls	400,000	300,000	0	400,000
13	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	500,000	2,000,000	330,000	500,000
Subtotal					28,395,800	24,900,000	25,000,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 12 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP 0 %
 - ☒ Termin-1 100 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %



- 1. Lama pekerjaan : 12 hari kerja
- 2. Pembayaran: Max 30 hari Setelah invoice
- 3. Garansi: 2 bulan setelah ATP Pekerjaan

Garansi : 0 hari

Vendor :SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali, lebar 20 cm ke dalaman 60 cm	300	m	29,000	9,000,000	9,000,000	8,700,000
2	Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP Pedestal	1	ls	500,000	500,000	500,000	500,000
3	Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	1	ls	500,000	500,000	500,000	500,000
4	Handhole pit 20x20x20	12	pcs	350,000	9,000,000	9,000,000	4,200,000

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
BERITA ACARA PENETAPAN VENDOR
 Kode : BAPV/24/0033

5	Pemasangan ODP dan Instalasi	2	pcs	500,000	800,000	800,000	1,000,000
6	Penarikan Subduct antar kwh	300	m	8,000	2,700,000	2,700,000	2,400,000
7	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	250	m	8,000	2,250,000	2,250,000	2,000,000
8	Boring rojok	18	m	90,000	1,710,000	1,710,000	1,620,000
9	Splacing di ODP dan OTDR	16	core	55,000	800,000	800,000	880,000
10	Pemasangan Handhole Pit	12	pcs	150,000	3,000,000	3,000,000	1,800,000
11	Gambar autocad	1	ls	500,000	350,000	350,000	500,000
12	Documentasi	1	ls	400,000	150,000	150,000	400,000
13	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	500,000	1,000,000	1,000,000	500,000
				Subtotal	31,760,000	31,760,000	25,000,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 30 hari

- Termin Pembayaran :

- ☐ DP 0 %
☒ Termin-1 100 %
☐ Termin-2 0 %
☐ Retensi 0 %

CHEQUE

BANK : mandiri
 NUMBER : 2102 0562 9221

1. Lama pekerjaan : 30 hari kerja

2. Pembayaran: 100% setelah pekerjaan selesai

3. Garansi: 90 hari

Garansi : 90 hari

Vendor : Link Asia Perkasa

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali, lebar 20 cm ke dalaman 60 cm	300	m	29,000	6,300,000	6,300,000	8,700,000
2	Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP Pedestal	1	ls	500,000	700,000	700,000	500,000
3	Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	1	ls	500,000	300,000	300,000	500,000
4	Handhole pit 20x20x20	12	pcs	350,000	7,200,000	7,200,000	4,200,000
5	Pemasangan ODP dan Instalasi	2	pcs	500,000	900,000	900,000	1,000,000
6	Penarikan Subduct antar kwh	300	m	8,000	2,550,000	2,550,000	2,400,000
7	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	250	m	8,000	2,250,000	2,250,000	2,000,000
8	Boring rojok	18	m	90,000	1,674,000	1,674,000	1,620,000
9	Splacing di ODP dan OTDR	16	core	55,000	880,000	880,000	880,000
10	Pemasangan Handhole Pit	12	pcs	150,000	3,600,000	3,600,000	1,800,000
11	Gambar autocad	1	ls	500,000	300,000	300,000	500,000
12	Documentasi	1	ls	400,000	300,000	300,000	400,000
13	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	500,000	1,800,000	1,800,000	500,000
				Subtotal	28,754,000	28,754,000	25,000,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 14 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP 0 %
 - ☒ Termin-1 100 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

1. Lama pekerjaan : 14 hari kerja
2. Pembayaran: Max 30 hari Setelah invoice
3. Garansi: 2 bulan setelah ATP Pekerjaan

Garansi : 60 hari

Alasan Skip Quotation

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/supplier **CITRA INDOTAMA, CV** dengan vendor id **VDR21-0003** sebagai pelaksana pekerjaan **Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 24,900,000**

Alasan penunjukan

- Harga lebih murah
- Lama pekerjaan : 12 hari kerja
- Pembayaran: Max 30 hari Setelah invoice
- Garansi: 2 bulan setelah ATP Pekerjaan

Catatan Direktur Operasional

Ok

Diajukan oleh,



FERAWATY MARPAUNG
Procurement Officer
DateTime : 2024-03-24 05:12:23

Diperiksa oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-03-25 09:24:15

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2024-03-25 15:23:32

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 2011 0562 9221



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

No: 35 /SPH-CI/III/2024

Yth, PROCUREMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Splitter 1:16 SC/PC Biru	1	PCS	-	-
2	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	2	PCS	-	-
3	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	16	PCS	-	-
4	material inventory	Protection Slave FO	16	PCS	-	-
5	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	300	MTR	-	-
6	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	250	MTR	-	-
7	material vendor	Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP Pedestal	1	ls	1.200.000	1.200.000
8	material vendor	Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	1	ls	400.000	400.000
9	material vendor	Handhole pit 20x20x20	12	pcs	500.000	6.000.000
10	jasa	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali lebar 20 cm ke dalaman 60 cm	300	m	19.000	5.700.000
11	jasa	Pemasangan ODP dan Instalasi	2	pcs	500.000	1.000.000
12	jasa	Penarikan Subduct antar kwh	300	m	7.500	2.250.000
13	jasa	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	250	m	8.000	2.000.000
14	jasa	Boring rojok	18	m	90.000	1.620.000
15	jasa	Splasing di ODP dan OTDR	16	core	50.000	800.000
16	jasa	Pemasangan Handhole Pit	12	pcs	275.000	3.300.000
17	jasa	Gambar autocad	1	ls	300.000	300.000
18	jasa	Documentasi	1	ls	0	0
19	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	330.000	330.000
						24.900.000

Note: .

1. Lama pekerjaan : 12 hari kerja
2. Pembayaran: Max 30 hari Setelah invoice
3. Garansi: 2 bulan setelah ATP Pekerjaan

Batam, 22 Maret 2024

CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG

Direktur

CD

cia Dongan <indotama_cia@yahoo.co.id>

To: Lia Martha Giyan Safitri; Ferawaty Marpaung

📧 🔄 📧 🔄 ...

Fri 3/22/2024 1:24 PM

📎 SPH NEGO KDA TIBAN FINAL...
476 KB

Dengan Hormat,

Siang Bu Fera, Terlampir SPH Final FTTH Perumahan KDA Tiban

Terimakasih,

Charles



No: 31 /SPH-CI/III/2024
Yth, PROCUREMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
UP : FERAWATY MARPAUNG

Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Splitter 1:16 SC/PC Biru	1	PCS	-	-
2	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	2	PCS	-	-
3	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	16	PCS	-	-
4	material inventory	Protection Slave FO	16	PCS	-	-
5	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	300	MTR	-	-
6	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	250	MTR	-	-
7	material vendor	Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP Pedestal	1	ls	1,200,000	1,200,000
8	material vendor	Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	1	ls	400,000	400,000
9	material vendor	Handhole pit 20x20x20	12	pcs	600,000	7,200,000
		Subtotal Material				8,800,000
10	jasa	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali lebar 20 cm ke dalaman 60 cm	300	m	20,000	6,000,000
11	jasa	Pemasangan ODP dan Instalasi	2	pcs	0	0
12	jasa	Penarikan Subduct antar kwh	300	m	9,000	2,700,000
13	jasa	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	250	m	9,500	2,375,000
14	jasa	Boring rojok	18	m	90,000	1,620,000
15	jasa	Splasing di ODP dan OTDR	16	core	50	800
16	jasa	Pemasangan Handhole Pit	12	pcs	350,000	4,200,000
17	jasa	Gambar autocad	1	ls	400,000	400,000
18	jasa	Documentasi	1	ls	300,000	300,000
19	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	2,000,000	2,000,000
		Subtotal Jasa				19,595,800
		Grand Total				28,395,800

Note:

1. Lama pekerjaan : 12 hari kerja
2. Pembayaran: Max 30 hari Setelah invoice
3. Garansi: 2 bulan setelah ATP Pekerjaan

Batam, 15 Maret 2024
CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG
Direktur

Penarikan kabel Optik 12 Core dari ODC lot 230 ke CAB 3, Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1 & Perumahan Griya KDA Tiban

CD clia Dongan <indotama_cia@yahoo.co.id>
To: Ferawaty Marpaung
Cc: Lia Martha Giyan Safitri

At 9/15/2024 11:04 AM

SPH 3 lokasi Penarikan kabel

Dengan Hormat

Siang Bu Fara Isrlampir SPH 3lokasi

Terimakasih,

Charles

Pada Rabu, 13 Maret 2024 pukul 16:02:19 WIB Ferawaty Marpaung <fara@bnt.co.id> menulis

Dear Vendor kami,
silahkan mengirimkan harga terbaik untuk pekerjaan terlampir.



PT. LINK ASIA PERKASA

GENERAL CONTRACTOR, TELECOMMUNICATION NETWORK

HEAD OFFICE: KOMPLEKS MKGR BLOK SWADAYA B NO 14 KIBING, KEC BATUJAI 29422

Phone 0778 8100005 Hp 081374283067

No: 16 /SPH-FO- III/2024

Yth, Ibu Frawaty Marpaung , Procurement PT.Batam Bintang Telekomunikasi

Jln Markisa No 1 Mukakuning Batamindo

Hal : Penawaran Pekerjaan FTTH Griya KDA Tiban

Dear Ibu Ferawaty Marpaung, terlampir Harga Pekerjaan Griya KDA Tiban

Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Splitter 1:16 SC/PC Biru	1	PCS	-	-
2	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	2	PCS	-	-
3	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	16	PCS	-	-
4	material inventory	Protection Slave FO	16	PCS	-	-
5	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	300	MTR	-	-
6	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	250	MTR	-	-
7	material vendor	Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP Pedestal	1	ls	700,000	700,000
8	material vendor	Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	1	ls	300,000	300,000
9	material vendor	Handhole pit 20x20x20	12	pcs	600,000	7,200,000
10	jasa	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali lebar 20 cm ke dalaman 60 cm	300	m	21,000	6,300,000
11	jasa	Pemasangan ODP dan Instalasi	2	pcs	450,000	900,000
12	jasa	Penarikan Subduct antar kwh	300	m	8,500	2,550,000
13	jasa	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	250	m	9,000	2,250,000
14	jasa	Boring rojok	18	m	93,000	1,674,000
15	jasa	Splicing di ODP dan OTDR	16	core	55,000	880,000
16	jasa	Pemasangan Handhole Pit	12	pcs	300,000	3,600,000
17	jasa	Gambar autocad	1	ls	300,000	300,000
18	jasa	Documentasi	1	ls	300,000	300,000
19	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	1,800,000	1,800,000
		Jumlah Material dan Jasa				28,754,000

Note:

1. Lama pekerjaan : 14 hari kerja
2. Pembayaran: Max 30 hari Setelah invoice
3. Garansi: 2 bulan setelah ATP

Penarikan kabel Optik 12 Core dari ODC lot 230 ke CAB 3, Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1 & Perumahan Griya KDA Tiban

Linkasiaperkasa <linkasiaperkasa@gmail.com>
To: Ferawaty Marpaung
Cc: Lia Martha Giyan Safitri

Re: 3/15/2024 11:42 AM

SPH Penarikan kabel Optik T...

Dear Ibu Ferawaty Marpaung,
Terlampir Penawaran harga dimasuk

Terimakasih,

Eric Nathanael

Batam, 15 Maret 2024

PT Link Asia Perkasa

ERIC NATHANAEL

Direktur



PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Telecommunication - Elektrical

Komplek Mangsang Permai Blok C No. 182 Kec. Sei Beduk Kota Batam

Telp.: 0778-7499112 Phone: 0812 774 4312 WA: 0851 0304 4312

Email: ptsinarkasih teknologi indonesia@gmail.com

QUOTATION NO 006/SKTI-BTM/III/2024

Kepada Yth : Dirut PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Jln Markisa Batamindo industrial Park Muka Kuning

Pekerjaan

Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Splitter 1:16 SC/PC Biru	1	PCS	-	-
2	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	2	PCS	-	-
3	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	16	PCS	-	-
4	material inventory	Protection Slave FO	16	PCS	-	-
5	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	300	MTR	-	-
6	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	250	MTR	-	-
7	material vendor	Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP P	1	ls	500.000	500.000
8	material vendor	Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	1	ls	500.000	500.000
9	material vendor	Handhole pit 20x20x20	12	pcs	750.000	9.000.000
10	jasa	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali	300	m	30.000	9.000.000
11	jasa	Pemasangan ODP dan Instalasi	2	pcs	400.000	800.000
12	jasa	Penarikan Subduct antar kwh	300	m	9.000	2.700.000
13	jasa	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	250	m	9.000	2.250.000
14	jasa	Boring rojok	18	m	95.000	1.710.000
15	jasa	Splasing di ODP dan OTDR	16	core	50.000	800.000
16	jasa	Pemasangan Handhole Pit	12	pcs	250.000	3.000.000
17	jasa	Gambar autocad	1	ls	350.000	350.000
18	jasa	Documentasi	1	ls	150.000	150.000
19	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	1.000.000	1.000.000
Grand total					31.760.000	

Batam 14 Maret 2024

PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Note:

1. Lama pekerjaan : 30 hari
2. Pembayaran: 100% setelah pekerjaan selesai
3. Garansi: 90 hari

ROMULO N

FTTH PERUMAHAN GRIYA KDA TIBAN

PT

ptsinarkasih teknologi indonesia
<ptsinarkasih teknologi indonesia@gmail.com>

To: BBT Procurement: +2 others

Wed 3/13/2024 9:08 PM

QUO KDA TIBAN.pdf
154 KB

YTH All Team Procrument PT BBT
TERLAMPIR PENAWARAN DARI PERUSAHAAN KAMI
Salam
Sinar Kasih
Mr Rom N

Reply Reply all Forward

Judul	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban
Tanggal	24 Mar 2024
Kode Referensi	JUST/24/0074

Vendor :CITRA INDOTAMA, CV

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali, lebar 20 cm ke dalaman 60 cm	300	m	29,000	6,000,000	5,700,000	8,700,000
2	Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP Pedestal	1	ls	500,000	1,200,000	1,200,000	500,000
3	Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	1	ls	500,000	400,000	400,000	500,000
4	Handhole pit 20x20x20	12	pcs	350,000	7,200,000	6,000,000	4,200,000
5	Pemasangan ODP dan Instalasi	2	pcs	500,000	0	1,000,000	1,000,000
6	Penarikan Subduct antar kwh	300	m	8,000	2,700,000	2,250,000	2,400,000
7	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	250	m	8,000	2,375,000	2,000,000	2,000,000
8	Boring rojok	18	m	90,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000
9	Splacing di ODP dan OTDR	16	core	55,000	800	800,000	880,000
10	Pemasangan Handhole Pit	12	pcs	150,000	4,200,000	3,300,000	1,800,000
11	Gambar autocad	1	ls	500,000	400,000	300,000	500,000
12	Documentasi	1	ls	400,000	300,000	0	400,000
13	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	500,000	2,000,000	330,000	500,000
Subtotal					28,395,800	24,900,000	25,000,000

Informasi Tambahan :	1. Lama pekerjaan : 12 hari kerja
- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 12 hari	2. Pembayaran: Max 30 hari Setelah invoice
- Termin Pembayaran :	3. Garansi: 2 bulan setelah ATP Pekerjaan
☐ DP 0 %	Garansi : 0 hari
☒ Termin-1 100 %	
☐ Termin-2 0 %	
☐ Retensi 0 %	

Vendor :SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali, lebar 20 cm ke dalaman 60 cm	300	m	29,000	9,000,000	9,000,000	8,700,000
2	Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP Pedestal	1	ls	500,000	500,000	500,000	500,000
3	Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	1	ls	500,000	500,000	500,000	500,000
4	Handhole pit 20x20x20	12	pcs	350,000	9,000,000	9,000,000	4,200,000

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
BERITA ACARA PENETAPAN VENDOR
 Kode : BAPV/24/0033

5	Pemasangan ODP dan Instalasi	2	pcs	500,000	800,000	800,000	1,000,000
6	Penarikan Subduct antar kwh	300	m	8,000	2,700,000	2,700,000	2,400,000
7	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	250	m	8,000	2,250,000	2,250,000	2,000,000
8	Boring rojok	18	m	90,000	1,710,000	1,710,000	1,620,000
9	Splacing di ODP dan OTDR	16	core	55,000	800,000	800,000	880,000
10	Pemasangan Handhole Pit	12	pcs	150,000	3,000,000	3,000,000	1,800,000
11	Gambar autocad	1	ls	500,000	350,000	350,000	500,000
12	Documentasi	1	ls	400,000	150,000	150,000	400,000
13	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	500,000	1,000,000	1,000,000	500,000
				Subtotal	31,760,000	31,760,000	25,000,000

Informasi Tambahan :
 - Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 30 hari
 - Termin Pembayaran :
☐ DP 0 %
☒ Termin-1 100 %
☐ Termin-2 0 %
☐ Retensi 0 %

1. Lama pekerjaan : 30 hari kerja
 2. Pembayaran: 100% setelah pekerjaan selesai
 3. Garansi: 90 hari

 Garansi : 90 hari

CHEQUE

BANK : mandiri
 NUMBER : 902 0562 9221

Vendor :Link Asia Perkasa

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali, lebar 20 cm ke dalaman 60 cm	300	m	29,000	6,300,000	6,300,000	8,700,000
2	Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP Pedestal	1	ls	500,000	700,000	700,000	500,000
3	Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	1	ls	500,000	300,000	300,000	500,000
4	Handhole pit 20x20x20	12	pcs	350,000	7,200,000	7,200,000	4,200,000
5	Pemasangan ODP dan Instalasi	2	pcs	500,000	900,000	900,000	1,000,000
6	Penarikan Subduct antar kwh	300	m	8,000	2,550,000	2,550,000	2,400,000
7	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	250	m	8,000	2,250,000	2,250,000	2,000,000
8	Boring rojok	18	m	90,000	1,674,000	1,674,000	1,620,000
9	Splacing di ODP dan OTDR	16	core	55,000	880,000	880,000	880,000
10	Pemasangan Handhole Pit	12	pcs	150,000	3,600,000	3,600,000	1,800,000
11	Gambar autocad	1	ls	500,000	300,000	300,000	500,000
12	Documentasi	1	ls	400,000	300,000	300,000	400,000
13	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	500,000	1,800,000	1,800,000	500,000
				Subtotal	28,754,000	28,754,000	25,000,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 14 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP 0 %
 - ☒ Termin-1 100 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

1. Lama pekerjaan : 14 hari kerja
2. Pembayaran: Max 30 hari Setelah invoice
3. Garansi: 2 bulan setelah ATP Pekerjaan

Garansi : 60 hari

Alasan Skip Quotation

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/suplier **CITRA INDOTAMA, CV** dengan vendor id **VDR21-0003** sebagai pelaksana pekerjaan **Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 24,900,000**

Alasan penunjukan

- Harga lebih murah
- Lama pekerjaan : 12 hari kerja
- Pembayaran: Max 30 hari Setelah invoice
- Garansi: 2 bulan setelah ATP Pekerjaan

Catatan Direktur Operasional

Ok

Diajukan oleh,



FERAWATY MARPAUNG
Procurement Officer
DateTime : 2024-03-24 05:12:23

Diperiksa oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-03-25 09:24:15

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2024-03-25 15:23:32

CHEQUE

BANK : **mandiri**
NUMBER : **2102 0562 9221**

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0039

Supplier Code : VOB-0003	Location Code : KBTM
Order Date : 25 March 2024	Reference : BAPV/24/0033-24 Mar 2024
Expect. Rcpt. Date : 09 April 2024	Shipment Method : FOB Batam
Payment Terms : Max30 Days	Page No. : 1 of 1

SUPPLIER	DELIVER TO
CITRA INDOTAMA, CV Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1 Batam BT Indonesia TEL: 0778-395 000	KANTOR BATAM PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban				
	Material				
1.	Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP Pedestal	1 LS	1,200,000.00	-	1,200,000.00
2.	Paku beton	1 LS	400,000.00	-	400,000.00
3.	Handhole pit 20x20x20	12 PCS	500,000.00	-	6,000,000.00
	Jasa Engineering				
4.	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali lebar 20 cm ke dalaman 60 cm	300 MTR	20,000.00	-	6,000,000.00
5.	Pemasangan ODP dan Instalasi	2 PCS	500,000.00	-	1,000,000.00
6.	Penarikan Subduct antar kwh	300 MTR	8,000.00	-	2,400,000.00
7.	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	250 MTR	8,000.00	-	2,000,000.00
8.	Boring rojok	18 MTR	90,000.00	-	1,620,000.00
9.	Splasing di ODP dan OTDR	16 COR	55,000.00	-	880,000.00
10.	Pemasangan Handhole Pit	12 PCS	275,000.00	-	3,300,000.00
11.	Gambar autocad	1 LS	300,000.00	-	300,000.00
12.	Transportasi / Mobilisasi	1 LS	1,600,000.00	-	1,600,000.00
	Note :				
	1. Jangka waktu pekerjaan: 12 hari kerja setelah PO				
	2. Pembayaran : Max 30 hari Setelah invoice				
	3. Garansi Pekerjaan : 2 bulan setelah ATP Pekerjaan				

CANCELLED

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 2102 0562 9221

 Abdullah Pratama Habibie Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 26,700,000.00
---	--	---------------------------------------

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0039

Supplier Code : VOB-0003		Location Code : KBTM			
Order Date : 25 March 2024		Reference : BAPV/24/0033-24 Mar 2024			
Expect. Rcpt. Date : 09 April 2024		Shipment Method : FOB Batam			
Payment Terms : Max30 Days		Page No. : 1 of 2			
SUPPLIER		DELIVER TO			
CITRA INDOTAMA, CV Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1 Batam BT Indonesia TEL: 0778-395 000		KANTOR BATAM PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam 29433			
No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban					
Material					
1.	Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP Pedestal	1 LS	1,200,000.00	-	1,200,000.00
2.	Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	1 LS	400,000.00	-	400,000.00
3.	Handhole pit 20x20x20	12 PCS	500,000.00	-	6,000,000.00
Jasa Engineering					
4.	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali lebar 20 cm ke dalaman 60 cm	300 MTR	20,000.00	-	6,000,000.00
5.	Pemasangan ODP dan Instalasi	2 PCS	500,000.00	-	1,000,000.00
6.	Penarikan Subduct antar kwh	300 MTR	8,000.00	-	2,400,000.00
7.	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	250 MTR	8,000.00	-	2,000,000.00
8.	Boring rojok	18 MTR	90,000.00	-	1,620,000.00
9.	Splacing di ODP dan OTDR	16 COR	55,000.00	-	880,000.00
10.	Pemasangan Handhole Pit	12 PCS	275,000.00	-	3,300,000.00
11.	Gambar autocad	1 LS	300,000.00	-	300,000.00
12.	Transportasi / Mobilisasi	1 LS	1,600,000.00	-	1,600,000.00
BATK/24/0008-8 Mei					
13.	Pemasangan ODP dan Instalasi	1 PCS	500,000.00	-	500,000.00
14.	Biaya Administrasi Perumahan	1 LS	3,000,000.00	-	3,000,000.00
Note :					
1. Jangka waktu pekerjaan: 12 hari kerja setelah PO					
2. Pembayaran : Max 30 hari Setelah invoice					
3. Garansi Pekerjaan : 2 bulan setelah ATP Pekerjaan					




PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0039

Supplier Code : VOB-0003	Location Code : KBTM
Order Date : 25 March 2024	Reference : BAPV/24/0033-24 Mar 2024
Expect. Rcpt. Date : 09 April 2024	Shipment Method : FOB Batam
Payment Terms : Max30 Days	Page No. : 2 of 2

SUPPLIER CITRA INDOTAMA, CV Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1 Batam BT Indonesia TEL: 0778-395 000	DELIVER TO KANTOR BATAM PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam 29433
--	--

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
CHEQUE BANK : mandiri NUMBER : 2102 0562 9221					

 Abdullah Pratama Habibie Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 30,200,000.00
--	---	----------------------------



**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/24/0008**

Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban

Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Mei 2024 telah dilaksanakan Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban sesuai dengan No. PUO/24/0039 tanggal 25 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			PO	REALISASI	
	Material				
1	Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP Pedestal	LS	1	1	
2	Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	LS	1	1	
3	Handhole pit 20x20x20	PCS	12	12	
	Jasa Engineering				
1	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali lebar 20 cm ke dalaman 60 cm	MTR	300	300	
2	Pemasangan ODP dan Instalasi	PCS	2	3	
3	Penarikan Subduct antar kwh	MTR	300	300	
4	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	MTR	250	250	
5	Boring rojok	MTR	18	18	
6	Splacing di ODP dan OTDR	COR	16	16	
7	Pemasangan Handhole Pit	PCS	12	12	
8	Gambar autocad	LS	1	1	
9	Biaya Administrasi Perumahan	LS	0	1	
10	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			CV. CITRA INDOTAMA
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Senior FOO	 Eddy Naibaho Deputy CORO	 Timbul Nainggolan Chief Operational & Regulatory	 Daendels Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**
BAL/24/0080
Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 08 May 2024

Purchase Order : PUO/24/0039
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP Pedestal	LS	1.00	1.00	
2.	Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	LS	1.00	1.00	
3.	Handhole pit 20x20x20	PCS	12.00	12.00	
4.	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali lebar 20 cm ke dalaman 60 cm	MTR	300.00	300.00	
5.	Pemasangan ODP dan Instalasi	PCS	2.00	2.00 ✓	
6.	Penarikan Subduct antar kwh	MTR	300.00	300.00 ✓	
7.	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	MTR	250.00	250.00 ✓	
8.	Boring rojok	MTR	18.00	18.00	
9.	Splasing di ODP dan OTDR	COR	16.00	16.00	
10.	Pemasangan Handhole Pit	PCS	12.00	12.00	
11.	Gambar autocad	LS	1.00	1.00	
12.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
13.	Pemasangan ODP dan Instalasi	PCS	1.00	1.00 ✓	
14.	Biaya Administrasi Perumahan	LS	1.00	1.00	

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 2102 0562 9221

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.
Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 8 May 2024
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
User Mengetahui


CITRA INDOTAMA, CV
Vendor,


BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0080
Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 08 May 2024

Purchase Order : PUO/24/0039
Page No. : 2


No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------


Ibrahim


Eddy Naibaho

Menyetujui,

Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN. 24/	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 2102 0562 9221

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)

BAL/24/0080

Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban


Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 08 May 2024

Purchase Order : PUO/24/0039
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
Ibrahim	Eddy Naibaho				

Menyetujui,


Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN: 24/000071	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah



CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 2102 0562 9221

BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(BATK)
BATK/24/0008

Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei 2024
Pelaksana Pekerjaan : Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban
No. PO : PUO/24/0039- 25 Maret 2024
Harga PO Awal : Rp 26,700,000
Harga PO Setelah Realisasi : Rp 30,200,000
BATK : Rp 3,500,000
% BATK : 13.11%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan CV CI maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :


Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS	SATUAN	PO			REALISASI		
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	JUMLAH
	Material							
1	Material Semen + Pasir +	LS	1	1,200,000	1,200,000	1	1,200,000	1,200,000
2	Terpal alas aspal untuk	LS	1	400,000	400,000	1	400,000	400,000
3	Handhole pit 20x20x20	PCS	12	500,000	6,000,000	12	500,000	6,000,000
	Total Material				7,600,000			7,600,000
	Jasa							
1	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali lebar 20 cm ke dalaman 60 cm	MTR	300	20,000	6,000,000	300	20,000	6,000,000
2	Pemasangan ODP dan Instalasi	PCS	2	500,000	1,000,000	3	500,000	1,500,000
3	Penarikan Subduct antar kwh	MTR	300	8,000	2,400,000	300	8,000	2,400,000
4	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	MTR	250	8,000	2,000,000	250	8,000	2,000,000
5	Boring rojok	MTR	18	90,000	1,620,000	18	90,000	1,620,000
6	Splasing di ODP dan OTDR	COR	16	55,000	880,000	16	55,000	880,000
7	Pemasangan Handhole Pit	PCS	12	275,000	3,300,000	12	275,000	3,300,000
8	Gambar autocad	LS	1	300,000	300,000	1	300,000	300,000
9	Biaya Administrasi Perumahan	LS		-	-	1	3,000,000	3,000,000
10	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1,600,000	1,600,000	1	1,600,000	1,600,000
					19,100,000			22,600,000
Grand Total					26,700,000			30,200,000

1. Selisih Nilai BATK 3,500,000
2. % BATK
3,500,000 / 26,700,000 13.11%

Maka total Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban adalah sebesar : **Rp. 30.200.000,-** (Tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi	CV. CITRA INDOTAMA
Menyetujui,	Vendor
 Abdullah Pratama Habibie Direktur Utama	 Pejabat Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%



FOTO FTTH GRIYA KDA TIBAN

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4


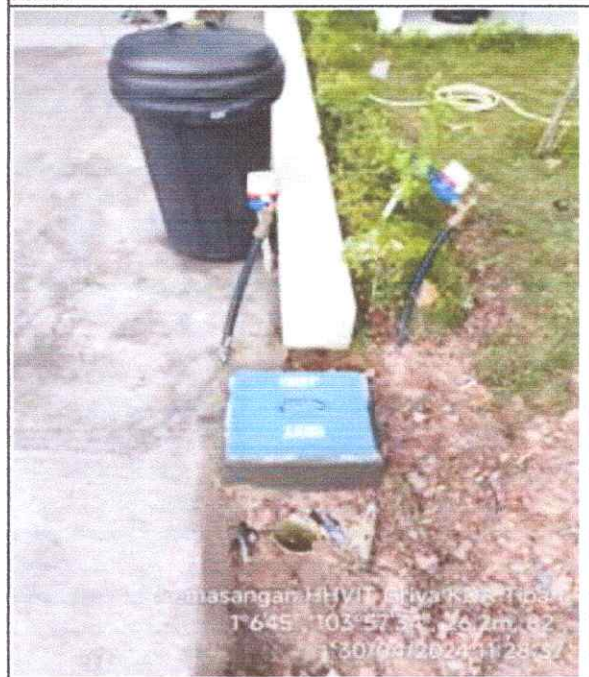


FOTO FTTH GRIYA KDA TIBAN

Picture 1



Picture 2

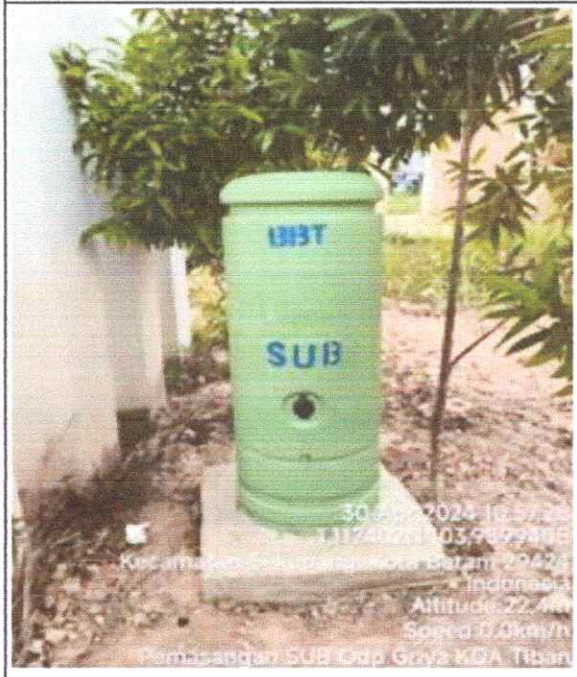

Picture 3




Picture 4




FOTO FTTH GRIYA KDA TIBAN

Picture 1

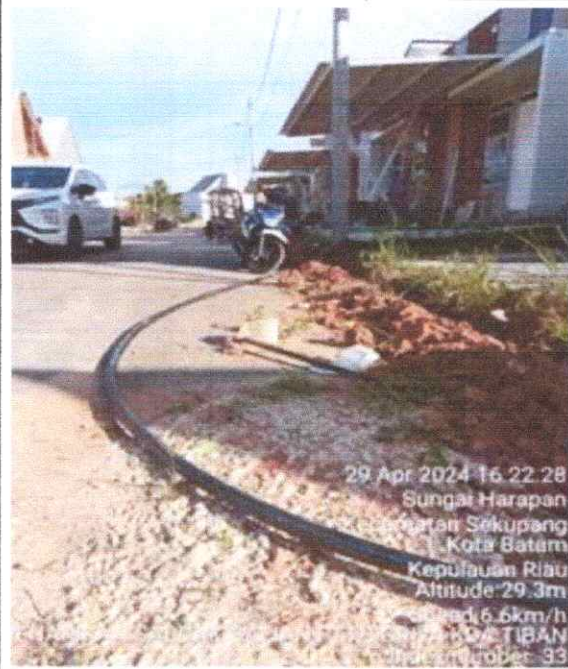

Picture 2

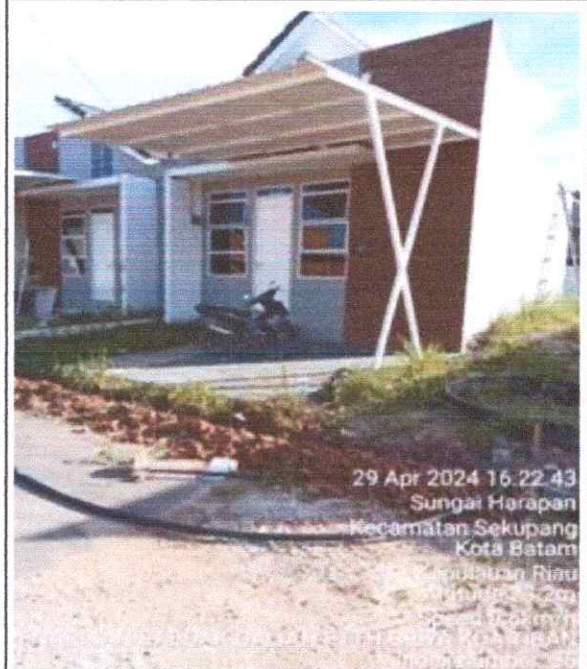

Picture 3



Picture 4

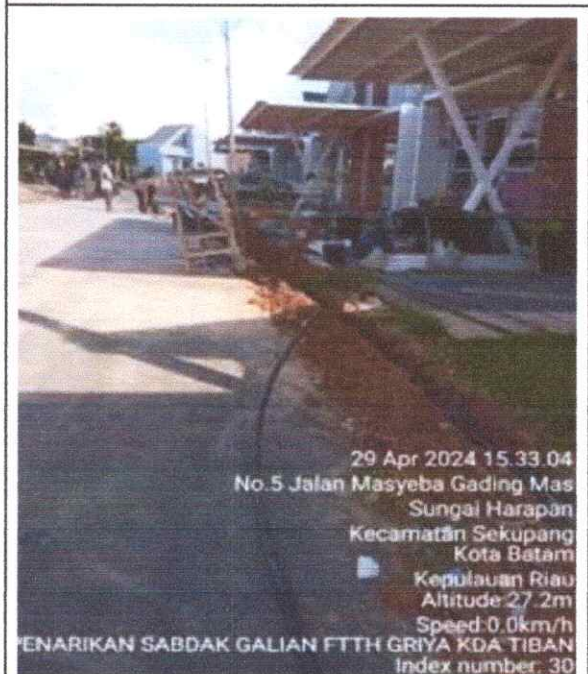


FOTO FTTH GRIYA KDA TIBAN

Picture 1



Picture 2



Picture 3




Picture 4




FOTO FTTH GRIYA KDA TIBAN

Picture 1

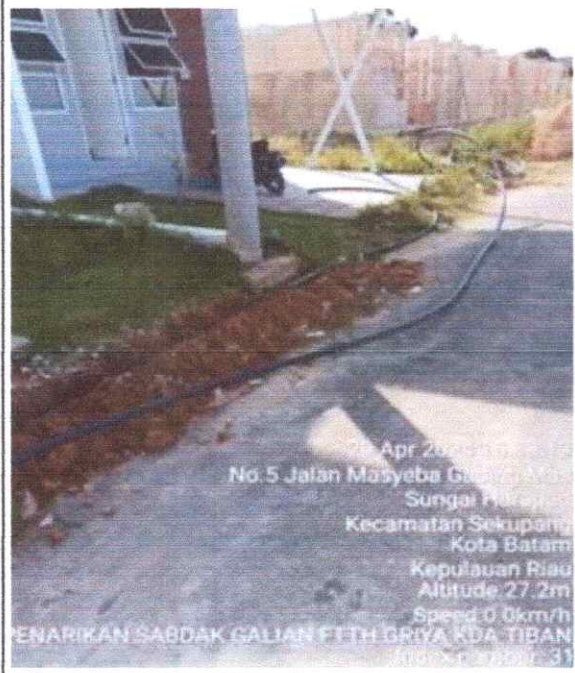

Picture 2

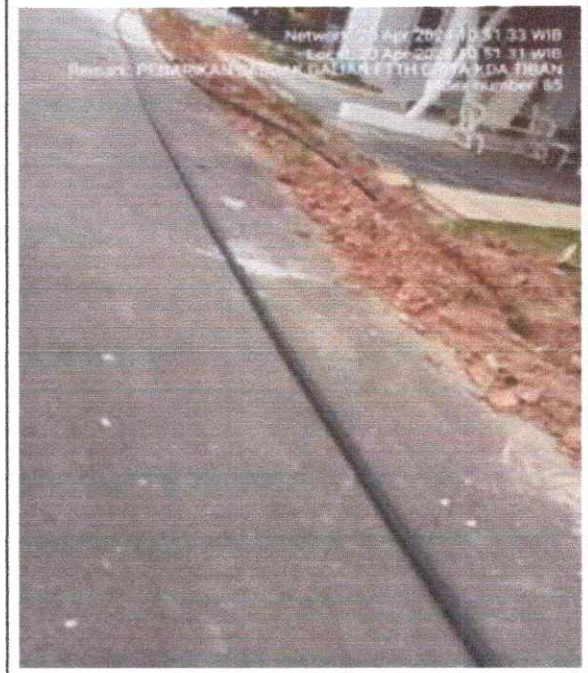

Picture 3



Picture 4



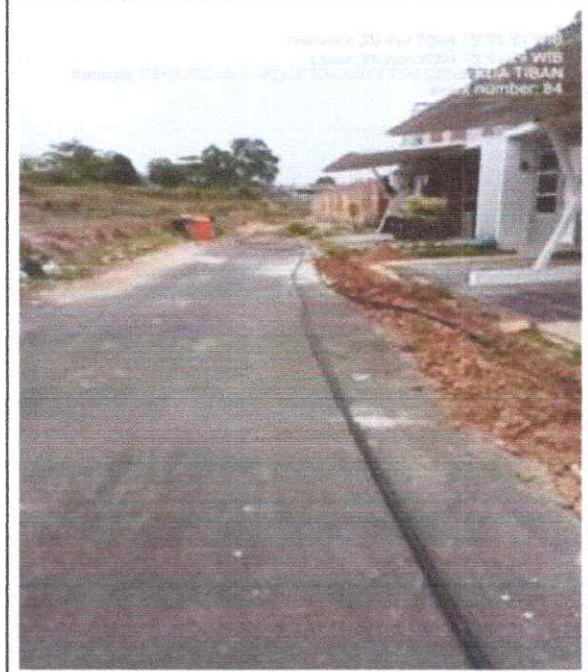


FOTO FTTH GRIYA KDA TIBAN

Picture 1

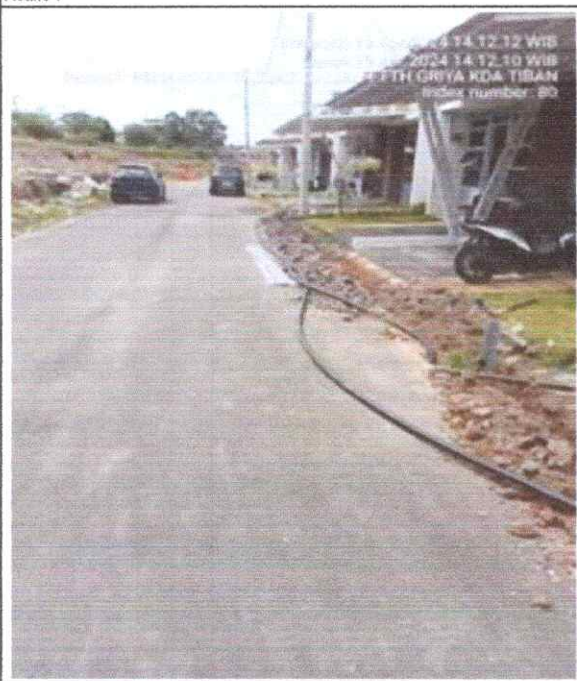

Picture 2

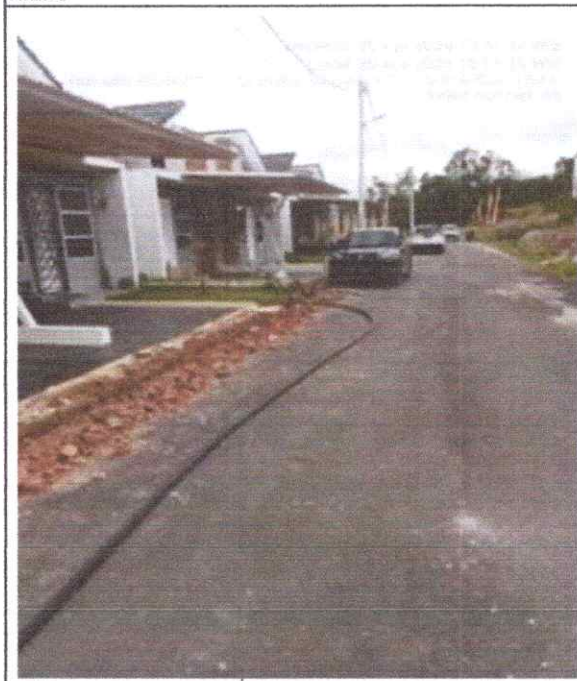

Picture 3



Picture 4

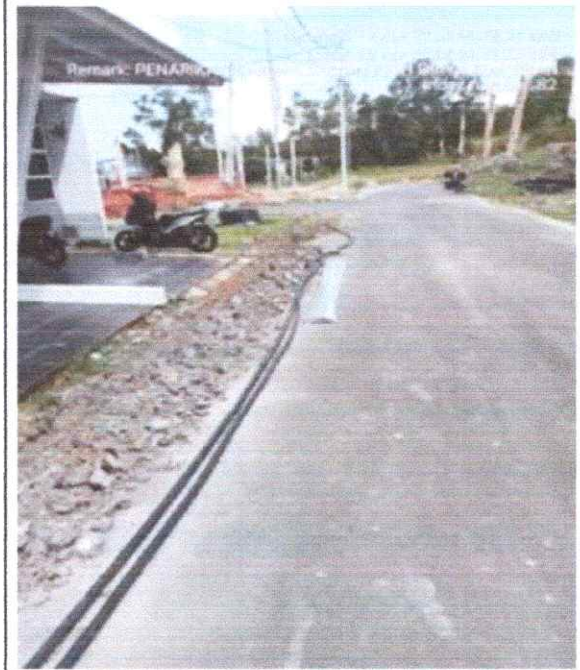


FOTO FTTH GRIYA KDA TIBAN

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4


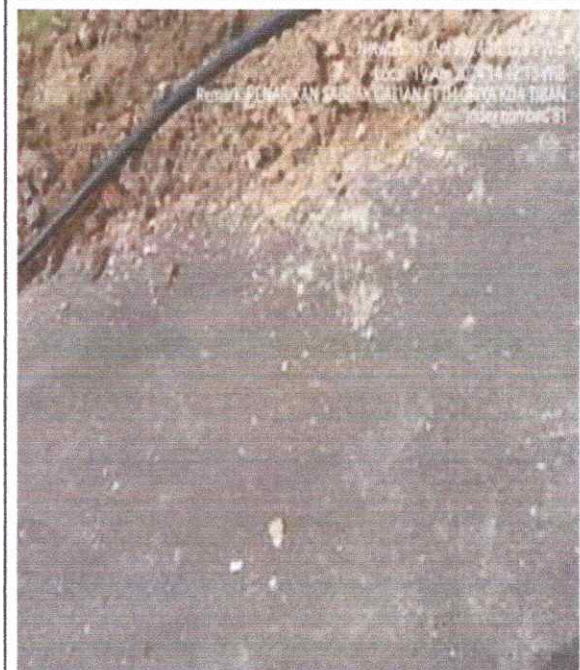


FOTO FTTH GRIYA KDA TIBAN


Picture 1



Picture 2

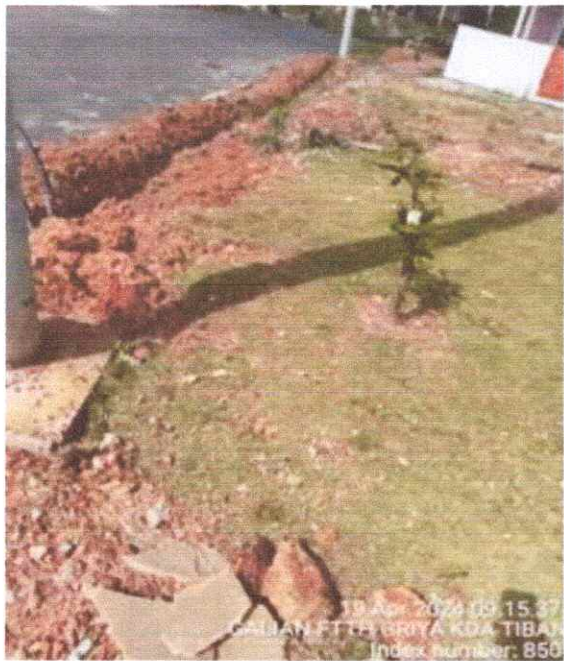

Picture 3

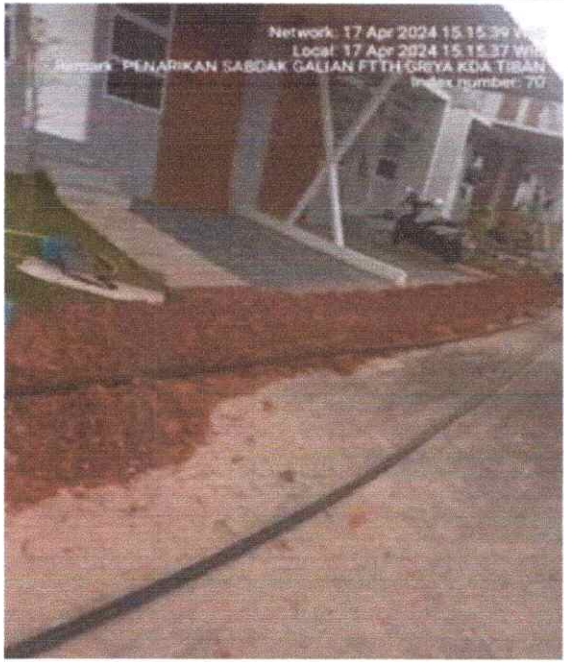


Picture 4



FOTO FTTH GRIYA KDA TIBAN


Picture 1

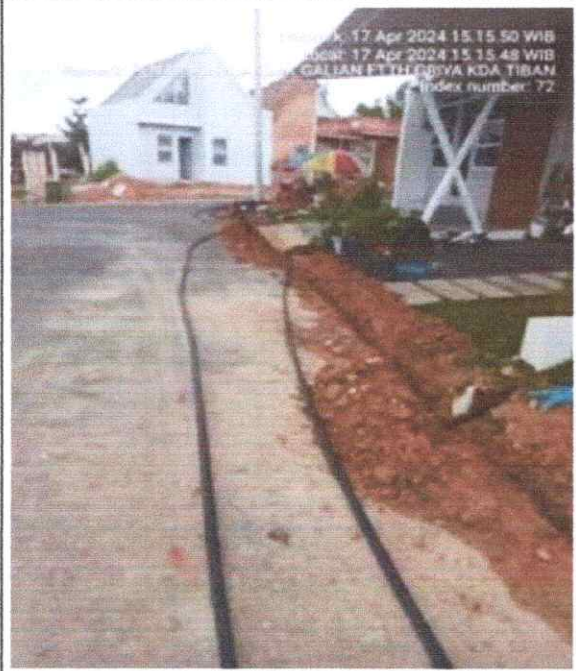

Picture 2



Picture 3

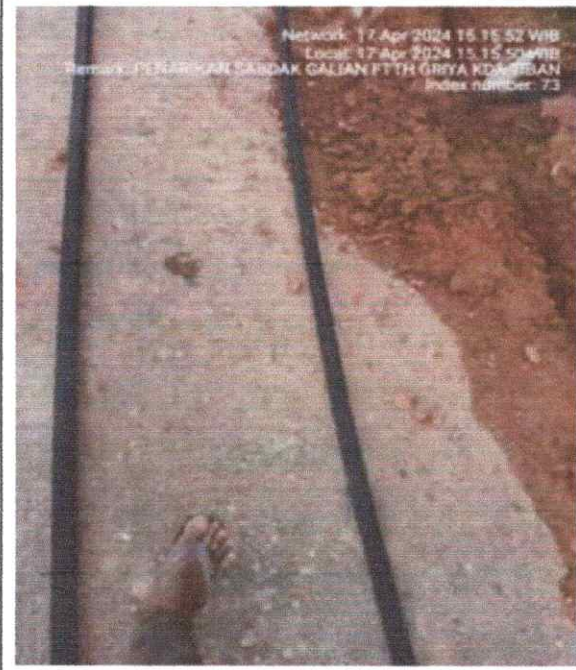

Picture 4



FOTO FTTH GRIYA KDA TIBAN


Picture 1



Picture 2



Picture 3

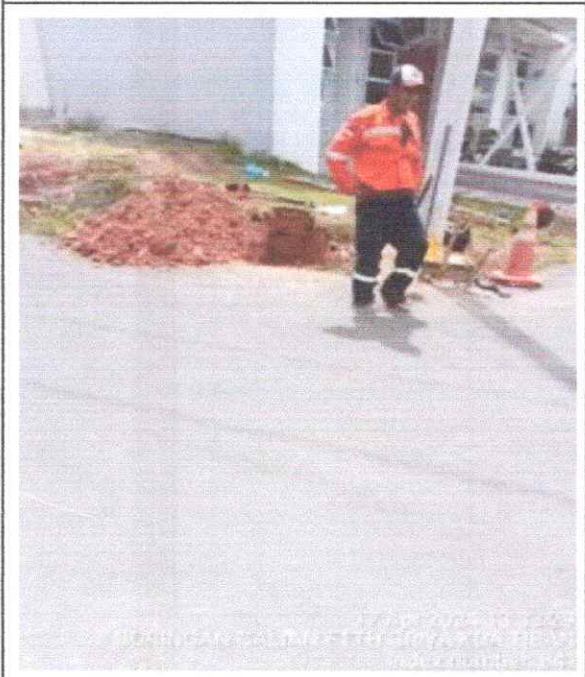

Picture 4



Transaction Status

Keep track of your transaction

Transaction Status

Transaction Id	202406210205629221
Document Number	202406210205629221
Creation Date	Jun 21, 2024 02:05:12 (GMT +7)
Total Debit Amount	IDR 29,750,900.00
Instruction Mode	Immediate
Transaction Status	● Success

Single Transfer To Other Bank - Clearing (ID: SKN/LLG) Transfer

SOR Number	Unable to get SOR Number	
Remittance Number	599102025441301	
Source of Fund	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM	
Destination Account	3262395500 CV. CITRA INDOTAMA	
Beneficiary Bank Information	BCA (Bank Central Asia) LLG : 0140397	
Transfer Method	LLG	
Charge to	OUR	
Amount	IDR	29,748,000.00
SKN Fee	IDR	2,900 (IDR 2,900.00 / record)
Total Charges	IDR	2,900.00
Total Debit Amount	IDR	29,750,900.00
Reference Number	PV2406070	
Remark	PV2406070	
Extended Details	FTTH Griya KDA Tiban	
Instruction Mode	Immediate	
Instruction Date	Jun 21, 2024	
Additional Notification	Email	-
	SMS	-

Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Material Semen + Pasir + Kerikil untuk ODP Pedestal	PUO/24/0039	1,200,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	1	LS	Infra	8-May-24	10	-	1,200,000.00	TE012741	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	PUO/24/0039	400,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	1	LS	Infra	8-May-24	10	-	400,000.00	TE012741	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Handhole pit 20x20x20	PUO/24/0039	6,000,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	12	PCS	Infra	8-May-24	10	-	6,000,000.00	TE012741	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali lebar 20 cm ke dalam 60 cm	PUO/24/0039	6,000,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	300	MTR	Infra	8-May-24	10	-	6,000,000.00	TE012741	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Pemasangan ODP dan Instalasi	PUO/24/0039	1,500,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	3	PCS	Infra	8-May-24	10	-	1,500,000.00	TE012741	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Penarikan Subduct antar kwh	PUO/24/0039	2,400,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	300	MTR	Infra	8-May-24	10	-	2,400,000.00	TE012741	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	PUO/24/0039	2,000,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	250	MTR	Infra	8-May-24	10	-	2,000,000.00	TE012741	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Boring rolok	PUO/24/0039	1,620,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	18	MTR	Infra	8-May-24	10	-	1,620,000.00	TE012741	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Splicing di ODP dan OTDR	PUO/24/0039	880,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	16	COR	Infra	8-May-24	10	-	880,000.00	TE012741	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Pemasangan Handhole Pit	PUO/24/0039	3,300,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	12	PCS	Infra	8-May-24	10	-	3,300,000.00	TE012741	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Gambar autocad	PUO/24/0039	300,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	1	LS	Infra	8-May-24	10	-	300,000.00	TE012741	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Transportasi / Mobilisasi	PUO/24/0039	1,600,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	1	LS	Infra	8-May-24	10	-	1,600,000.00	TE012741	Ibrahim

Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext. Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Biaya Administrasi Perumahan	RU0/24/0039	3,000,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	1	LS	Infra	8-May-24	10	-	3,000,000.00	TE012741	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Splitter 1:8 SC/PC Biru	BK-MKK2404/007	515,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	1	MTR	PRK	8-May-24	3	515,000.00	-	TE012742	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Splitter 1:8 SC/PC Biru	BK-MKK2404/007	515,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	1	MTR	PRK	8-May-24	3	515,000.00	-	TE012743	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		ODP Pedestal 1:8 Core-Splitter	BK-MKK2404/007	1,400,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	1	MTR	PRK	8-May-24	3	1,400,000.00	-	TE012744	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Protection Slave FO	BK-MKK2404/007	11,200.00	8-May-24	BAL/24/0080	16	PCS	Infra	8-May-24	10	-	11,200.00	TE012741	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Cable Fiber Optic 48 Core Duct	BK-MKK2404/007	3,852,500.00	8-May-24	BAL/24/0080	250	PCS	Infra	8-May-24	10	-	3,852,500.00	TE012741	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	BK-MKK2404/007	4,800,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	300	PCS	Infra	8-May-24	10	-	4,800,000.00	TE012741	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Pigtail SC/PC SM Biru	BK-MKK2405/002	92,800.00	8-May-24	BAL/24/0080	16	PCS	Infra	8-May-24	10	-	92,800.00	TE012741	Ibrahim
J2024-0074	Pembangunan FTTH Perumahan Griya KDA Tiban	5/8/2024		Cable Fiber Optic 48 Core Duct	BK-MKK2405/013	18,492,000.00	8-May-24	BAL/24/0080	1200	PCS	Infra	8-May-24	10	-	18,492,000.00	TE012741	Ibrahim

Prepared BY,

Record BY

Reviewed & Posted By

User By,

Uti

Apriansah

Ibrahim
