



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

Kepada Yth : PROCURMENT
Perusahaan : PT.Batam Bintang Telekomunikasi
Alamat : Jln Markisa No.1 Mukakuning Batamindo
ttn : Ibu Ferawaty Marpaung

Invoice No : 61/ INV/CI/XII/2023
PO No : PUO/23/0270
Tgl PO : 18 Desember 2023

Hal: Pembangunan jaringan FTTH, fiber optic 48 core Simatelex Gedung Baru

ID	KETERANGAN	QTY	SATUA	NOMINAL	TOTAL
	Material				
1	Semen, pasir dan kerikil	1	LS	1,500,000	1,500,000
2	OTB Rack 48 core SC	1	UNIT	4,000,000	4,000,000
					5,500,000
	Jasa				
1	Roding pipa duct	1,000	MTR	7,800	7,800,000
2	Galian tanah kedalaman 40 cm	730	MTR	19,500	14,235,000
3	Penarikan Kabel Fiber Optik 48 core	1,780	MTR	7,500	13,350,000
4	Penarikan subduct HDPE	430	MTR	7,500	3,225,000
5	Buka Tutup Maninhole dan Pengeringan	8	TITIK	150,000	1,200,000
6	Bobok Dingding Mainhole dan Ducting	1	MTR	345,000	345,000
7	Pemasangan ODC-144	1	UNT	3,450,000	3,450,000
8	Pemasangan OTB Rack 48-C di BBT	1	UNT	1,100,000	1,100,000
9	pemasangan OTB	2	UNT	390,000	780,000
10	Splasing Optic dan OTDR	120	COR	55,000	6,600,000
11	Perbaikan Beton	1	LS	1,900,000	1,900,000
12	Uji terima	1	LS	2,000,000	2,000,000
13	Mobilisasi	1	LS	1,800,000	1,800,000
					57,785,000
Grand Total					63,285,000

Terbilang : Enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Kami mohon di bayarkan melalui rekening Giro BCA
A/C : 326.239.5500 AN CV CITRA INDOTAMA

Batam, 28 Desember 2023

CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG

Direktur

POSTED

Pu1/23/1571

DATE

31/12/2023

SIGNED

21



Kode JUST/23/0424

Judul Pembangunan jaringan FTTB, fiber optic 48 core Simatelex Gedung Baru

Tanggal Pengajuan 11 Des 2023

Jenis Justifikasi umum

Dasar Pengajuan

1. Untuk memenuhi permintaan pelanggan PT. Simatelex akan layanan Internet Broadband, dimana saat ini belum tersedianya jaringan Fiber Optic BBT sampai ke alamat lokasi simatelex tersebut. maka diperlukan penarikan kabel fiber optic untuk sampai ke PT. Simatelex tersebut.
2. dasar pengajuan oleh team sales, email ada pada lampiran.

 Reply
  Reply All
  Forward
 Wed 22/11/2023 10:22
 Noviana Herdiyanti
 Permintaan Pengadaan Jaringan untuk Simatelex Lot 155
 To : Jurnani
 Cc : Eddy Naibaho; Ibrahim; Hadin Irawan; Nanda Afrianda
 This message was sent with High importance.

Dear Team Operational,

Mohon bantuannya untuk segera mensurvey site Simatelex di Lot 155 dan segera menyediakan jaringannya dikarenakan permintaan pelanggan 2 minggu.

Terimakasih atas kerjasamanya.

Regards,
 Noviana Herdiyanti
 Account Manager
 PT Batam Bintang Telekomunikasi
 Telp-Whatsapp: 0778-8101235

**Informasi Tambahan**

Kriteria : Jaringan FTTH
 Lokasi Pengiriman : Gudang Muka Kuning
 Tanggal Pengiriman : 11 Des 2023

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Semen, pasir dan kerikil	1,500,000	1	ls	1,500,000
TOTAL					1,500,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Roding pipa duct	8,000	1,000	m	N/A	1	8,000,000
2.	Galian tanah kedalaman 40 cm	26,000	730	m	N/A	1	18,980,000
3.	Penarikan Kabel Fiber Optik 48 core	12,000	1,780	m	N/A	1	21,360,000

Kode	JUST/23/0424
Judul	Pembangunan jaringan FTTB, fiber optic 48 core Simatelex Gedung Baru
Tanggal Pengajuan	11 Des 2023

5.	Buka Tutup Maninhole dan Pengeringan	150,000	8	titik	N/A	1	1,200,000
6.	Bobok Dinding Mainhole dan Ducting	350,000	1	m	N/A	1	350,000
7.	Pemasangan ODC-144	3,500,000	1	unit	N/A	1	3,500,000
8.	Pemasangan OTB Rack 48-C di BBT	1,200,000	1	unit	N/A	1	1,200,000
9.	pemasangan OTB	400,000	2	unit	N/A	1	800,000
10.	Splasing Optic dan OTDR	55,000	120	core	N/A	1	6,600,000
11.	Perbaiki Beton	2,000,000	1	ls	N/A	1	2,000,000
12.	Dokumentasi	500,000	1	ls	N/A	1	500,000
13.	Uji Terima	2,000,000	1	ls	N/A	1	2,000,000
14.	Mobilisasi	2,000,000	1	ls	N/A	1	2,000,000
TOTAL							73,650,000

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	1,500,000
2.	Jasa	73,650,000
Total		75,150,000

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	16,900	1,780	MTR	30,082,000
2.	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	10,000	430	MTR	4,300,000
3.	OTB Rack 24 Core SC	1,100,000	1	PCS	1,100,000
4.	144 Core Fiber Optical ODC	9,000,000	1	UNT	9,000,000
5.	OTB Wall 12 Core	750,000	1	PCS	750,000
6.	Pigtail SC/PC SM Biru	15,000	120	PCS	1,800,000
7.	Protection Slave FO	1,000	120	PCS	120,000
8.	OTB Rack 48 Core SC lokasi sentral BBT	4,000,000	1	PCS	4,000,000
TOTAL					51,152,000

Kode JUST/23/0424

Judul Pembangunan jaringan FTTB, fiber optic 48 core Simatelex Gedung Baru

Tanggal Pengajuan 11 Des 2023

B. Sumber Anggaran**Anggaran :** Telecom Equipment (# BMN21-0001)**Kontrol Anggaran****Sub Anggaran****Rencana Pemakaian**

Access Network Batam Area (# BCM21-0002)

Rp. 75,150,000

Sisa Budget

1,624,162,909

Diajukan oleh,

Diperiksa oleh,

Disetujui oleh,

Disetujui oleh,

Disetujui oleh,



IBRAHIM
Senior Field Operation Officer
Datetime : 2023-12-13 13:40:48

EDDY NAIBAHO
Deputy CORO
Datetime : 2023-12-13 14:01:35

TIMBUL NAINGGOLAN
Chief Operational & Regulatory
Officer
Datetime : 2023-12-14 05:08:51

ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
Datetime : 2023-12-14 15:50:41

ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
Datetime : 2023-12-14 15:50:11


DESMIATI MARUAO
Accounting Manager
Datetime : 2023-12-14 08:29:16



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

No: 76/SPH/CI/XII/2023

Yth, PROCURMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

Penawaran Harga : Pembangunan jaringan FTTB, fiber optic 48 core Simatelex Gedung Baru

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	1,780	MTR		0
2	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	430	MTR		0
3	material inventory	OTB Rack 24 Core SC	1	PCS		0
4	material inventory	144 Core Fiber Optical ODC	1	UNT		0
5	material inventory	OTB Wall 12 Core	1	PCS		0
6	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	120	PCS		0
7	material inventory	Protection Slave FO	120	PCS		0
8	material inventory	OTB Rack 48 Core SC lokasi sentral BBT	1	PCS		0
9	material vendor	Semen, pasir dan kerikil	1	ls	1,500,000	1,500,000
		Total Material				1,500,000
10	jasa	Roding pipa duct	1,000	m	7,800	7,800,000
11	jasa	Galian tanah kedalaman 40 cm	730	m	19,500	14,235,000
12	jasa	Penarikan Kabel Fiber Optik 48 core	1,780	m	7,500	13,350,000
13	jasa	Penarikan subduct HDPE	430	m	7,500	3,225,000
14	jasa	Buka Tutup Maninhole dan Pengeringan	8	titik	150,000	1,200,000
15	jasa	Bobok Dinding Mainhole dan Ducting	1	m	345,000	345,000
16	jasa	Pemasangan ODC-144	1	unit	3,450,000	3,450,000
17	jasa	Pemasangan OTB Rack 48-C di BBT	1	unit	1,100,000	1,100,000
18	jasa	pemasangan OTB	2	unit	390,000	780,000
19	jasa	Splasing Optic dan OTDR	120	core	55,000	6,600,000
20	jasa	Perbaikan Beton	1	ls	1,900,000	1,900,000
21	jasa	Dokumentasi	1	ls	400,000	400,000
22	jasa	Uji Terima	1	ls	2,000,000	2,000,000
23	jasa	Mobilisasi	1	ls	1,800,000	1,800,000
		Total Jasa				58,185,000
Grand total						59,685,000

Note:

Lama pekerjaan : 15 hari setelah terima PO & Ijin

Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai

SPH Pembangunan jaringan FTTB, fiber optic 48 core
Simatelex Gedung Baru

1 attachment

CD cie Dongen <indotama_cia@yahoo.co.id>

To: Ferawaty Marpaung: - 1 other

Cc: Robby Susilo

16/12/2023 12:54 PM

SIMATELLEX TIX.pdf
131 KB

Dengan Hormat

Siang Bu Feri, terlampir SPH Pembangunan jaringan FTTB fiber optic 48
core Simatelex Gedung Baru

Terimakasih

Chatting

Reply Reply all Forward

Batam, 15 Desember 2023

CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG

Direktur

Tanggal 15 Des 2023

Kode Referensi JUST/23/0424

Vendor :CITRA INDOTAMA, CV

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Semen, pasir dan kerikil	1	ls	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
2	Roding pipa duct	1000	m	8,000	7,800,000	7,800,000	8,000,000
3	Galian tanah kedalaman 40 cm	730	m	26,000	14,235,000	14,235,000	18,980,000
4	Penarikan Kabel Fiber Optik 48 core	1780	m	12,000	13,350,000	13,350,000	21,360,000
5	Penarikan subduct HDPE	430	m	12,000	3,225,000	3,225,000	5,160,000
6	Buka Tutup Maninhole dan Pengeringan	8	titik	150,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
7	Bobok Dingding Mainhole dan Ducting	1	m	350,000	345,000	345,000	350,000
8	Pemasangan ODC-144	1	unit	3,500,000	3,450,000	3,450,000	3,500,000
9	Pemasangan OTB Rack 48-C di BBT	1	unit	1,200,000	1,100,000	1,100,000	1,200,000
10	pemasangan OTB	2	unit	400,000	780,000	780,000	800,000
11	Splasing Optic dan OTDR	120	core	55,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000
12	Perbaikan Beton	1	ls	2,000,000	1,900,000	1,900,000	2,000,000
13	Dokumentasi	1	ls	500,000	400,000	400,000	500,000
14	Uji Terima	1	ls	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
15	Mobilisasi	1	ls	2,000,000	1,800,000	1,800,000	2,000,000
				Subtotal	59,685,000	59,685,000	75,150,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 15 hari
- Termin Pembayaran :
☐ DP **0 %**
☒ Termin-1 **100 %**
☐ Termin-2 **0 %**
☐ Retensi **0 %**

- Lama pekerjaan : 15 hari setelah terima PO & Perijinan
 - pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai
- Garansi : 0 hari

Alasan Skip Quotation	Karena limitasi waktu delivery
------------------------------	--------------------------------

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/suplier **CITRA INDOTAMA, CV** dengan vendor id **VDR21-0003** sebagai pelaksana pekerjaan **Pembangunan jaringan FTTB, fiber optic 48 core Simatelex Gedung Baru** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 59,685,000**

Alasan penunjukan

- Karena limitasi waktu delivery
- Lama pekerjaan : 15 hari setelah terima PO & Perijinan
- Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai

Catatan Direktur Operasional

ok, tanpa perbandingan karena harga satuan sama dengan PO sebelumnya belum lama ini

Diajukan oleh,



FERAWATY MARPAUNG

Procurement Officer

DateTime : 2023-12-15 12:05:31

Diperiksa oleh,



ROBBY SUSILO

Chief Financial & HR Officer

DateTime : 2023-12-15 16:36:27

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE

Direktur Operasional

DateTime : 2023-12-18 15:46:57

PURCHASE ORDER

NO. PUO/23/0270

Supplier Code : VOB-0003	Location Code : KBTM
Order Date : 18 December 2023	Reference : BAPV/23/0304-15 DEC 23
Expect. Rcpt. Date : 30 December 2023	Shipment Method : FOB Batam
Payment Terms : Max30 Days	Page No. : 1 of 2

SUPPLIER

CITRA INDOTAMA, CV
Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1
Batam BT
Indonesia
TEL: 0778-395 000

DELIVER TO

KANTOR BATAM
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	Material				
1.	Semen, pasir dan kerikil	1 LS	1,500,000.00	-	1,500,000.00
	Jasa				
2.	Roding pipa duct	1000 MTR	7,800.00	-	7,800,000.00
3.	Galian tanah kedalaman 40 cm	730 MTR	19,500.00	-	14,235,000.00
4.	Penarikan Kabel Fiber Optik 48 core	1780 MTR	7,500.00	-	13,350,000.00
5.	Penarikan subduct HDPE	430 MTR	7,500.00	-	3,225,000.00
6.	Buka Tutup Maninhole dan Pengeringan	8 TITIK	150,000.00	-	1,200,000.00
7.	Bobok Dingding Mainhole dan Ducting	1 MTR	345,000.00	-	345,000.00
8.	Pemasangan ODC-144	1 UNT	3,450,000.00	-	3,450,000.00
9.	Pemasangan OTB Rack 48-C di BBT	1 UNT	1,100,000.00	-	1,100,000.00
10.	pemasangan OTB	2 UNT	390,000.00	-	780,000.00
11.	Splasing Optic dan OTDR	120 COR	55,000.00	-	6,600,000.00
12.	Perbaikan Beton	1 LS	1,900,000.00	-	1,900,000.00
13.	Dokumentasi	1 LS	400,000.00	-	400,000.00
14.	Uji terima	1 LS	2,000,000.00	-	2,000,000.00
15.	Mobilisasi	1 LS	1,800,000.00	-	1,800,000.00
	Note:				
	- Lama pekerjaan : 15 hari setelah terima PO & Ijin				
	- Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai				

PURCHASE ORDER

NO. PUO/23/0270

Supplier Code : VOB-0003	Location Code : KBTM
Order Date : 18 December 2023	Reference : BAPV/23/0304-15 DEC 23
Expect. Rcpt. Date : 30 December 2023	Shipment Method : FOB Batam
Payment Terms : Max30 Days	Page No. : 2 of 2

SUPPLIER CITRA INDOTAMA, CV Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1 Batam BT Indonesia TEL: 0778-395 000	DELIVER TO KANTOR BATAM PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam 29433
--	--

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)

 Abdullah Pratama Habibie ----- Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 59,685,000.00
---	--	---------------------------------------

BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING

(BATC)


BATC/23/0048

Pembangunan jaringan FTTH, fiber optic 48 core Simatelex Gedung Baru

Pada hari ini, Kamis tanggal 28 Desember 2023 telah dilaksanakan Pembangunan jaringan FTTH, fiber optic 48 core Simatelex Gedung Baru sesuai dengan No. PUO/23/0270 tanggal 18 Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			PO	REALISASI	
	Material				
1	Semen, pasir dan kerikil	LS	1	1	
2	OTB Rack 48 core SC	PCS	-	1	
	Jasa				
1	Roding pipa duct	MTR	1,000	1,000	
2	Galian tanah kedalaman 40 cm	MTR	730	730	
3	Penarikan Kabel Fiber Optik 48 core	MTR	1,780	1,780	
4	Penarikan subduct HDPE	MTR	430	430	
5	Buka Tutup Maninhole dan Pengeringan	TITIK	8	8	
6	Bobok Dinding Mainhole dan Ducting	MTR	1	1	
7	Pemasangan ODC-144	UNT	1	1	
8	Pemasangan OTB Rack 48-C di BBT	UNT	1	1	
9	pemasangan OTB	UNT	2	2	
10	Splasing Optic dan OTDR	COR	120	120	
11	Perbaikan Beton	LS	1	1	
12	Dokumentasi	LS	1	-	
13	Uji terima	LS	1	1	
14	Mobilisasi	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			CV Citra Indotama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Senior FOO	 Eddy Naibaho Deputy CORO	 Timbul Nainggolan Chief Operational & Regulatory	 Daendels Sihotang Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0339

Pembangunan jaringan FTTH, fiber optic 48 core Simatelex Gedung Baru

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 28 December 2023

Purchase Order : PUO/23/0270
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Semen, pasir dan kerikil	LS	1.00	1.00	
2.	Roding pipa duct	MTR	1,000.00	1,000.00	
3.	Galian tanah kedalaman 40 cm	MTR	730.00	730.00	
4.	Penarikan Kabel Fiber Optik 48 core	MTR	1,780.00	1,780.00	
5.	Penarikan subduct HDPE	MTR	430.00	430.00	
6.	Buka Tutup Maninhole dan Pengeringan	TITIK	8.00	8.00	
7.	Bobok Dingding Mainhole dan Ducting	MTR	1.00	1.00	
8.	Pemasangan ODC-144	UNT	1.00	1.00	
9.	Pemasangan OTB Rack 48-C di BBT	UNT	1.00	1.00	
10.	pemasangan OTB	UNT	2.00	2.00	
11.	Splasing Optic dan OTDR	COR	120.00	120.00	
12.	Perbaikan Beton	LS	1.00	1.00	
13.	Dokumentasi	LS	1.00	1.00	
14.	Uji terima	LS	1.00	1.00	
15.	Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
16.	OTB Rack 48 core SC	PCS	1.00	1.00	
17.	Dokumentasi	LS	(1.00)	(1.00)	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0339

Pembangunan jaringan FTTH, fiber optic 48 core Simatelex Gedung Baru

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 28 December 2023

Purchase Order : PUO/23/0270
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

Batam , 28 Dec 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui


Ibrahim



Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor,



Mengetahui,



Risha Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,





Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN..23/000318.....

Input & Check By

Posted By





Risha Uli Susanti

Desmiati M

FOTO FTTH SIMATELEX LOT 155 MUKA KUNING

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4

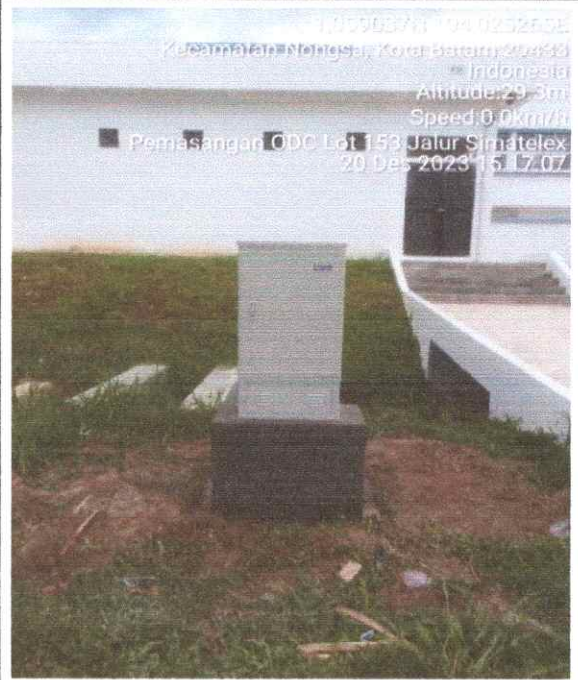


FOTO FTTH SIMATELEX LOT 155 MUKA KUNING

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4

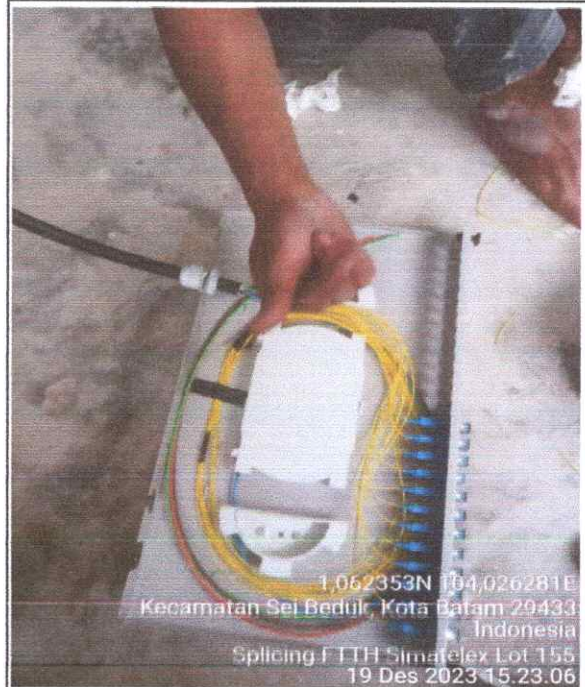


FOTO FTTH SIMATELEX LOT 155 MUKA KUNING

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



FOTO FTTH SIMATELEX LOT 155 MUKA KUNING

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4


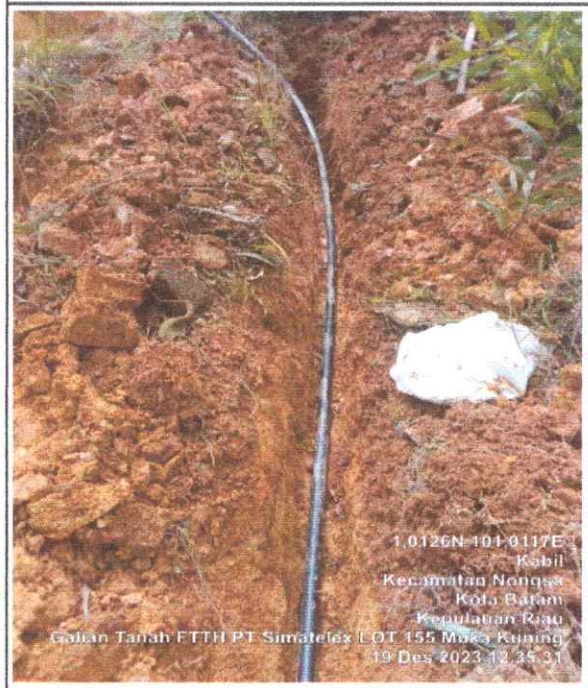


FOTO FTTH SIMATELEX LOT 155 MUKA KUNING


Picture 1



Picture 2

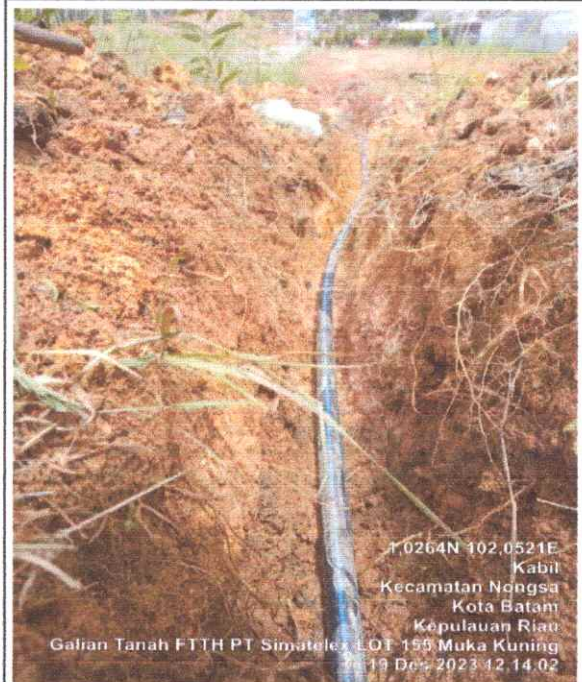

Picture 3

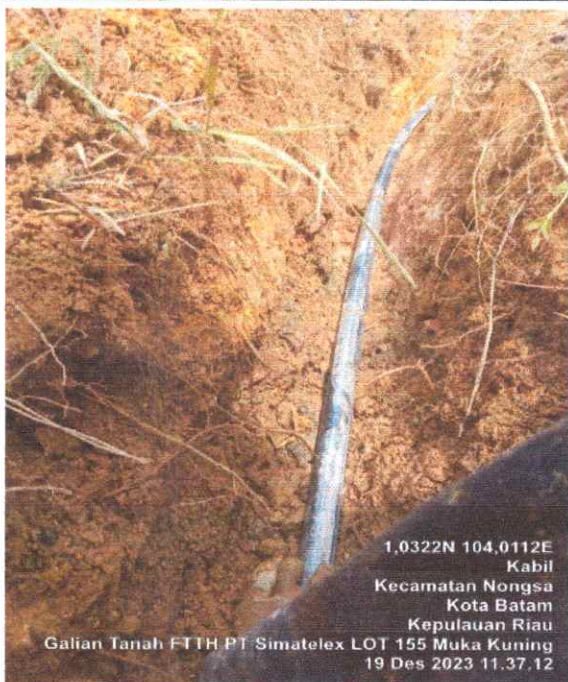

Picture 4

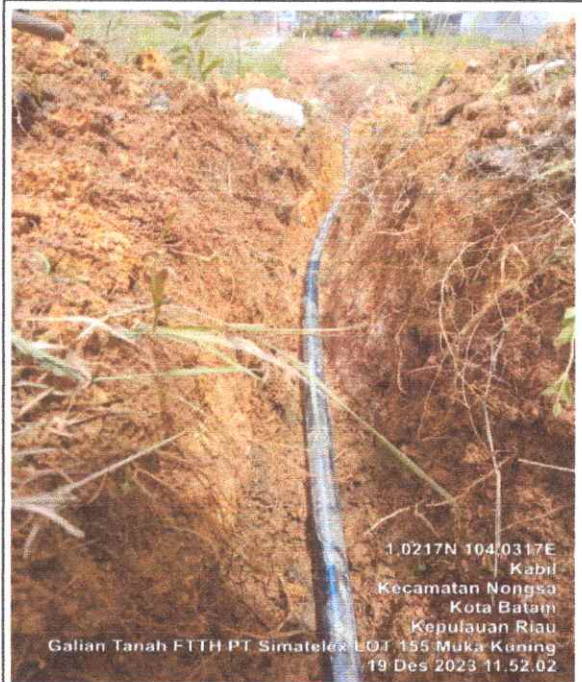


FOTO FTTH SIMATELEX LOT 155 MUKA KUNING


Picture 1



Picture 2



Picture 3

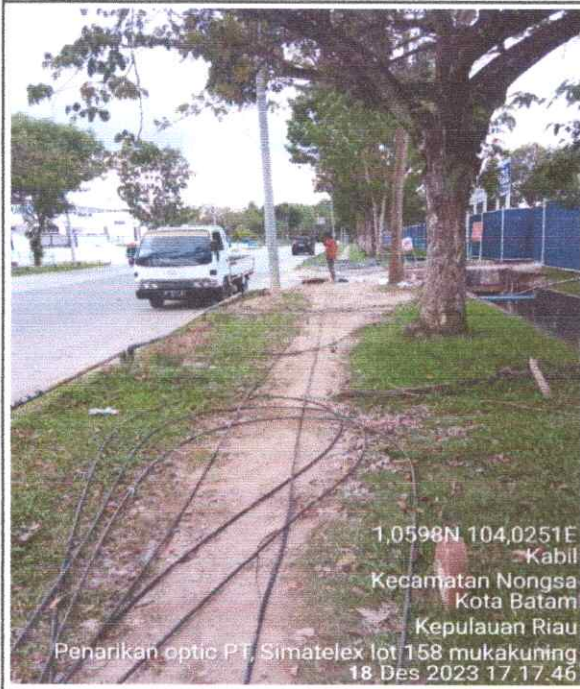

Picture 4

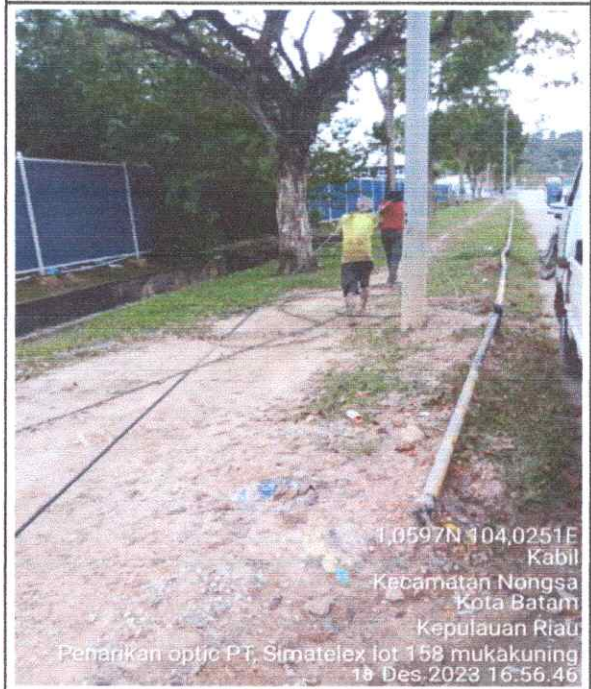


FOTO FTTH SIMATELEX LOT 155 MUKA KUNING

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4

