

PURCHASE ORDER


NO. PUO/24/0041

Supplier Code : VOB-0258	Location Code : KJKT
Order Date : 27 March 2024	Reference : BAPV/24/0035-25 Mar 2024
Expect. Rcpt. Date : 30 April 2024	Shipment Method : FOB Jakarta
Payment Terms : Cash On Delivery	Page No. : 1 of 1


SUPPLIER	DELIVER TO
PT Cyberplus Media Pratama RUKAN GRIYA ALIFA BLOK B/3, JL. PULO RIBUNG - TAMA Indonesia TEL: 02182418811	KANTOR JAKARTA PT.Batam Bintan Telekomunikasi Lantai 12 A, Menara Batavia, JL KH Mas Mansyur Kav 126 Jakarta 10250

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building				
	Material				
1.	Kabel Fiber Optik ADSS 24 Core	8000 MTR	10,177.50	-	81,420,000.00
2.	Perlengkapan kabel fiber optik (Aksesoris)	1 LS	5,100,000.00	-	5,100,000.00
3.	OTB Rackmount 48 Core	1 PCS	2,500,000.00	-	2,500,000.00
	Jasa				
4.	Penyambungan Kabel FO	96 MTR	43,750.00	-	4,200,000.00
5.	Penarikan Kabel FO (Include Pengamanan)	8000 MTR	8,812.50	-	70,500,000.00
6.	VAT-In	1 LS	18,009,200.00	-	18,009,200.00
	Note:				
	- RFS 45 Hari kerja setelah PO dan Down Payment (DP) diterima				
	- Lama Pengerjaan 30 Hari				
	- Garansi 30 Hari				
	- Metode Pembayaran:				
	o Down Payment (DP) (50 %, setelah PO diterbitkan)				
	o Pelunasan (50%, Setelah pengerjaan selesai 100% (dibuktikan dengan penandatanganan BAST)				

CANCELLED



 Abdullah Pratama Habiebie Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN Attn: 01.762.351.3-022.001 Menara Batavia LT.12, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI JKT	Total IDR 181,729,200.0
--	---	---------------------------------------



Telekomunikasi

We response to your need

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0041

Supplier Code : VOB-0258
Order Date : 27 March 2024
Expect. Rcpt. Date : 30 April 2024
Payment Terms : Cash On Delivery

Location Code : KJKT
Reference : BAPV/24/0035-25 Mar 2024
Shipment Method : FOB Jakarta
Page No. : 1 of 2

SUPPLIER

PT Cyberplus Media Pratama
RUKAN GRIYA ALIFA BLOK B/3, JL. PULO RIBUNG - TAMA
Indonesia
TEL: 02182418811

DELIVER TO

KANTOR JAKARTA
PT.Batam Bintang Telekomunikasi
Lantai 12 A, Menara Batavia,
JL KH Mas Mansyur Kav 126
Jakarta 10250

No.	DESCRIPTION	QUANTITY		UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building						
Material						
1.	Kabel Fiber Optik ADSS 24 Core	8000	MTR	10,177.50	-	81,420,000.00
2.	Perlengkapan kabel fiber optik (Aksesoris)	1	LS	5,100,000.00	-	5,100,000.00
3.	OTB Rackmount 48 Core	1	PCS	2,500,000.00	-	2,500,000.00
Jasa						
4.	Penyambungan Kabel FO	96	MTR	43,750.00	-	4,200,000.00
5.	Penarikan Kabel FO (Include Pengamanan)	8000	MTR	8,812.50	-	70,500,000.00
6.	VAT-In	1	LS	18,009,200.00	-	18,009,200.00
BATK/24/0012-21 Juni 2024						
7.	Kabel Fiber Optik ADSS 24 Core	69	MTR	10,177.50	-	702,247.50
8.	Jasa Penarikan Galian (Open/Rojok)	68	MTR	120,000.00	-	8,160,000.00
9.	Penarikan Kabel FO (Include Pengamanan)	1069	MTR	8,812.50	-	9,420,562.50
10.	Kabel FO 24 Core (Jumper)	200	MTR	10,177.00	-	2,035,400.00
11.	Penyambungan Kabel FO	96	MTR	43,750.00	-	4,200,000.00
12.	VAT-In	1	LS	2,697,003.00	-	2,697,003.00
Note:						
- RFS 45 Hari kerja setelah PO dan Down Payment (DP) diterima						
- Lama Pengerjaan 30 Hari						
- Garansi 30 Hari						
- Metode Pembayaran:						
o Down Payment (DP) (50 %, setelah PO diterbitkan)						



Telekomunikasi

We response to your need

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0041

Supplier Code	: VOB-0258	Location Code	: KJKT
Order Date	: 27 March 2024	Reference	: BAPV/24/0035-25 Mar 2024
Expect. Rcpt. Date	: 30 April 2024	Shipment Method	: FOB Jakarta
Payment Terms	: Cash On Delivery	Page No.	: 2 of 2

SUPPLIER

PT Cyberplus Media Pratama

RUKAN GRIYA ALIFA BLOK B/3, JL. PULO RIBUNG - TAMA
Indonesia
TEL: 02182418811

DELIVER TO

KANTOR JAKARTA

PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Lantai 12 A, Menara Batavia,
JL KH Mas Mansyur Kav 126
Jakarta 10250

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	o Pelunasan (50%, Setelah pengerjaan selesai 100% (dibuktikan dengan penandatanganan BAST)				

Abdullah Pratama Habibie

Authorised Signature

Invoice Send to :

PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning
Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200

NPWP PPN Attn: 01.762.351.3-022.001

Menara Batavia LT.12, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta
Pusat, DKI JKT

Total

IDR 208,944,413.0


BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/24/0013

Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building

Pada hari ini, Jumat tanggal 14 Juni 2024 telah dilaksanakan Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building sesuai dengan No. PUO/24/0041 tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			PO	REALISASI	
	Material				
1	Kabel Fiber Optik ADSS 24 Core	MTR	8,000	8,069	
2	Perlengkapan kabel fiber optik (Aksesoris)	LS	1	1	
3	OTB Rackmount 48 Core	PCS	1	1	
	Jasa				
1	Penyambungan Kabel FO	MTR	96	192	
2	Penarikan Kabel FO (Include Pengamanan	MTR	8,000	9,069	
3	Galian (Open/rojok) + pasang subduct	mtr	-	68	
4	Kabel FO 24 Core (Jumper)	mtr	-	200	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi			PT Cyberplus Media Pratama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Novi Lestari NOC Staff	 Eddy Maibano Deputy CORO	 Timbul Mainggolan Chief Operational & Regulatory	<u>Ryan Aditya P</u>

**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING
(BATC)
BATC/24/0013**

Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building

Pada hari ini, Jumat tanggal 14 Juni 2024 telah dilaksanakan Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building sesuai dengan No. PUO/24/0041 tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			PO	REALISASI	
	Material				
1	Kabel Fiber Optik ADSS 24 Core	MTR	8,000	8,069	
2	Perlengkapan kabel fiber optik (Aksesoris)	LS	1	1	
3	OTB Rackmount 48 Core	PCS	1	1	
	Jasa				
1	Penyambungan Kabel FO	MTR	96	192	
2	Penarikan Kabel FO (Include Pengamanan	MTR	8,000	9,069	
3	Galian (Open/rojok) + pasang subduct	mtr	-	68	
4	Kabel FO 24 Core (Jumper)	mtr	-	200	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			PT Cyberplus Media Pratama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
Novi Lestari NOC Staff	Eddy Naibaho Deputy CORO	Timbul Nainggolan Chief Operational & Regulatory	 Ryan Aditya P


INTERNET SERVICE PROVIDER

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0116

Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building

Supplier Code : VOB-0258
Document Date : 21 June 2024

Purchase Order : PUO/24/0041
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Kabel Fiber Optik ADSS 24 Core	MTR	8,000.00	8,000.00	
2.	Perlengkapan kabel fiber optik (Aksesoris)	LS	1.00	1.00	
3.	OTB Rackmount 48 Core	PCS	1.00	1.00	
4.	Penyambungan Kabel FO	MTR	96.00	96.00	
5.	Penarikan Kabel FO (Include Pengamanan)	MTR	8,000.00	8,000.00	
6.	VAT-In	LS	1.00	1.00	
7.	Kabel Fiber Optik ADSS 24 Core	MTR	69.00	69.00	
8.	Jasa Penarikan Galian (Open/Rojok)	MTR	68.00	68.00	
9.	Penarikan Kabel FO (Include Pengamanan)	MTR	1,069.00	1,069.00	
10.	Kabel FO 24 Core (Jumper)	MTR	200.00	200.00	
11.	Penyambungan Kabel FO	MTR	96.00	96.00	
12.	VAT-In	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta , 21 Jun 2024

PT Cyberplus Media Pratama


BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)

BAL/24/0116

Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building

Supplier Code : VOB-0258
Document Date : 21 June 2024

Purchase Order : PUO/24/0041
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan								
	PT. Batam Bintang Telekomunikasi User Mengetahui  Novi Lestari				Vendor,  Eddy Naibaho								
	Menyetujui,  <u>Timbul Nainggolan,</u> General Manager				<table border="1"><tr><td colspan="2">IT-GRN 24 / 000102</td></tr><tr><td>Input & Check By</td><td>Posted By</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Risna Uli Susanti</td><td>Apriansah</td></tr></table>	IT-GRN 24 / 000102		Input & Check By	Posted By			Risna Uli Susanti	Apriansah
IT-GRN 24 / 000102													
Input & Check By	Posted By												
													
Risna Uli Susanti	Apriansah												

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0116
Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building

Supplier Code	: VOB-0258	Purchase Order	: PUO/24/0041
Document Date	: 21 June 2024	Page No.	: 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan								
	PT. Batam Bintang Telekomunikasi User Mengetahui				Vendor,								
	Novi Lestari ----- Eddy Naibaho				 Ryan Aditya Purnomo PT Cyberplus media pratama INTERNET SERVICE PROVIDER								
	Menyetujui,												
	Timbul Nainggolan. General Manager				<table><tr><th colspan="2">IT-GRN.....</th></tr><tr><td>Input & Check By</td><td>Posted By</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Risna Uli Susanti</td><td>Apriansah</td></tr></table>	IT-GRN.....		Input & Check By	Posted By			Risna Uli Susanti	Apriansah
IT-GRN.....													
Input & Check By	Posted By												
Risna Uli Susanti	Apriansah												

BERITA ACARA TAMBAH/KURANG

(BATK)

BATK/24/0011

Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Jumat , 21 Juni 2024

Pelaksana Pekerjaan : Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building

No. PO : PUO/24/0041- 27 Maret 2024

Harga PO Awal : Rp 163,720,000

Harga PO Setelah Realisasi : Rp 188,238,210

BATK : Rp 24,518,210

% BATK : 14.98%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan PT CMP maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :


Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS	SATUAN	PO			REALISASI		JUMLAH HARGA
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	
	Material							
1	Kabel Fiber Optik ADSS 24 Core	MTR	8,000	10,177.50	81,420,000	8,069	10,177.50	82,122,248
2	Perlengkapan kabel fiber optik (Aksesoris)	LS	1	5,100,000	5,100,000	1	5,100,000	5,100,000
3	OTB Rackmount 48 Core	PCS	1	2,500,000	2,500,000	1	2,500,000	2,500,000
	Total Material				89,020,000			89,722,248
	Jasa							
1	Penyambungan Kabel FO	MTR	96	43,750	4,200,000	192	43,750	8,400,000
2	Penarikan Kabel FO (Include Pengamanan)	MTR	8,000	8,812.50	70,500,000	9,069	8,812.50	79,920,563
3	Galian (Open/rojok) + pasang subduct	mtr	-	-	-	68	120,000	8,160,000
4	Kabel FO 24 Core (Jumper)	mtr				200	10,177	2,035,400
					74,700,000			98,515,963
	Grand Total				163,720,000			188,238,210

1. Selisih Nilai BATK 24,518,210
2. % BATK
24,518,210 / 163,720,000 14.98%
3. PPN 11% = 20,706,203
4. Total Proyek = 208,944,413

Maka total Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building adalah sebesar : Rp. 208.944.413,- (Dua ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi	PT Cyberplus Media Pratama
Menyetujui,	Vendor,
 Abdullah Pratama Habibie Direktur Utama	 Ryan Aditya P INTERNET SERVICE PROVIDER

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%



PROJECT BINDER
PROJECT PENARIKAN KABEL 24 CORE 9 KM
CAWANG – GEDUNG ARIOBIMO SENTRAL
WILAYAH JALUR JAKARTA TIMUR DAN JAKARTA SELATAN

Vendor / Contractor : PT Cyberplus Media Pratama
Project Name : Cawang – Gedung Ariobimo Sentral (DCI)
PO Refenrence : BAPV/24/0035-25 Mar 2024
Site Name : DCI Ariobimo
Date of Acceptance :
Accepttance Status :

- ☐ Pass, no pending items
☐ Pass, with pending items
☐ Rejected by Partner



PT CYBERPLUS MEDIA PRATAMA

TAHUN 2024



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BAST)

Pada hari **Jum'at** tanggal **21** bulan **Juni** tahun **2024**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
No. Tlp :
Perusahaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** sebagai perwakilan dari **PT Batam Bintan Telekomunikasi**.

Nama : Ryan Aditya Purnomo
No. Tlp : 0812-8115-2188
Perusahaan : PT Cyberplus Media Pratama
Alamat : Rukan Griya Alifa Blok B No. 3, Jl. Pulo Ribung Raya – Galaxy, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17147.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** sebagai perwakilan dari **PT Cyberplus Media Pratama**.

Pihak Kedua menyampaikan untuk progres pekerjaan **Penarikan Kabel 24 Core dari Cawang – Gedung Sentral Ariobimo**, sudah diselesaikan 100% berdasarkan kondisi akhir dan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama. Berikut detail barang yang telah di kerjakan :

No	Detail Pekerjaan	Telah Diserahkan	Telah Diterima
1	OTB 48 Core	✓	✓
2	OTB 24 Core	✓	✓
3	Kabel 24 Core	✓	✓
4	Penarikan Kabel 24 Core <i>*hasil OTDR terlampir pada halaman berikutnya</i>	✓	✓

Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dipegang oleh masing-masing pihak.

Yang Mengetahui
Pihak Pertama
PT Batam Bintan Telekomuikasi

Yang Menyerahkan
Pihak Kedua
PT Cyberplus Media Pratama

.....

Ryan Aditya Purnomo

BERITA ACARA TAMBAH KURANG (BATK)

Pada hari **Jum'at** tanggal **21** bulan **Juni** tahun **2024**, telah disepakati untuk pekerjaan tambah sesuai Item berikut :

1. Pekerjaan Penarikan Kabel FO 24 Core melalui bawah tanah atau Galian (Open/Rojok) Sepanjang 68 Meter di 2 lokasi, yaitu :
 - 1) Depan Kementrian ESDM sampai MH Ariobimo sepanjang 68 MeterDengan biaya penarikan sebesar Rp Rp8.160.000,00,-
2. Pekerjaan Penarikan Kabel FO 24 Core dari JC 6 sampai Gedung Ariobimo Sentral sepanjang 1069 Meter dengan biaya penarikan sebesar Rp9.420.562,50,-
3. Pekerjaan Pengadaan barang OTB 24 Core sebanyak 1 Unit.
4. Pekerjaan Pengadaan barang Kabel FO 24 Core sepanjang 1069 Meter.
5. Pekerjaan Penyambungan Kabel FO 24 core sebanyak 96 Core dengan biaya penyambungan Rp 4.200.000
6. Pekerjaan Pengadaan Kabel FO 24 Core (Jumper) 200 Meter

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Mengetahui
Pihak Pertama
PT Batam Bintan Telekomuikasi

Yang Menyerahkan
Pihak Kedua
PT Cyberplus Media Pratama

.....
Ryan Aditya Purnomo



BOQ DEPLOY / ACTUAL

NO.	JENIS	KETERANGAN	SATUAN	QTY	QTY as Build BOQ		Remakrk
				Standard PO	Actual	Deviation	
Materian Vendor							
1	Material Vendor	Kabel FO 24 Core ADSS	Meter	8000	9069	1069	Pekerjaan Tambah
1	Material Vendor	Kabel FO 24 Core ADSS (Jumper)	Meter	0	200	200	Pekerjaan Tambah
2	Material Vendor	Helical	Pcs	100	100	-	
3	Material Vendor	JC 48 Core	Pcs	6	6	-	
4	Material Vendor	OTB 48 Core	Unit	1	1	-	
5	Material Vendor	OTB 24 Core	Unit	0	1	1	Pekerjaan Tambah
Jasa							
1	Jasa Penarikan	Penarikan Kabel Udara	Meter	8000	9269	1269	Pekerjaan Tambah
2	Jasa Penarikan	Galian (Open/Rojok) + Pasang Subduct	Meter	0	68	68	Pekerjaan Tambah
3	Jasa Penyambungan	Penyambungan Kabel 24 Core	Pcs	96	192	96	Pekerjaan Tambah

Yang Mengetahui

Pihak Pertama

PT Batam Bintang Telekomuikasi

Yang Menyerahkan

Pihak Kedua

PT Cyberplus Media Pratama

.....

Ryan Aditya Purnomo

BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING

Pada hari **Jum'at** tanggal **21** bulan **Juni** tahun **2024**, telah dilakukan/diselesaikan Test dan Commisioning Jalur Fiber Optic PT Batam Bintan Telekomunikasi sepanjang kurang lebih 9,2 Km dengan hasil terlampir pada gambar dan sesuai dengan masingmasing core dengan Loss dB sebesar maksimal 5.000 dB.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Mengetahui
Pihak Pertama
PT Batam Bintan Telekomuikasi

Yang Menyerahkan
Pihak Kedua
PT Cyberplus Media Pratama





.....

Ryan Aditya Purnomo




DOKUMENTASI

Penarikan Kabel FO 24 Core

Selasa, 23 April 2024
 (Persiapan Penarikan Kabel FO)

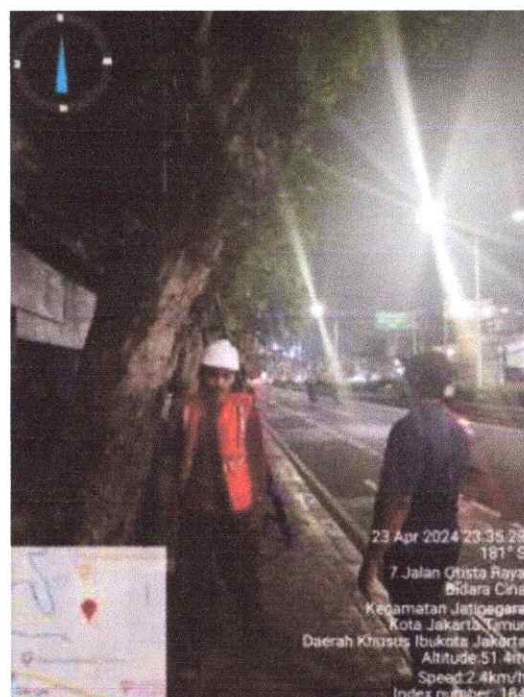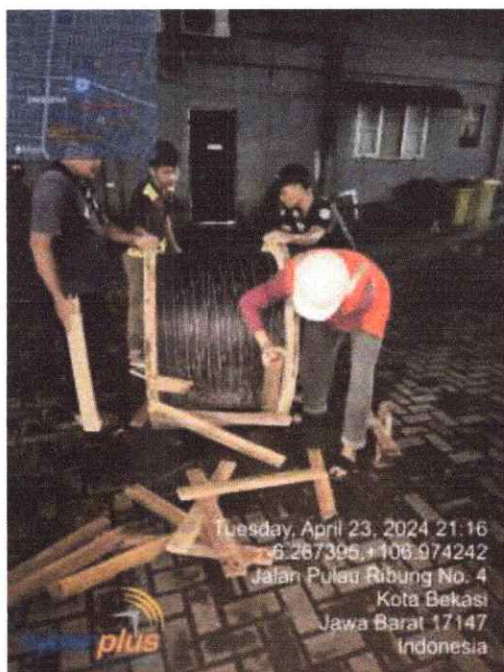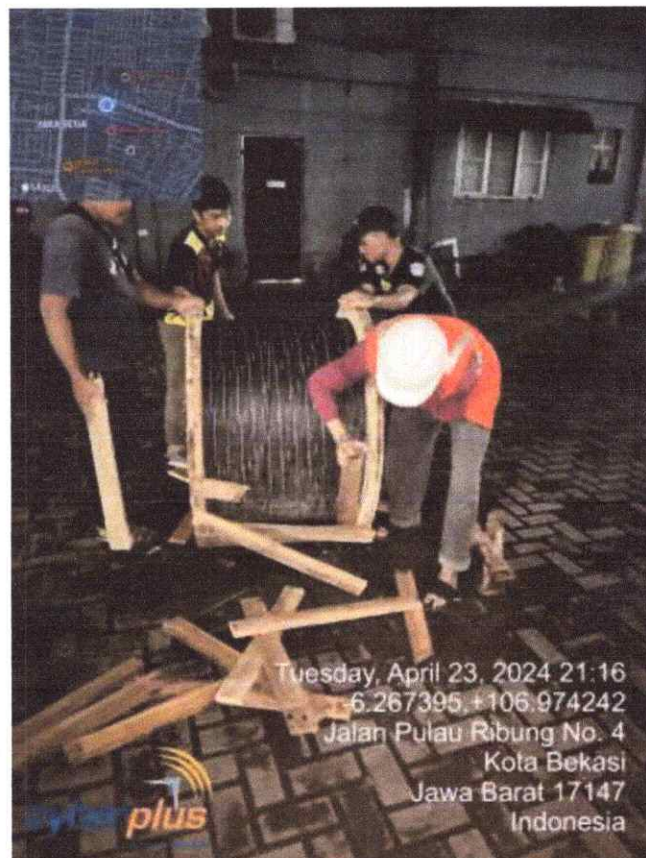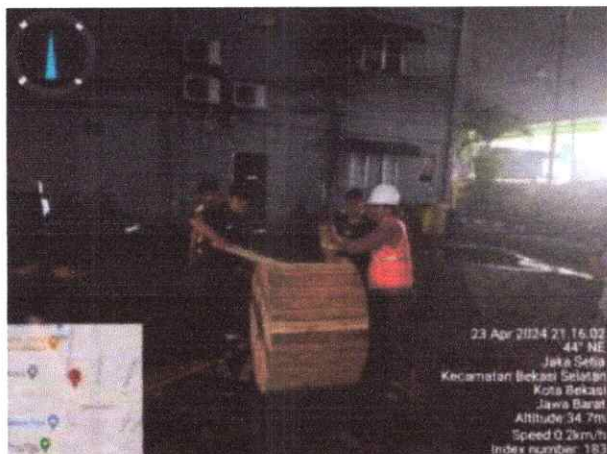

Rabu, 24 April 2024
(Penarikan Kabel FO Wilayah Cawang)

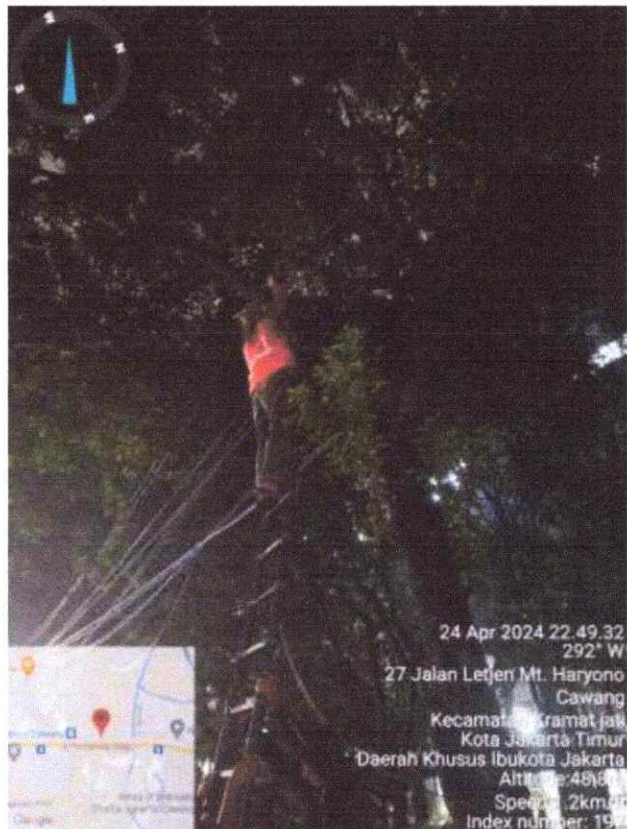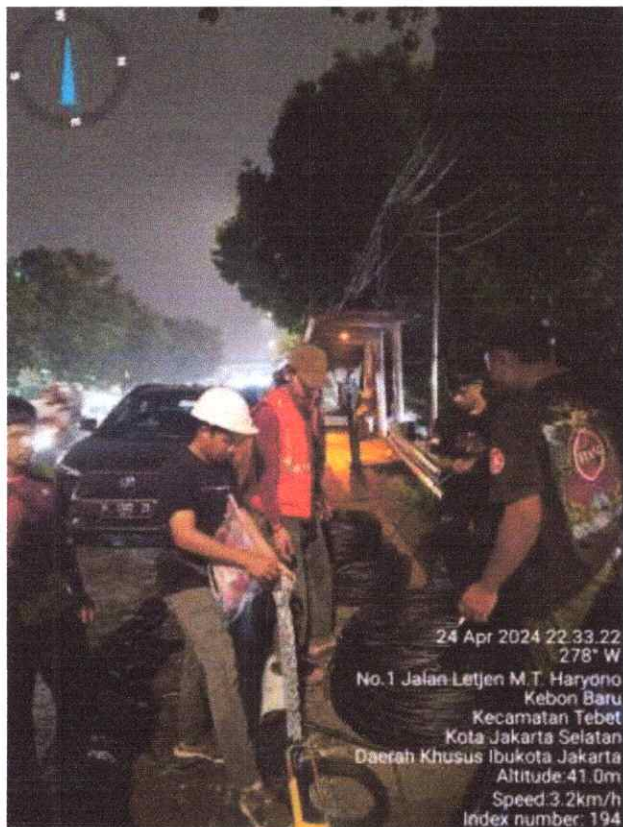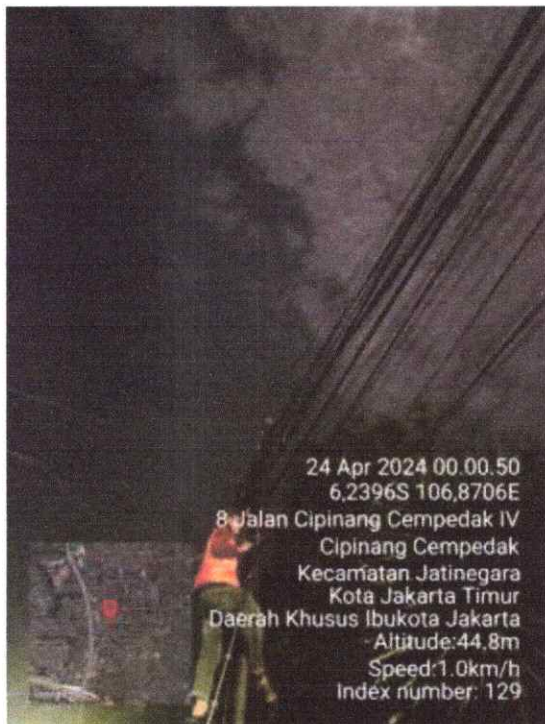


Kamis, 25 April 2024
(Penarikan Kabel FO Wilayah Tebet)




Jum'at, 26 April 2024
(Lanjut Penarikan Kabel FO Wilayah Tebet)




Sabtu, 27 April 2024
(Lanjut Penarikan Kabel FO Wilayah Tebet)

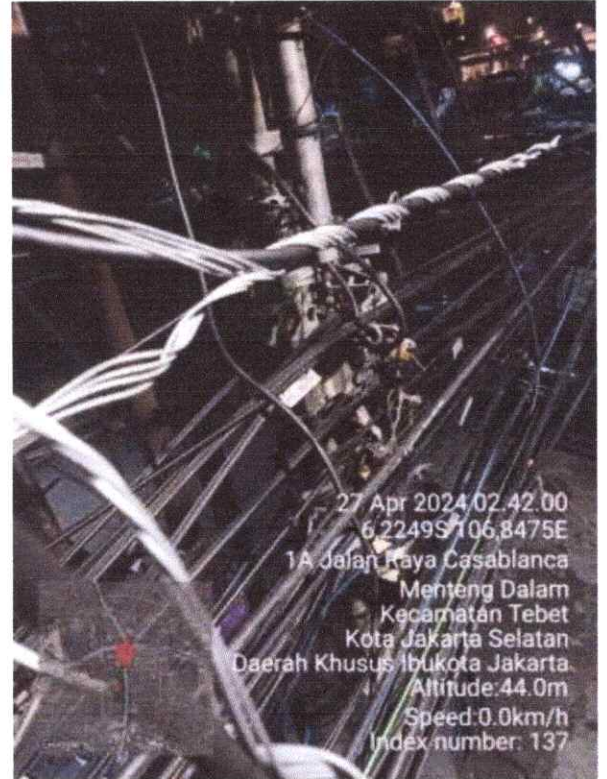




Minggu, 28 April 2024
(Penyambungan Kabel FO Wilayah Tebet)

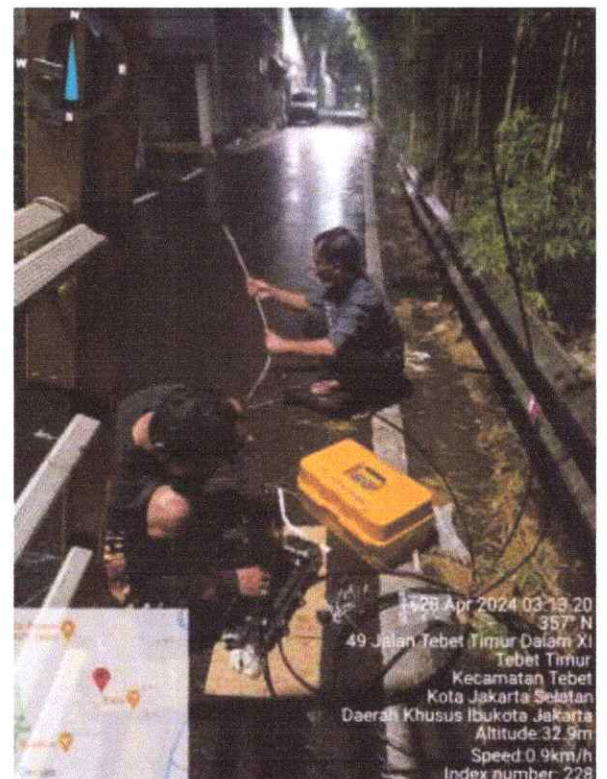

Senin, 10 Mei 2024
(Penarikan Kabel FO Wilayah Setiabudi, Kuningan)

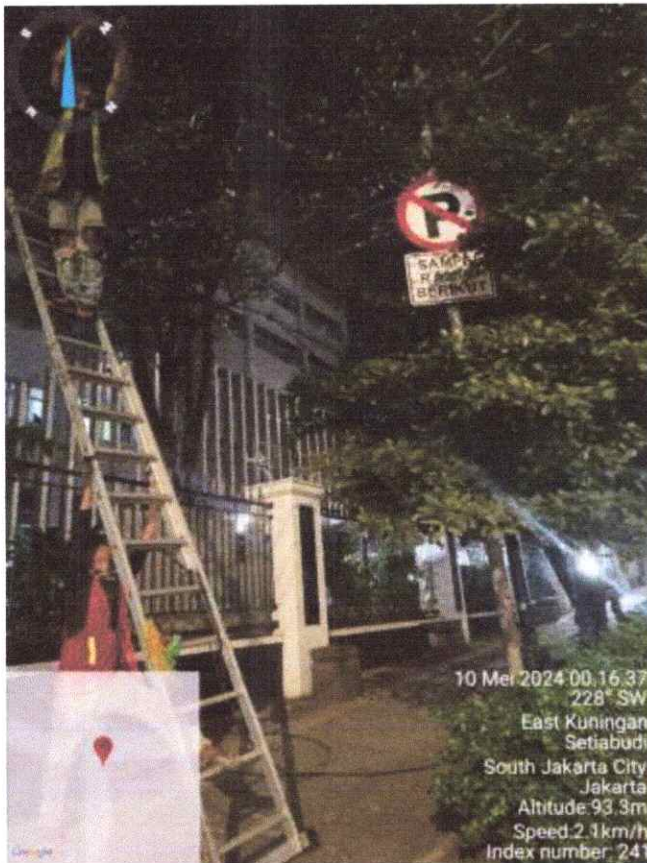

Jum'at, 10 Mei 2024
(Pekerjaan Gali Alur Wilayah Setiabudi, Kuningan)

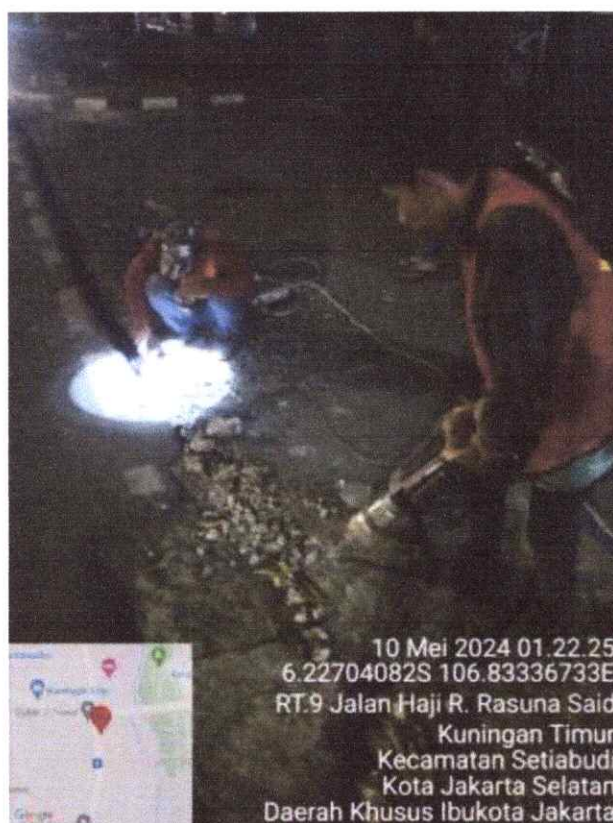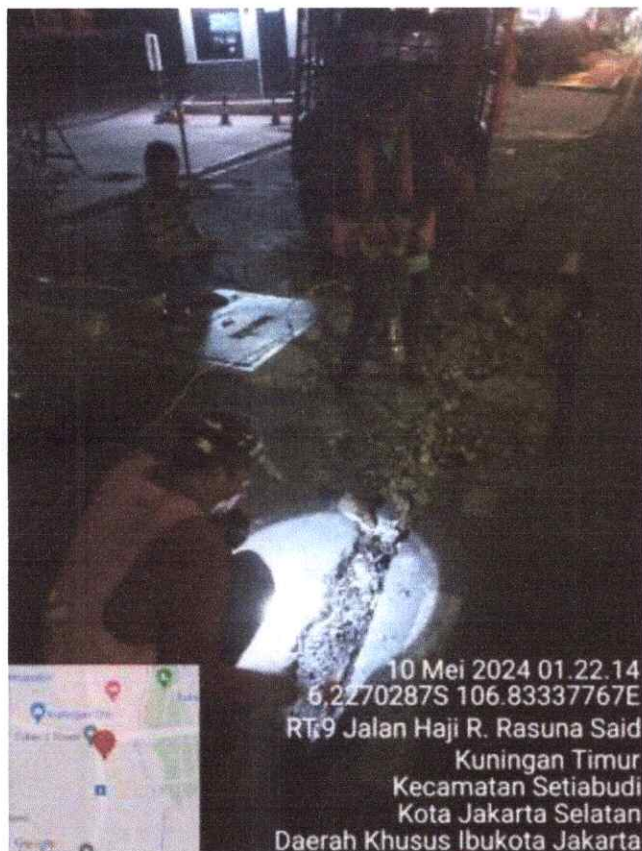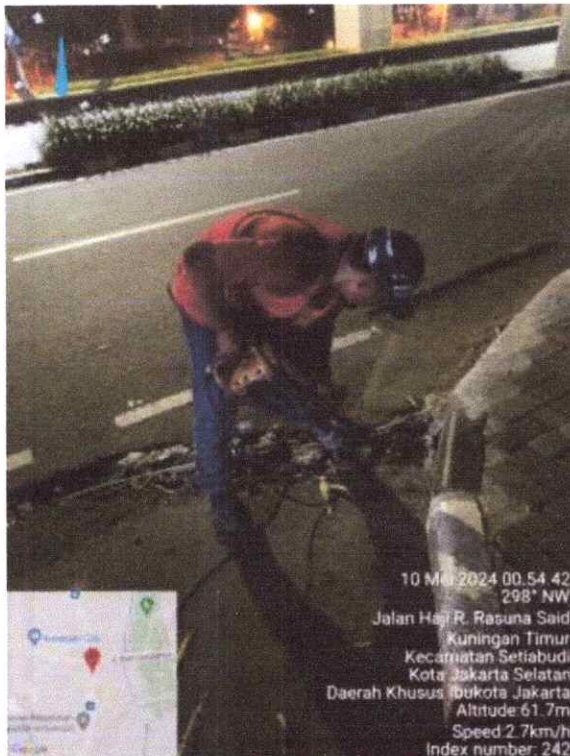

Senin, 13 Mei 2024
(Penarikan Indoor Kabel FO menuju Rack DCI)







Selasa, 14 Mei 2024
(Lanjut Penarikan Indoor Kabel FO menuju Rack DCI)



Rabu, 15 Mei 2024

(Perapihan Kabel FO menuju Rack DCI dan Pemasangan Label Akrilik Pada Kabel FO)

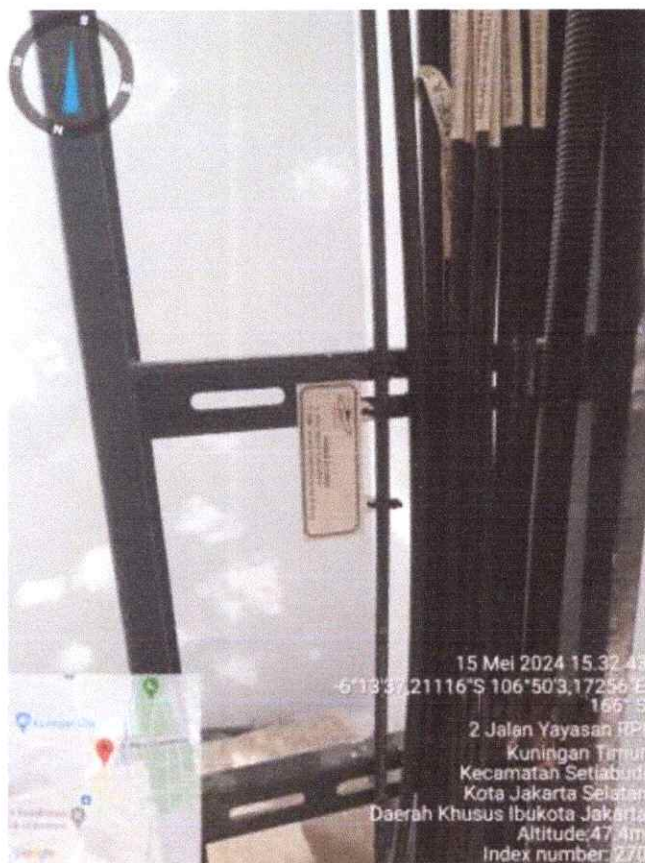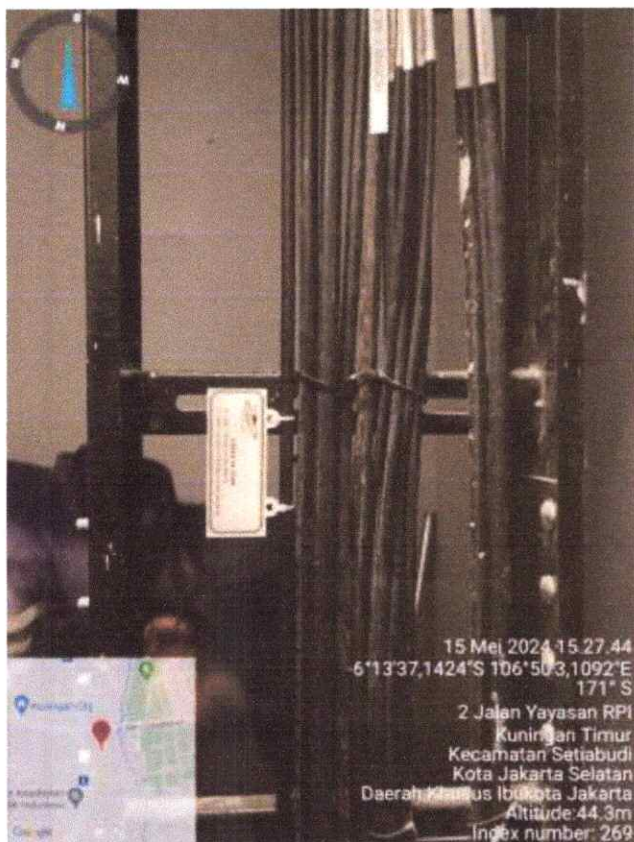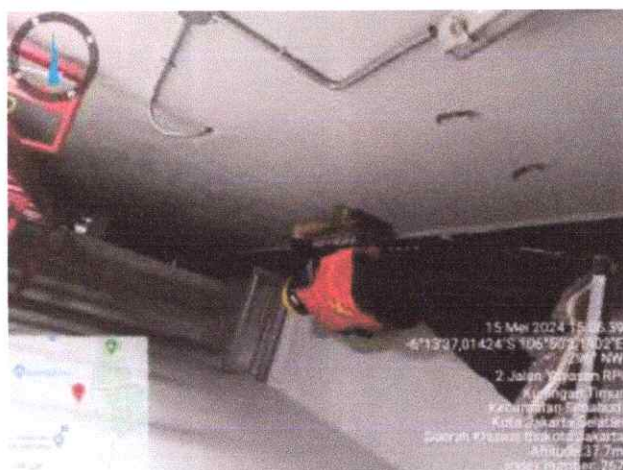

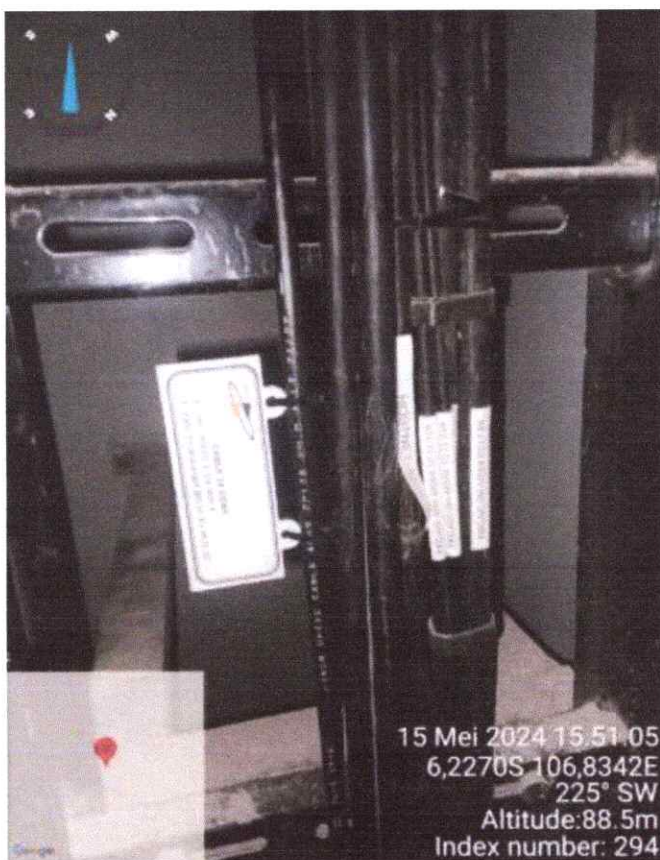


Rabu, 15 Mei 2024
(Pemasangan OTB 24 Core pada Rack BBT)



Selasa, 21 Mei 2024
(Perapihan Kabel FO pada MH milik Ariobimo)




21 Mei 2024 13.53.27
6,2276S 106,8343E
7 B
Kuningan Timur
Kecamatan Setiabudi
Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

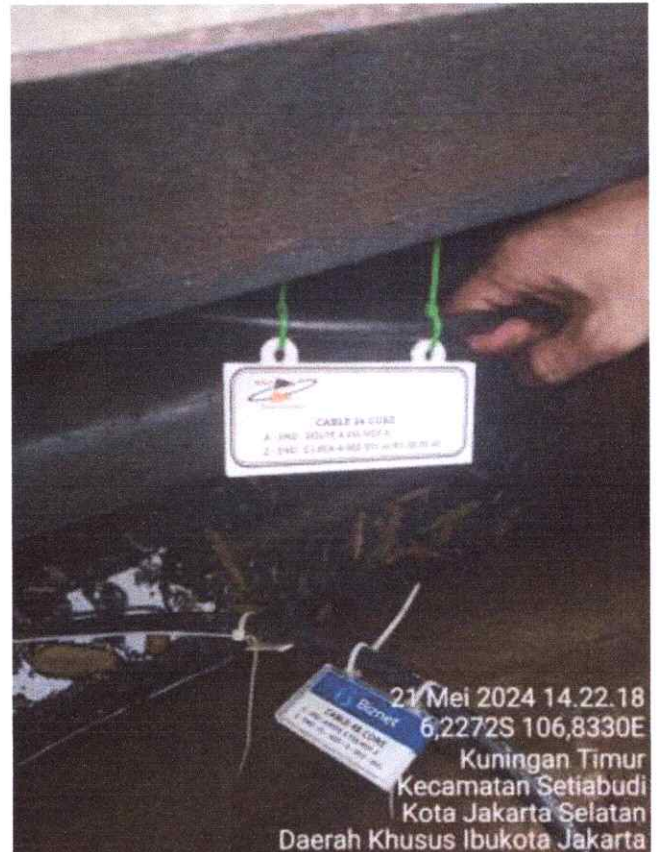

21 Mei 2024 14.22.18
6,2272S 106,8330E
Kuningan Timur
Kecamatan Setiabudi
Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Selasa, 21 Mei 2024
(Penarikan Gali Alur/Rojok Kabel FO di area Polsek Jatinegara)

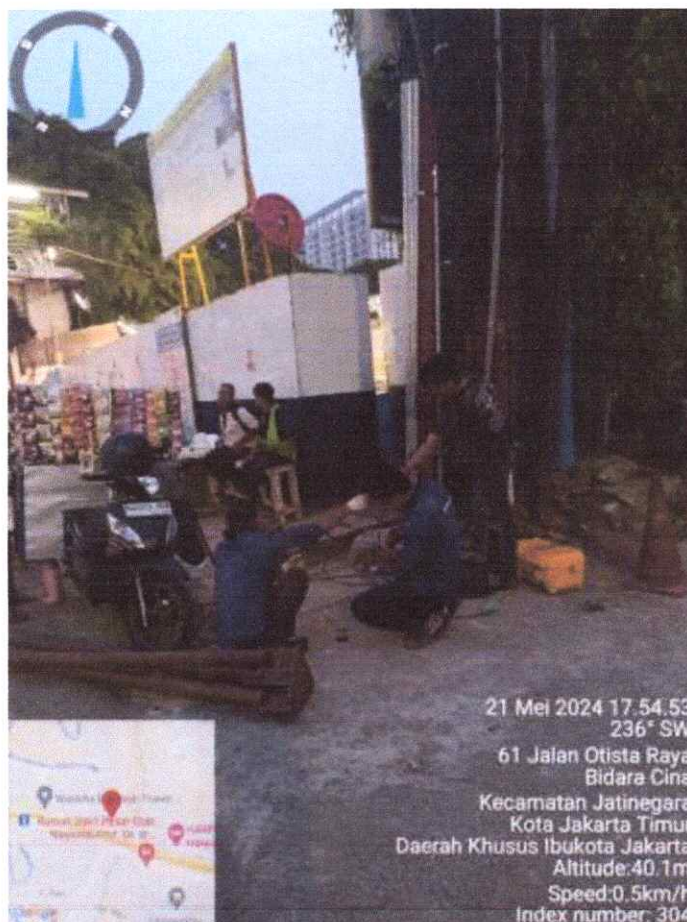


21 Mei 2024 17.54.53
236° SW
61 Jalan Otista Raya
Bidara Cina
Kecamatan Jatinegara
Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Altitude: 40.1m
Speed: 0.5km/h
Index number: 304


DOKUMENTASI OTDR

Tube 1 Core 1

Panjang : 9.265 Meter
Total Loss dB : 3.133

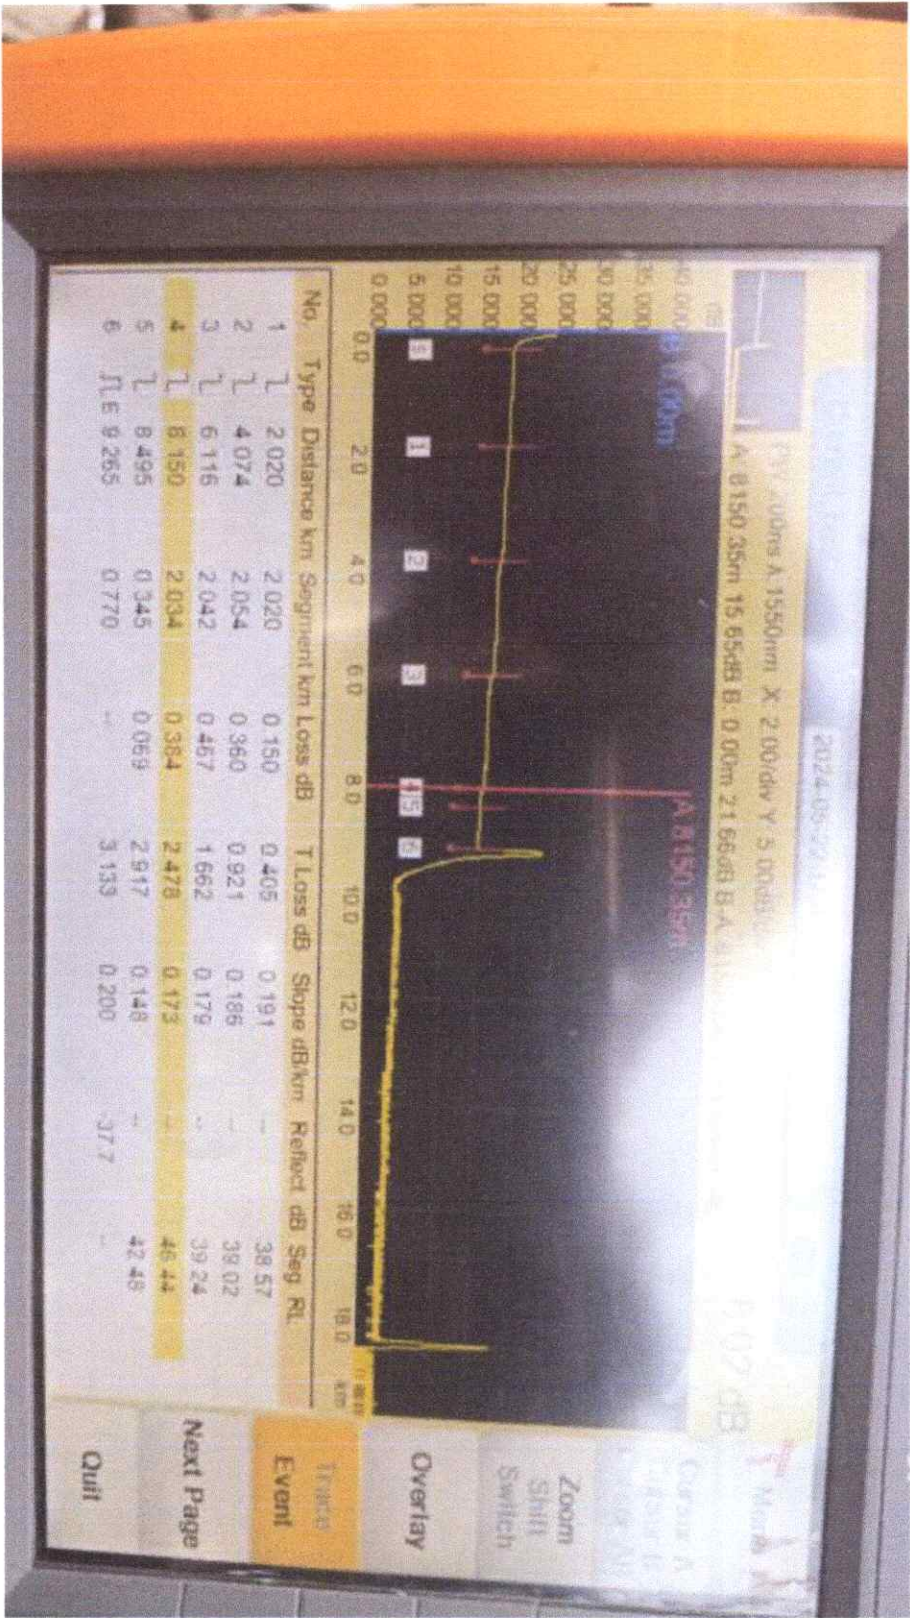


Total Loss dB : 3.434

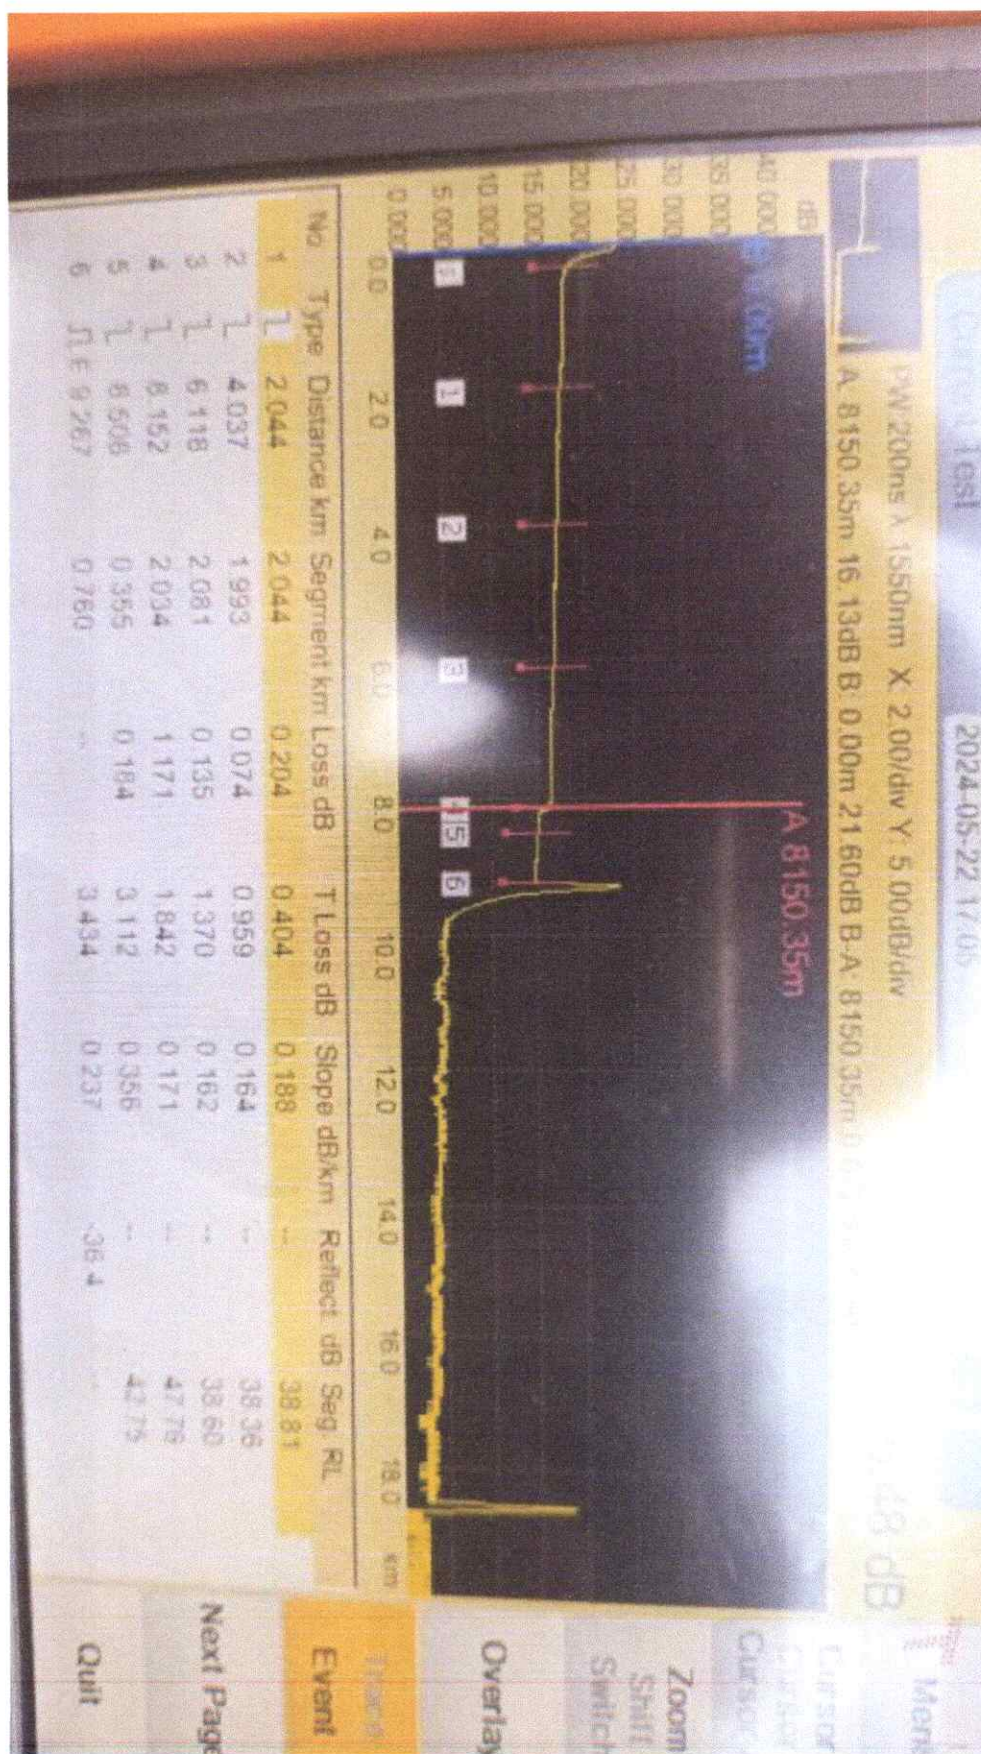

Tube 1 Core 3

Panjang : 9.267 Meter


Total Loss dB : 2.142

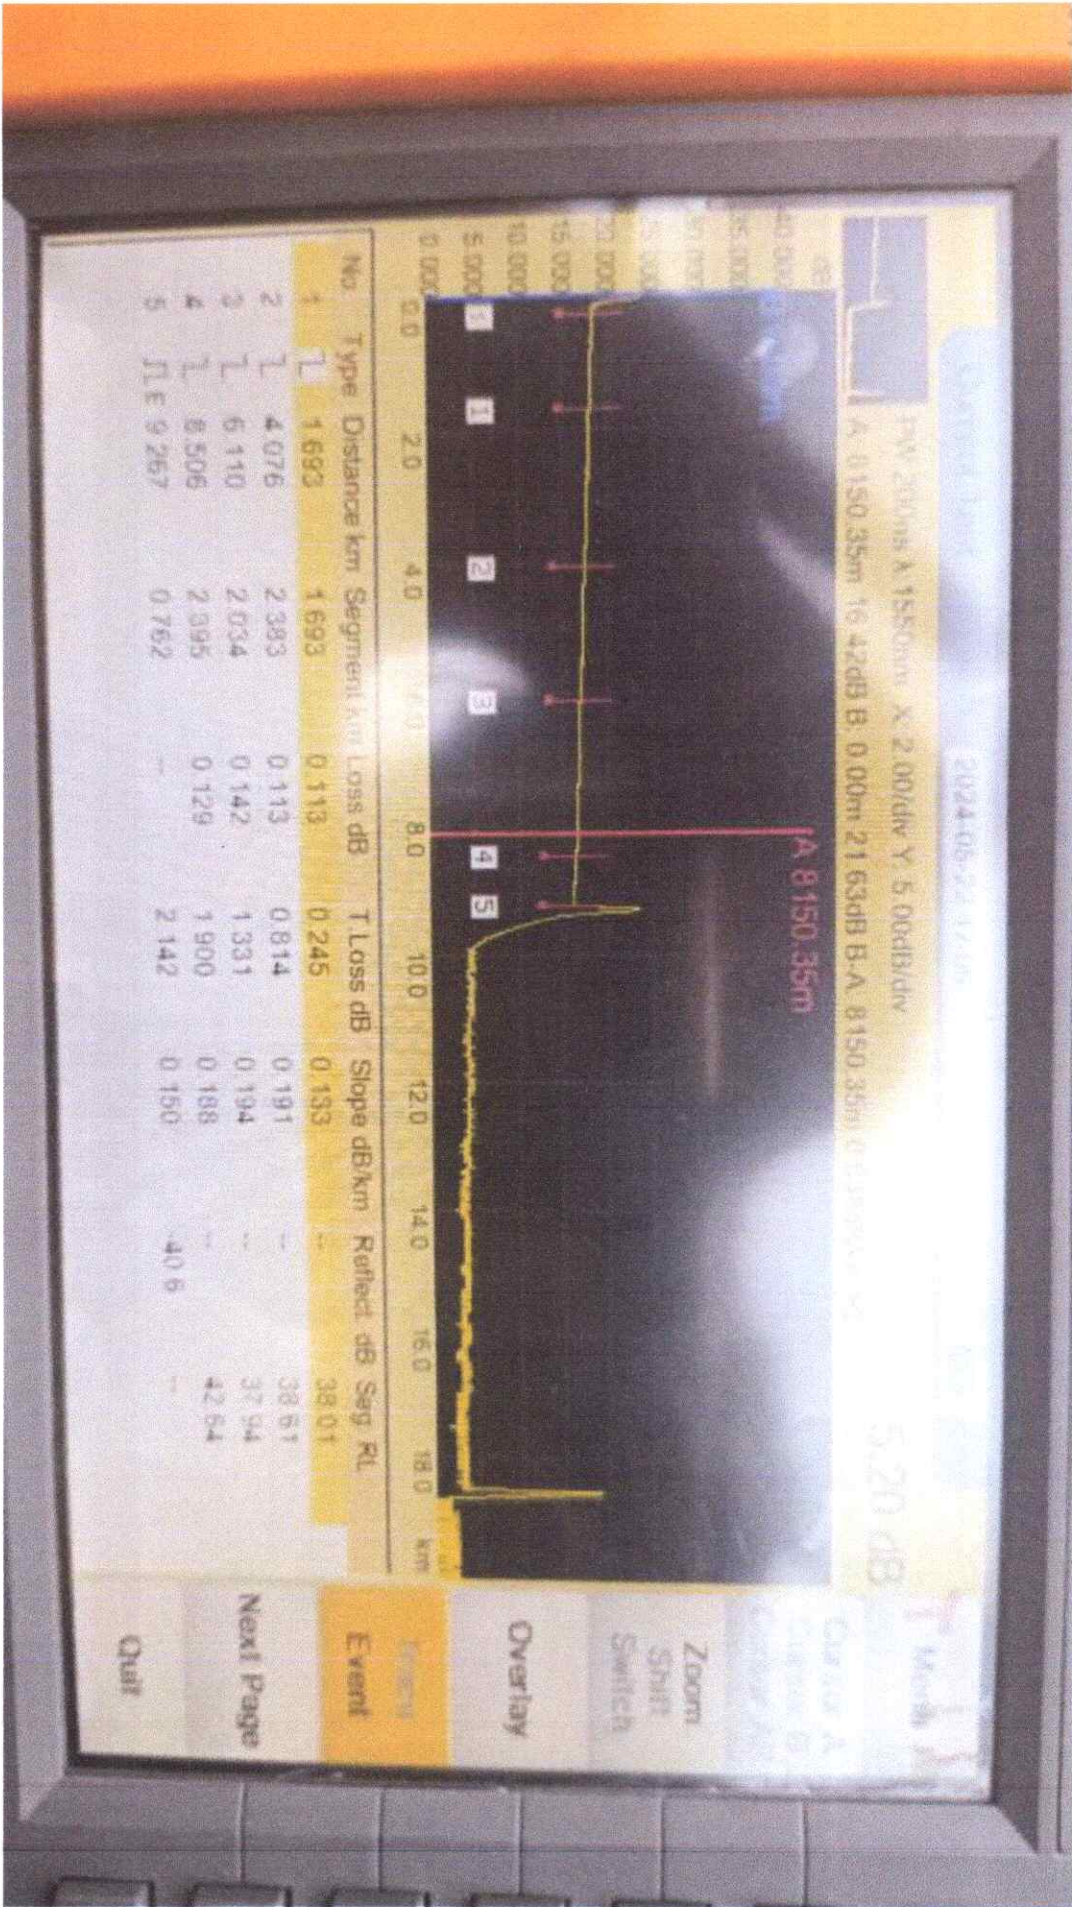

Tube 1 Core 4

Panjang : 9.267 Meter


Total Loss dB : 3.434

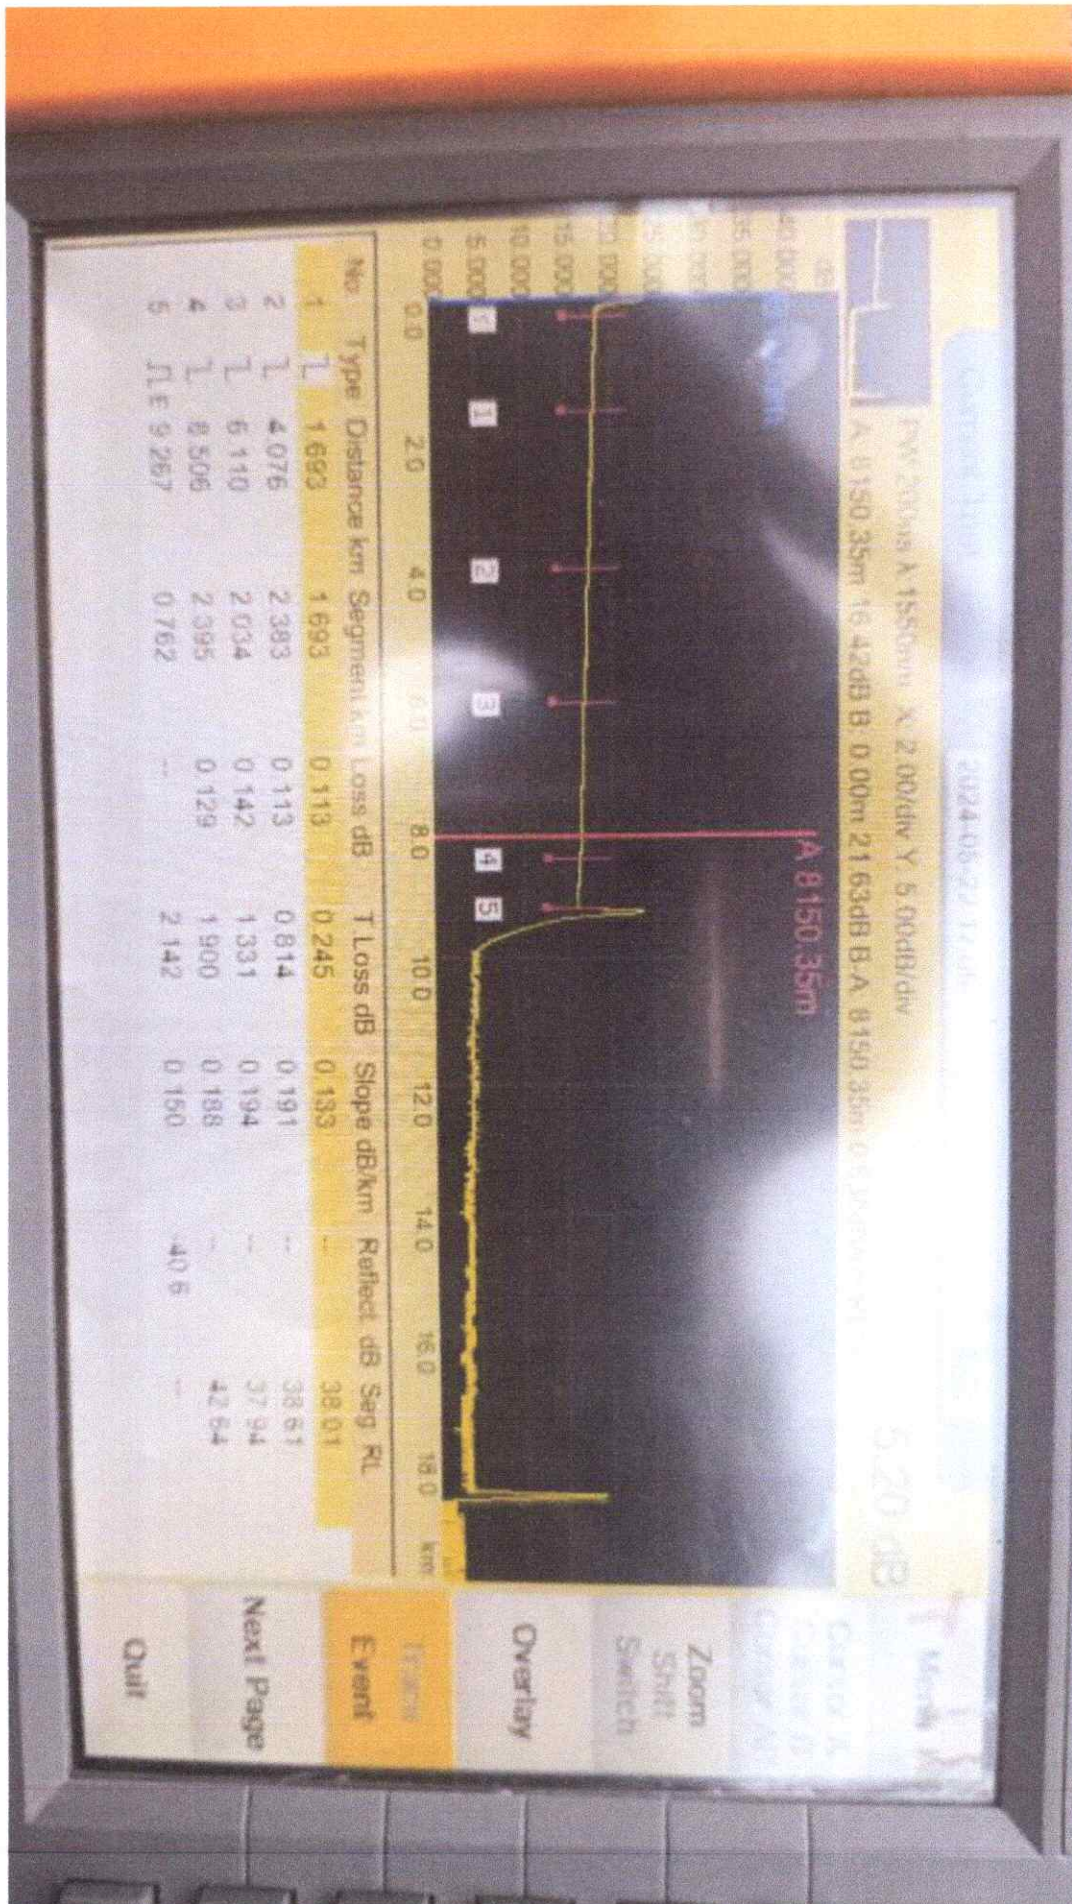

Tube 1 Core 5

Panjang : 9.267 Meter


Total Loss dB : 2.504

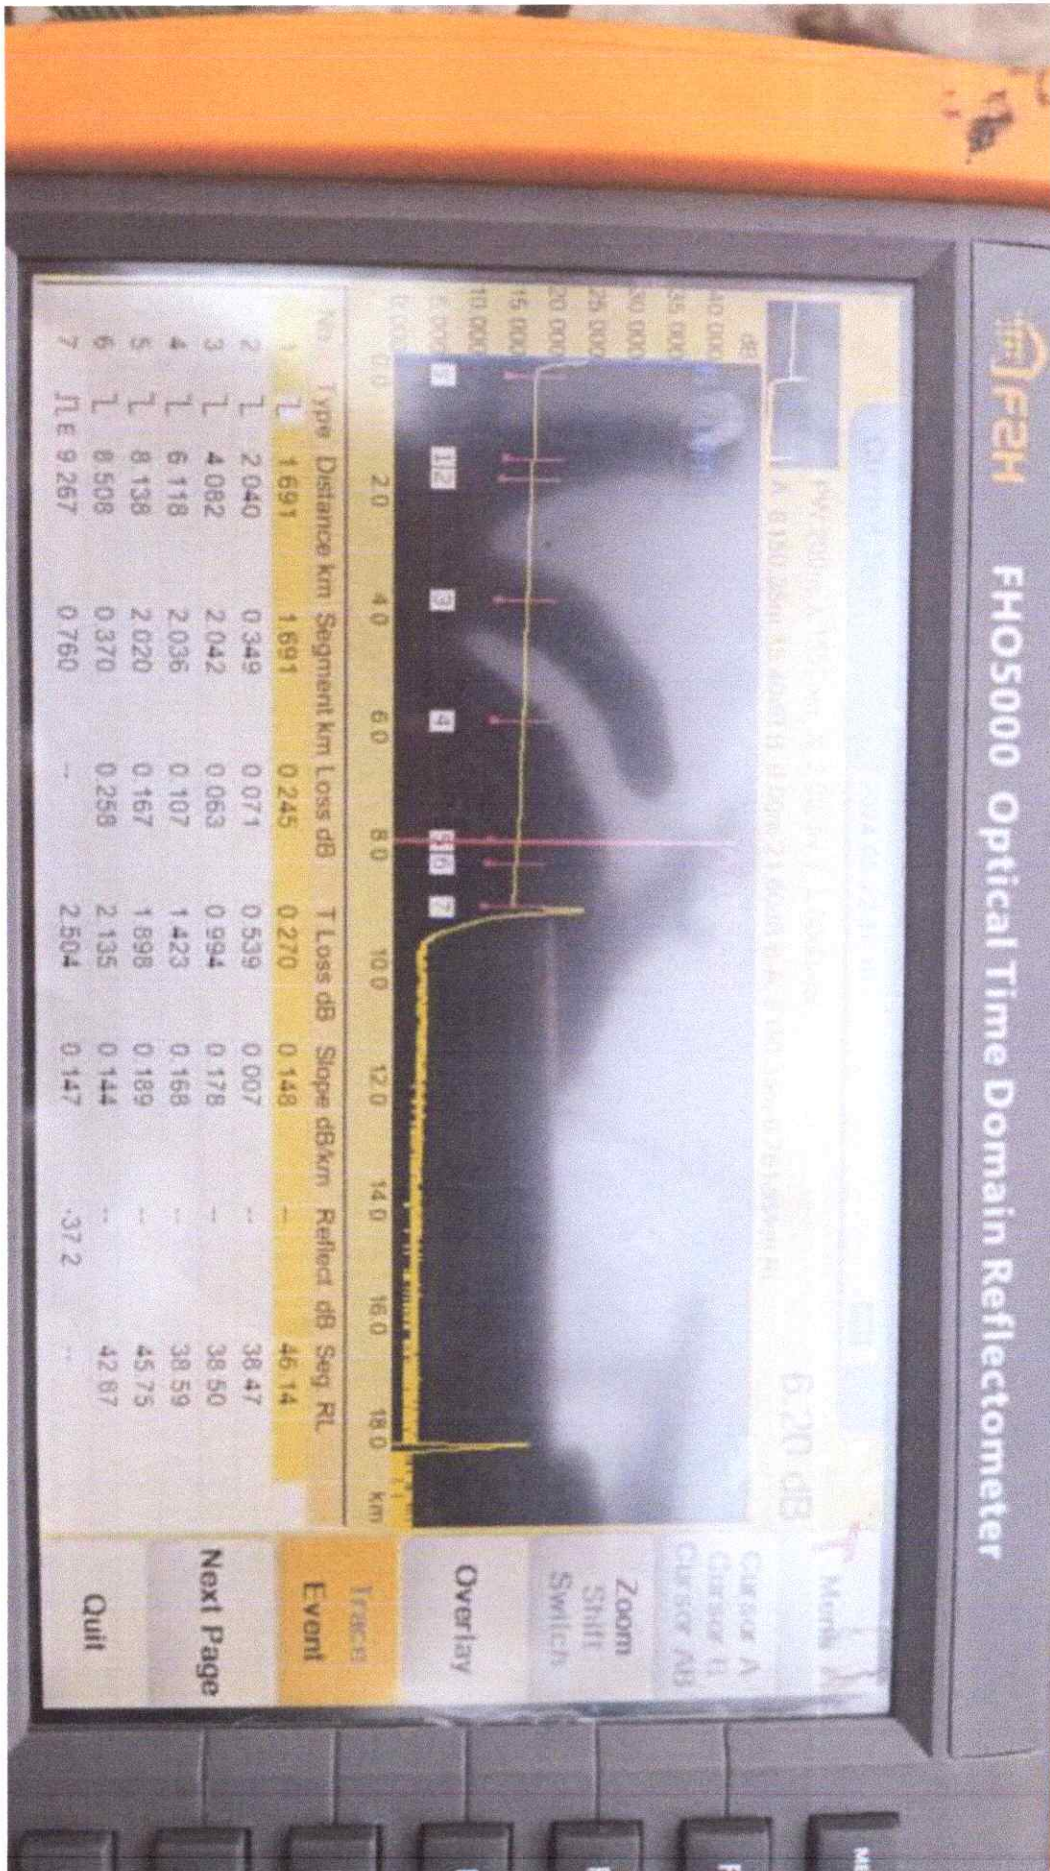

Tube 1 Core 6

Panjang : 9.267 Meter


Total Loss dB : 2.787

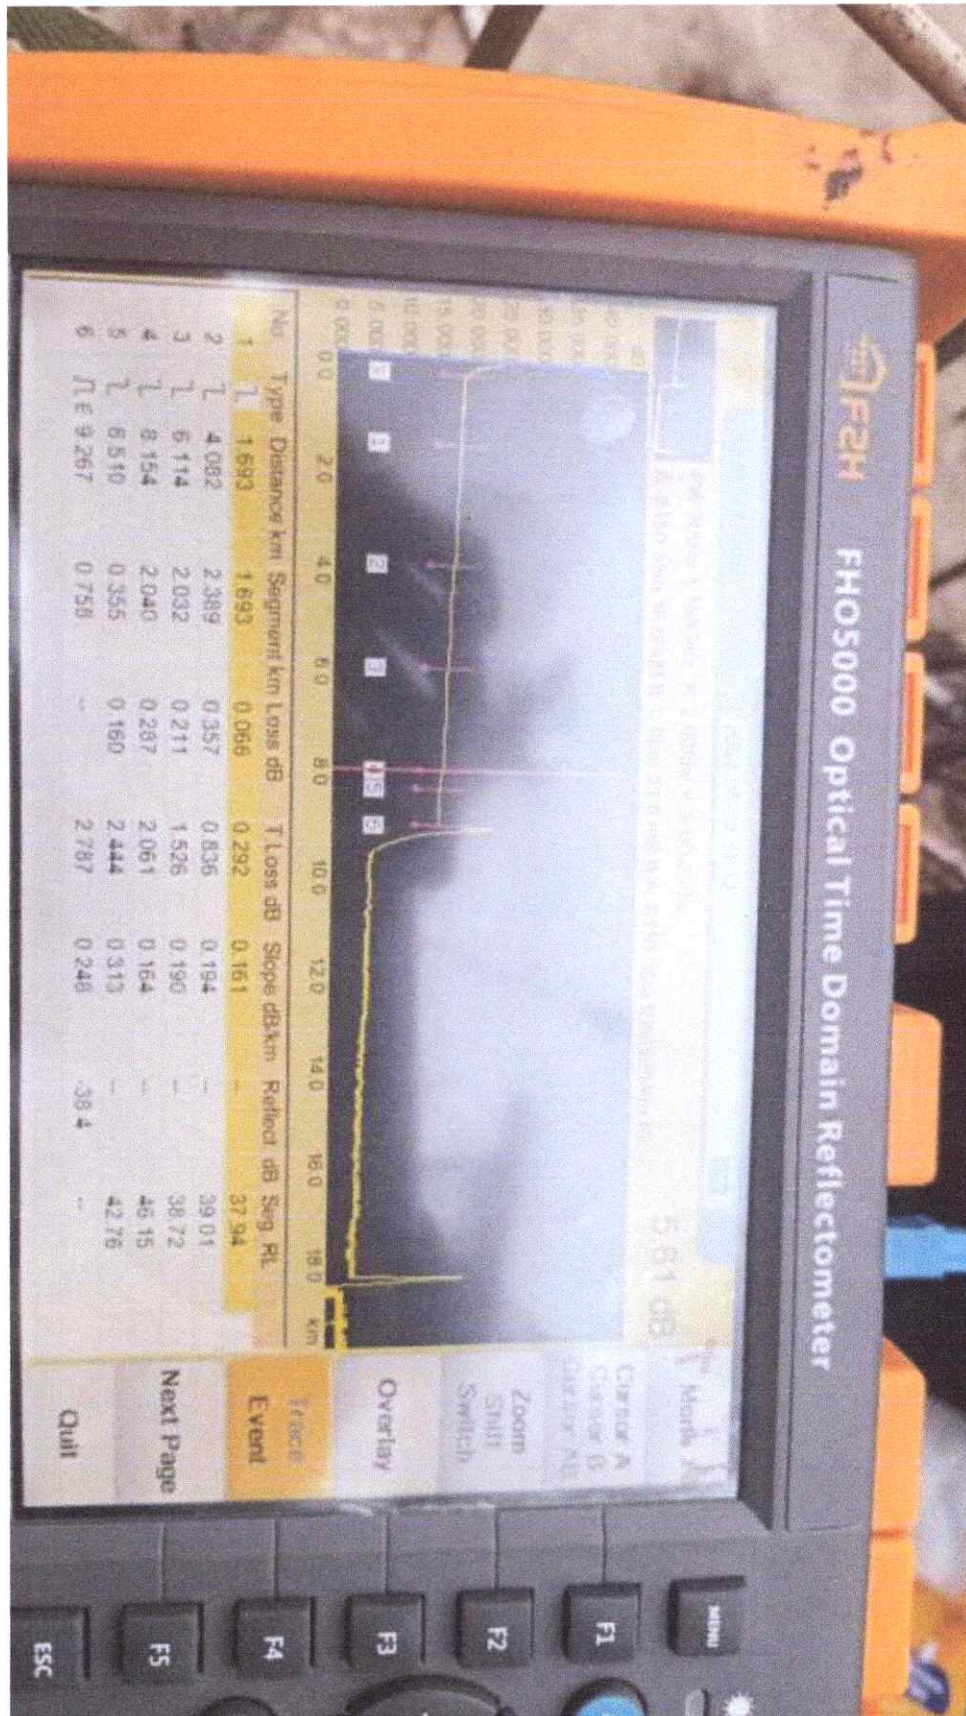


Tube 1 Core 7

Panjang : 9.269 Meter

Total Loss dB : 2.344

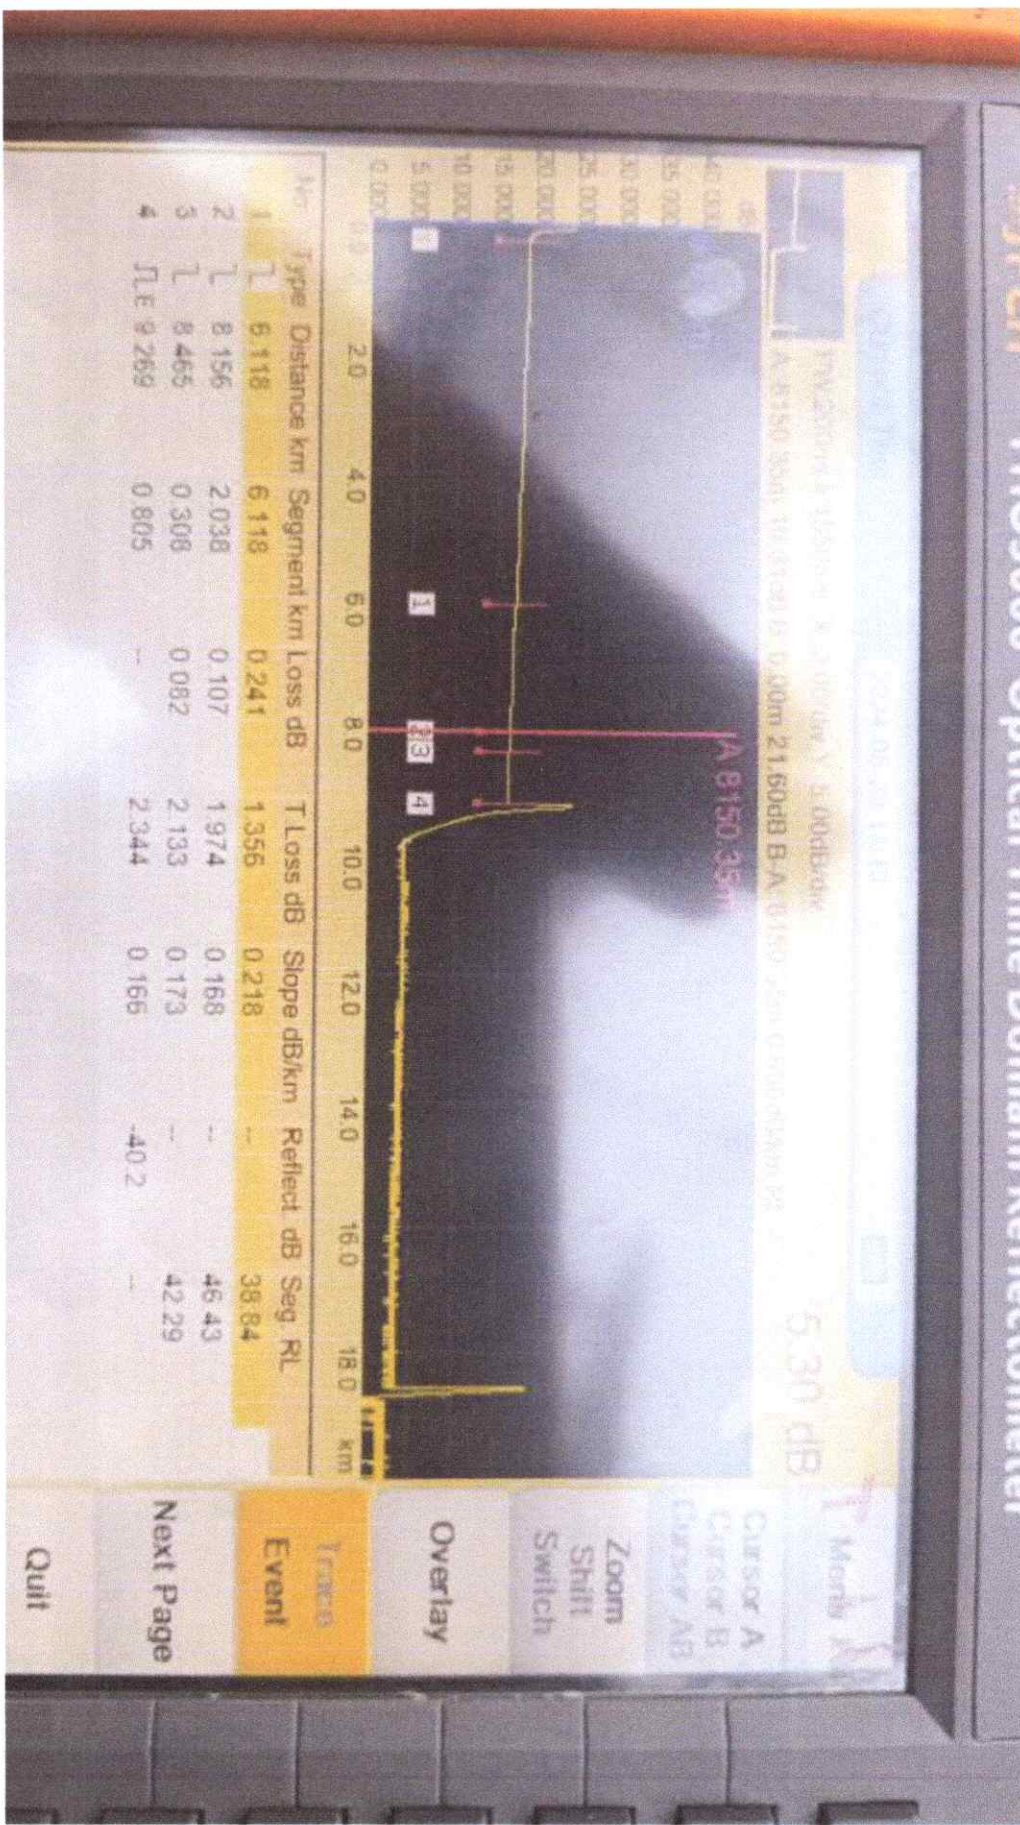


Panjang : 9.269 Meter
Total Loss dB : 2.419

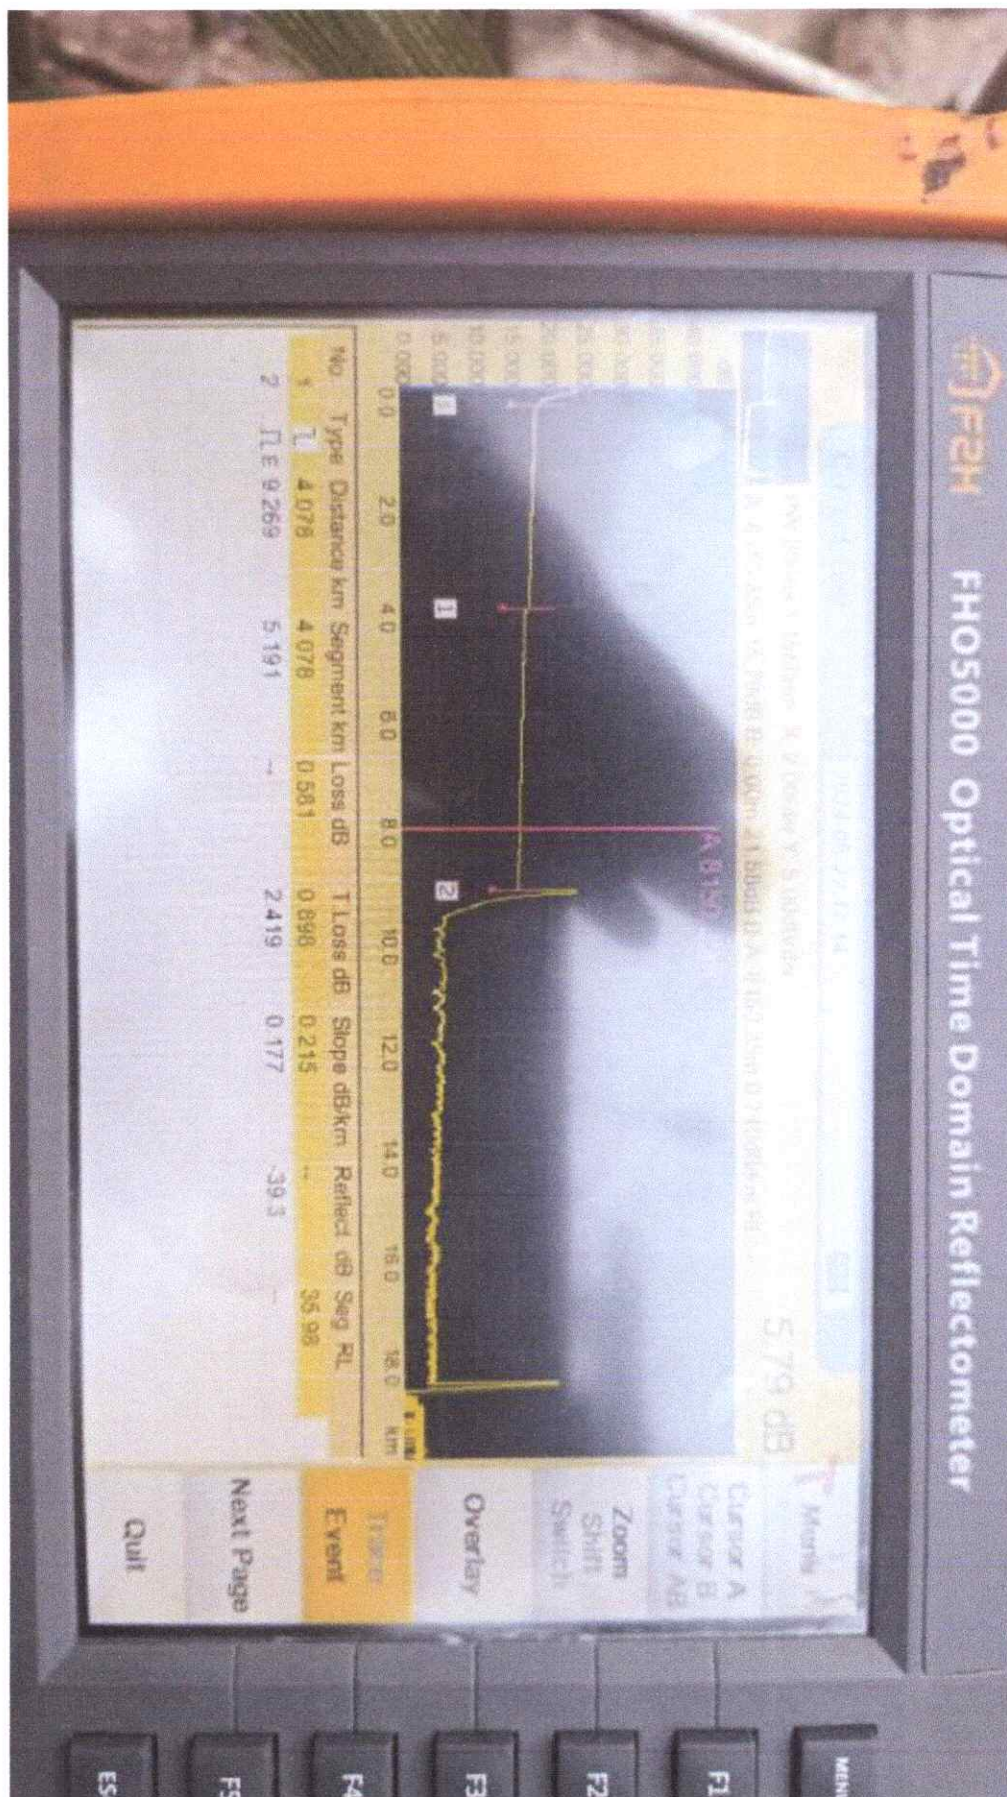

Tube 1 Core 9

Panjang : 9.269 Meter


Total Loss dB : 4.158

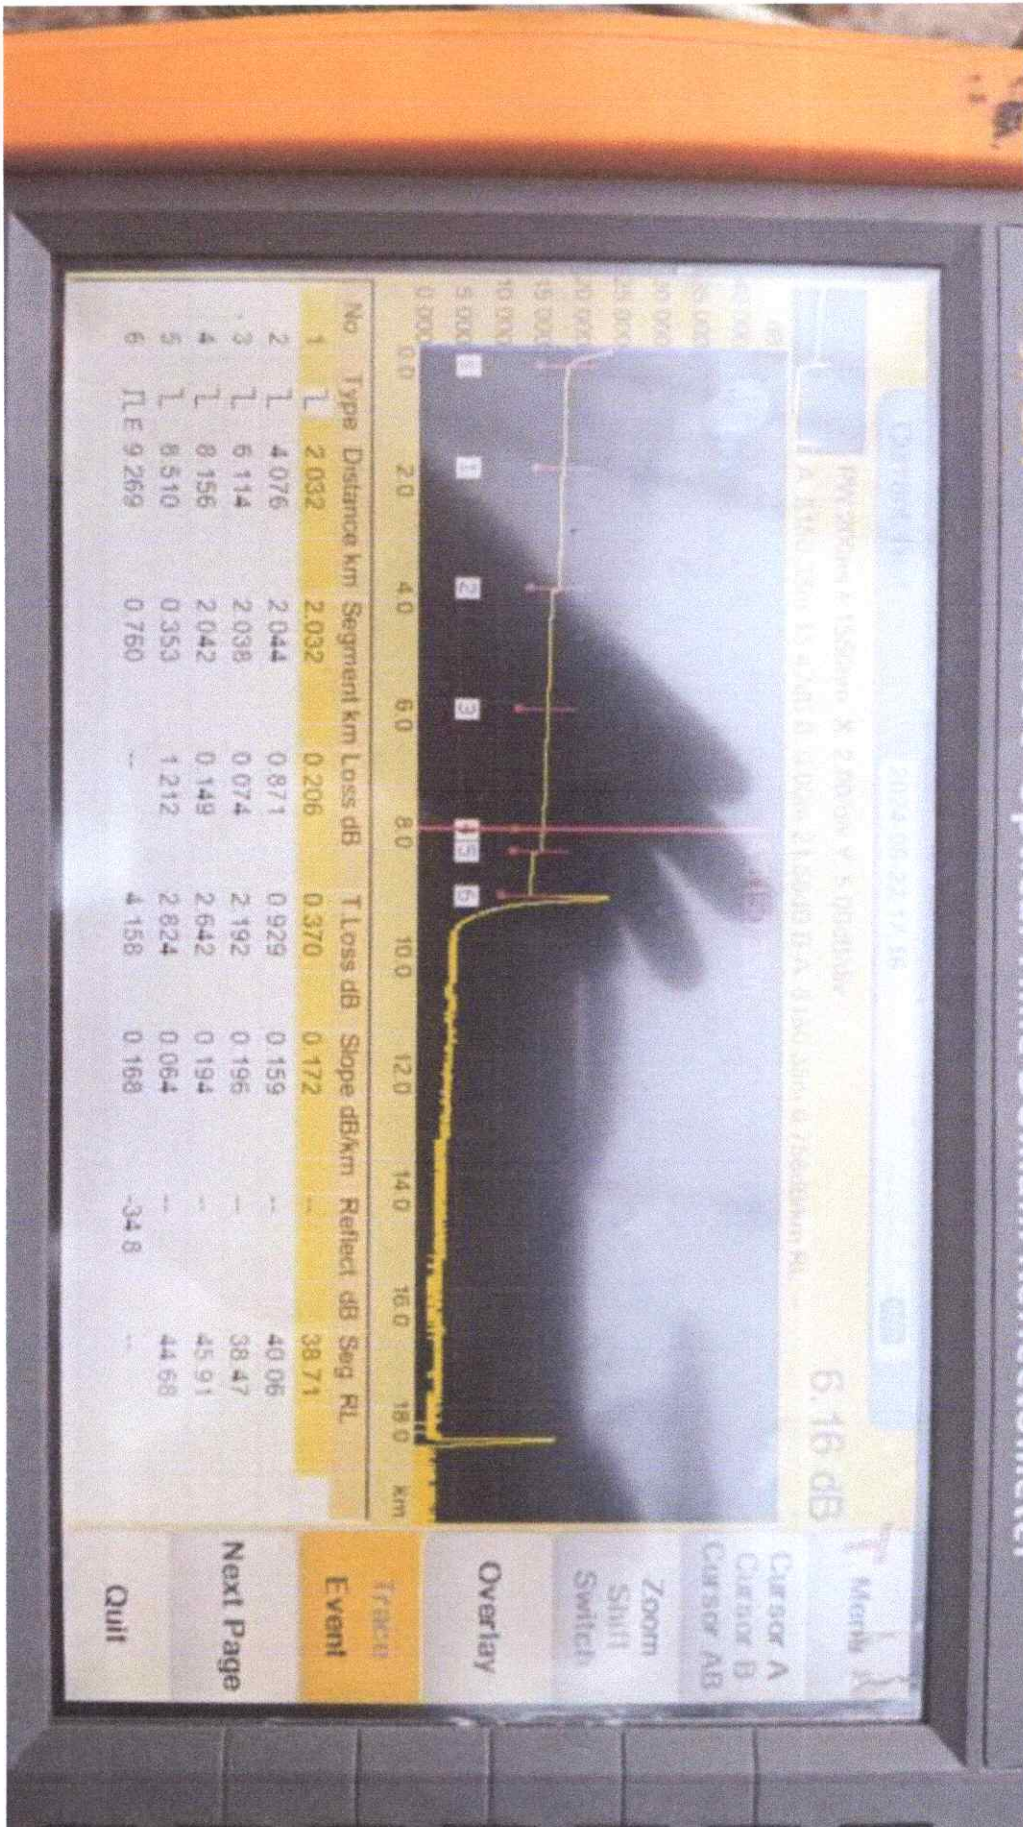

Tube 1 Core 10


Panjang : 9.267 Meter

Total Loss dB : 2.280

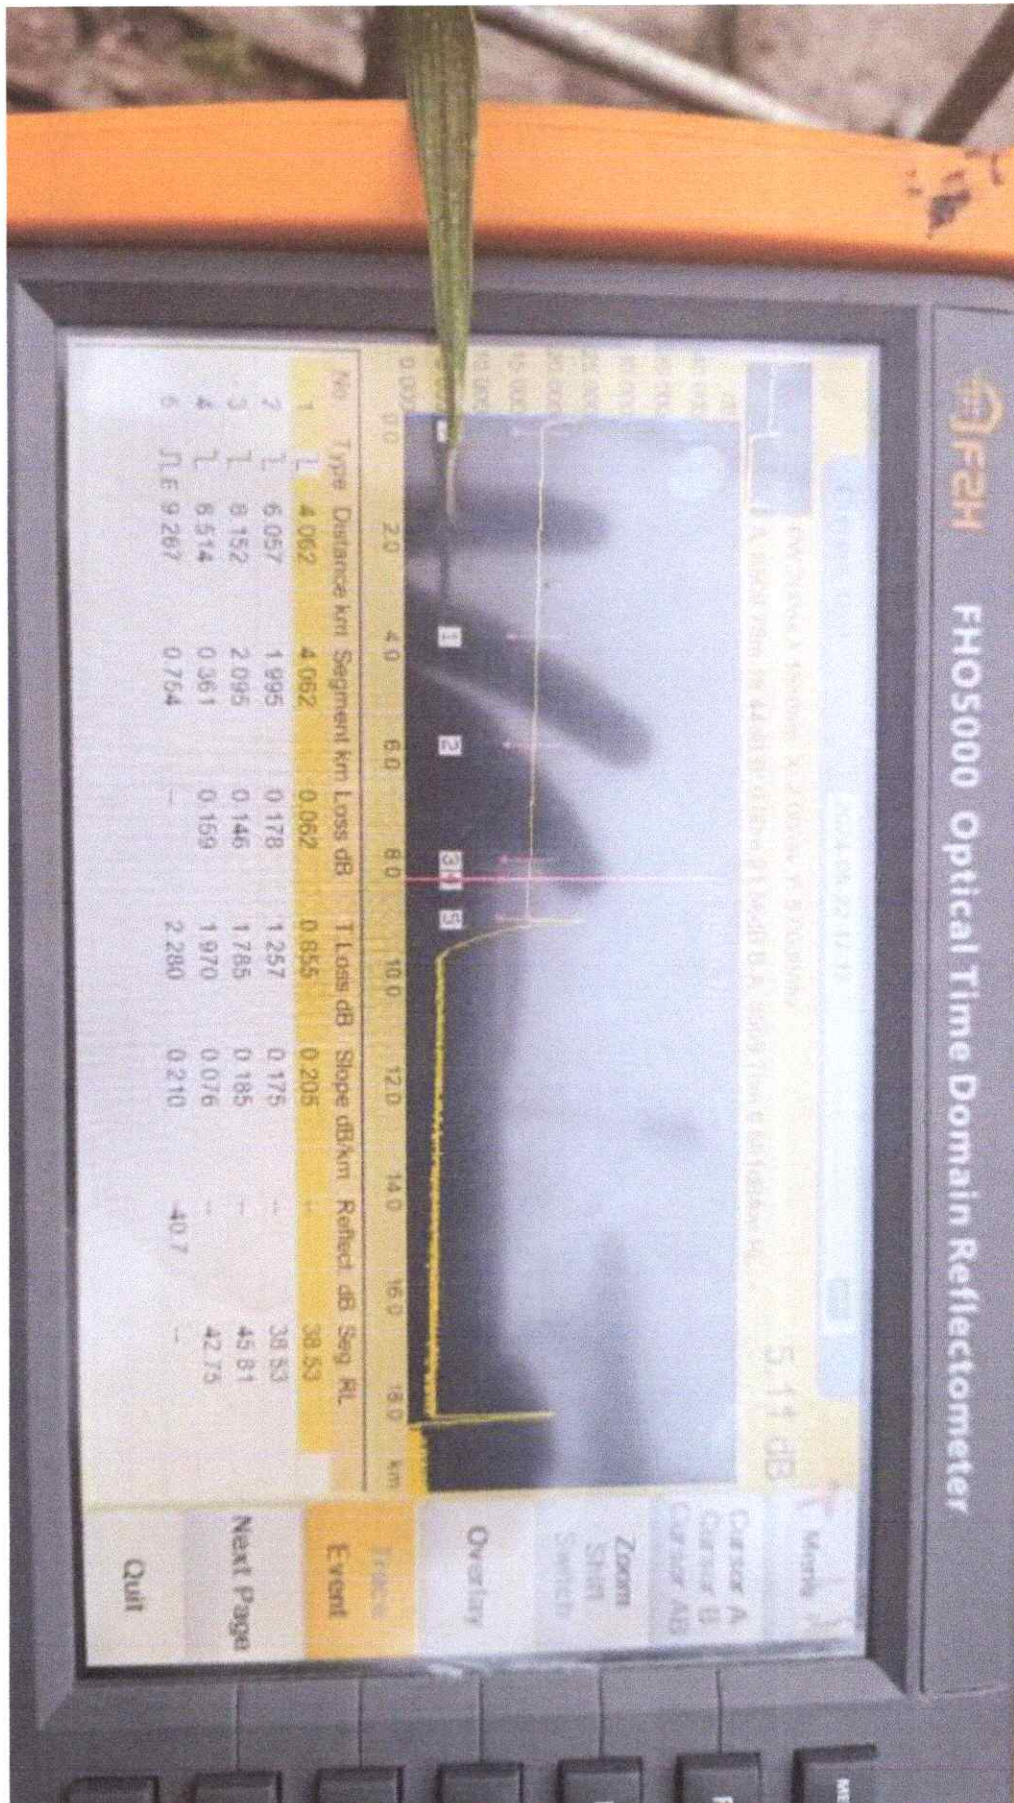


Tube 1 Core 11

Panjang : 9.267 Meter
 Total Loss dB : 6.620

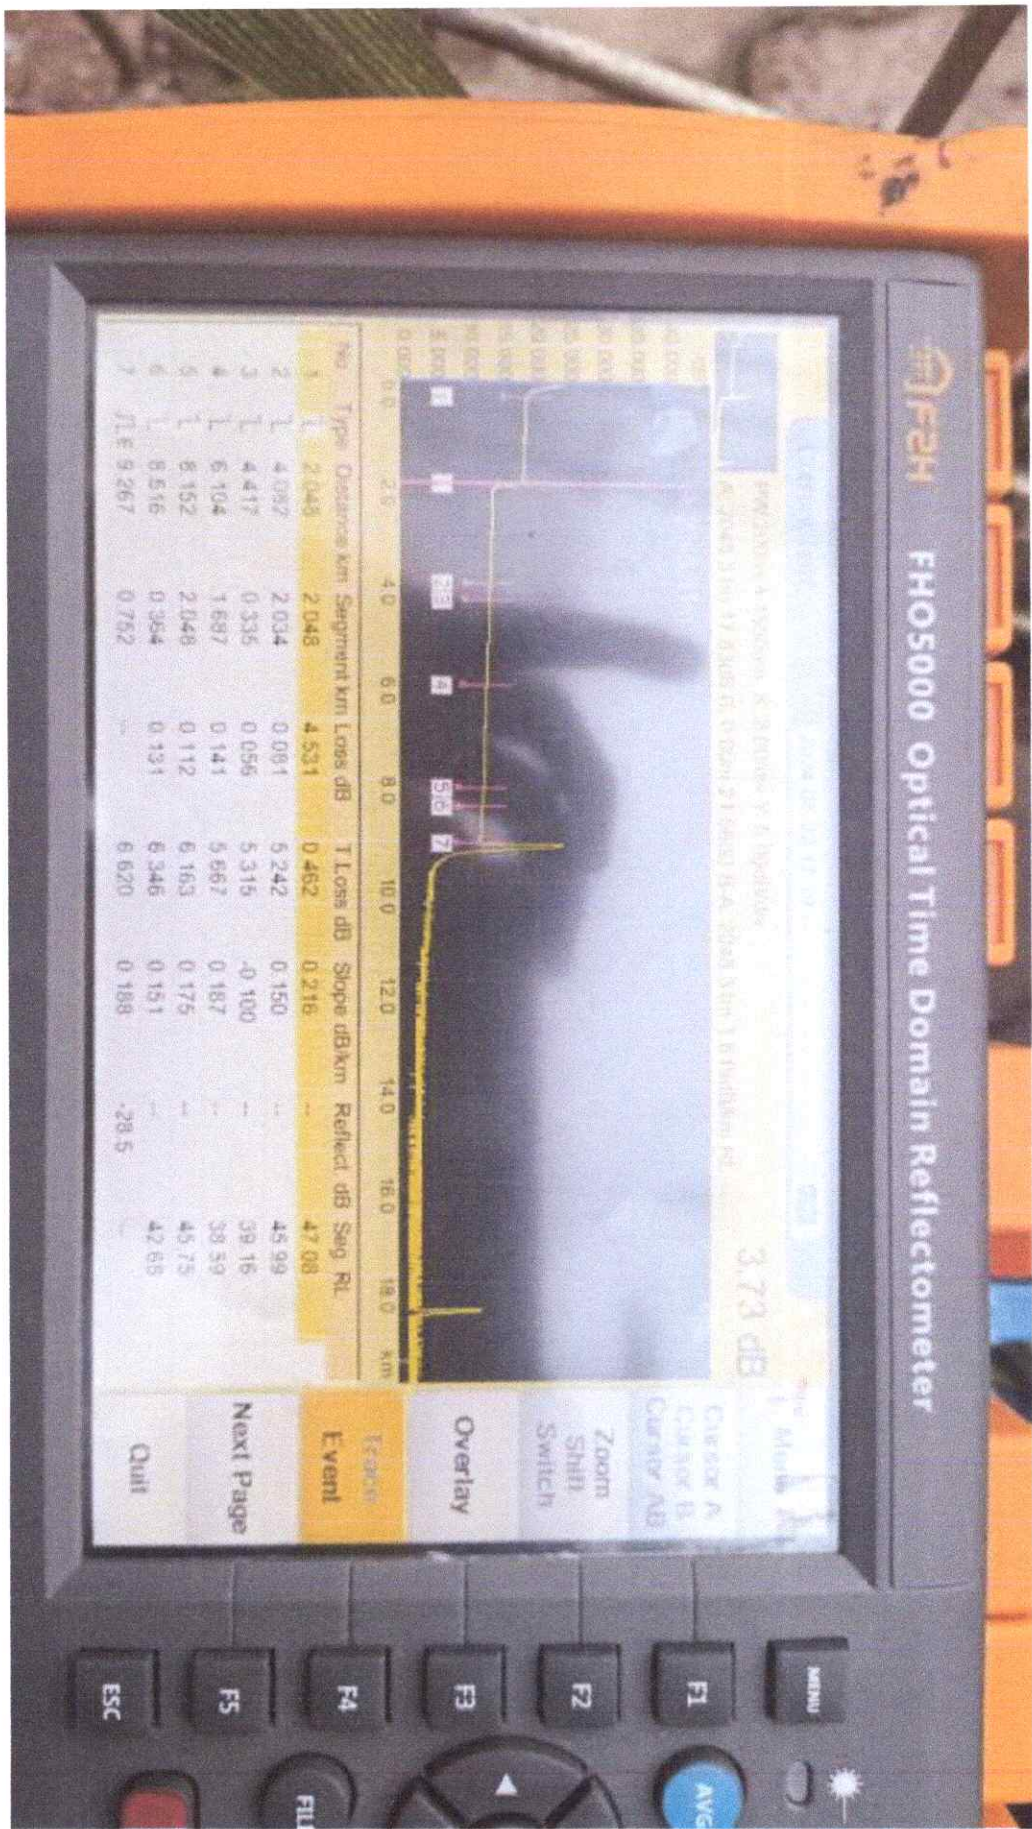

Tube 1 Core 12


Panjang : 9.267 Meter
Total Loss dB : 2.115

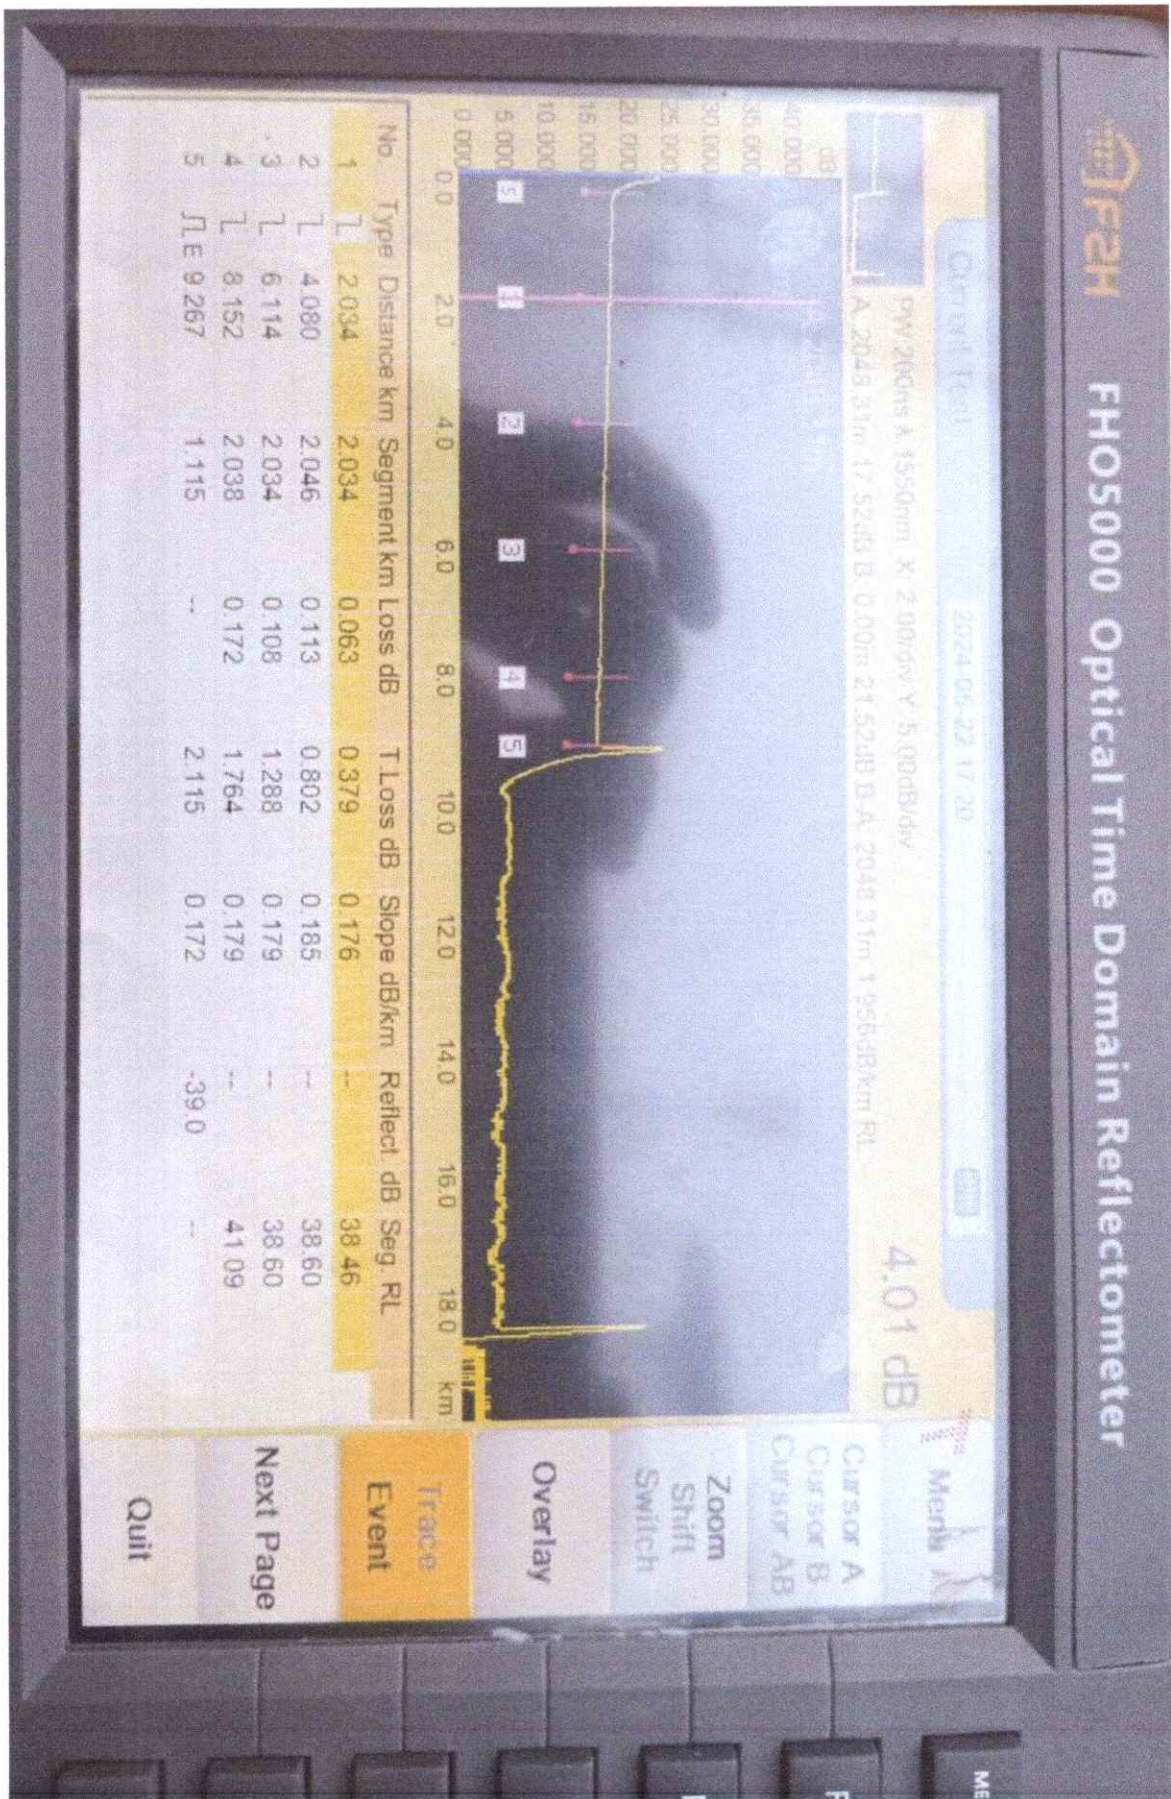

Tube 2 Core 1


Panjang : 9.263 Meter

Total Loss dB : 2.602

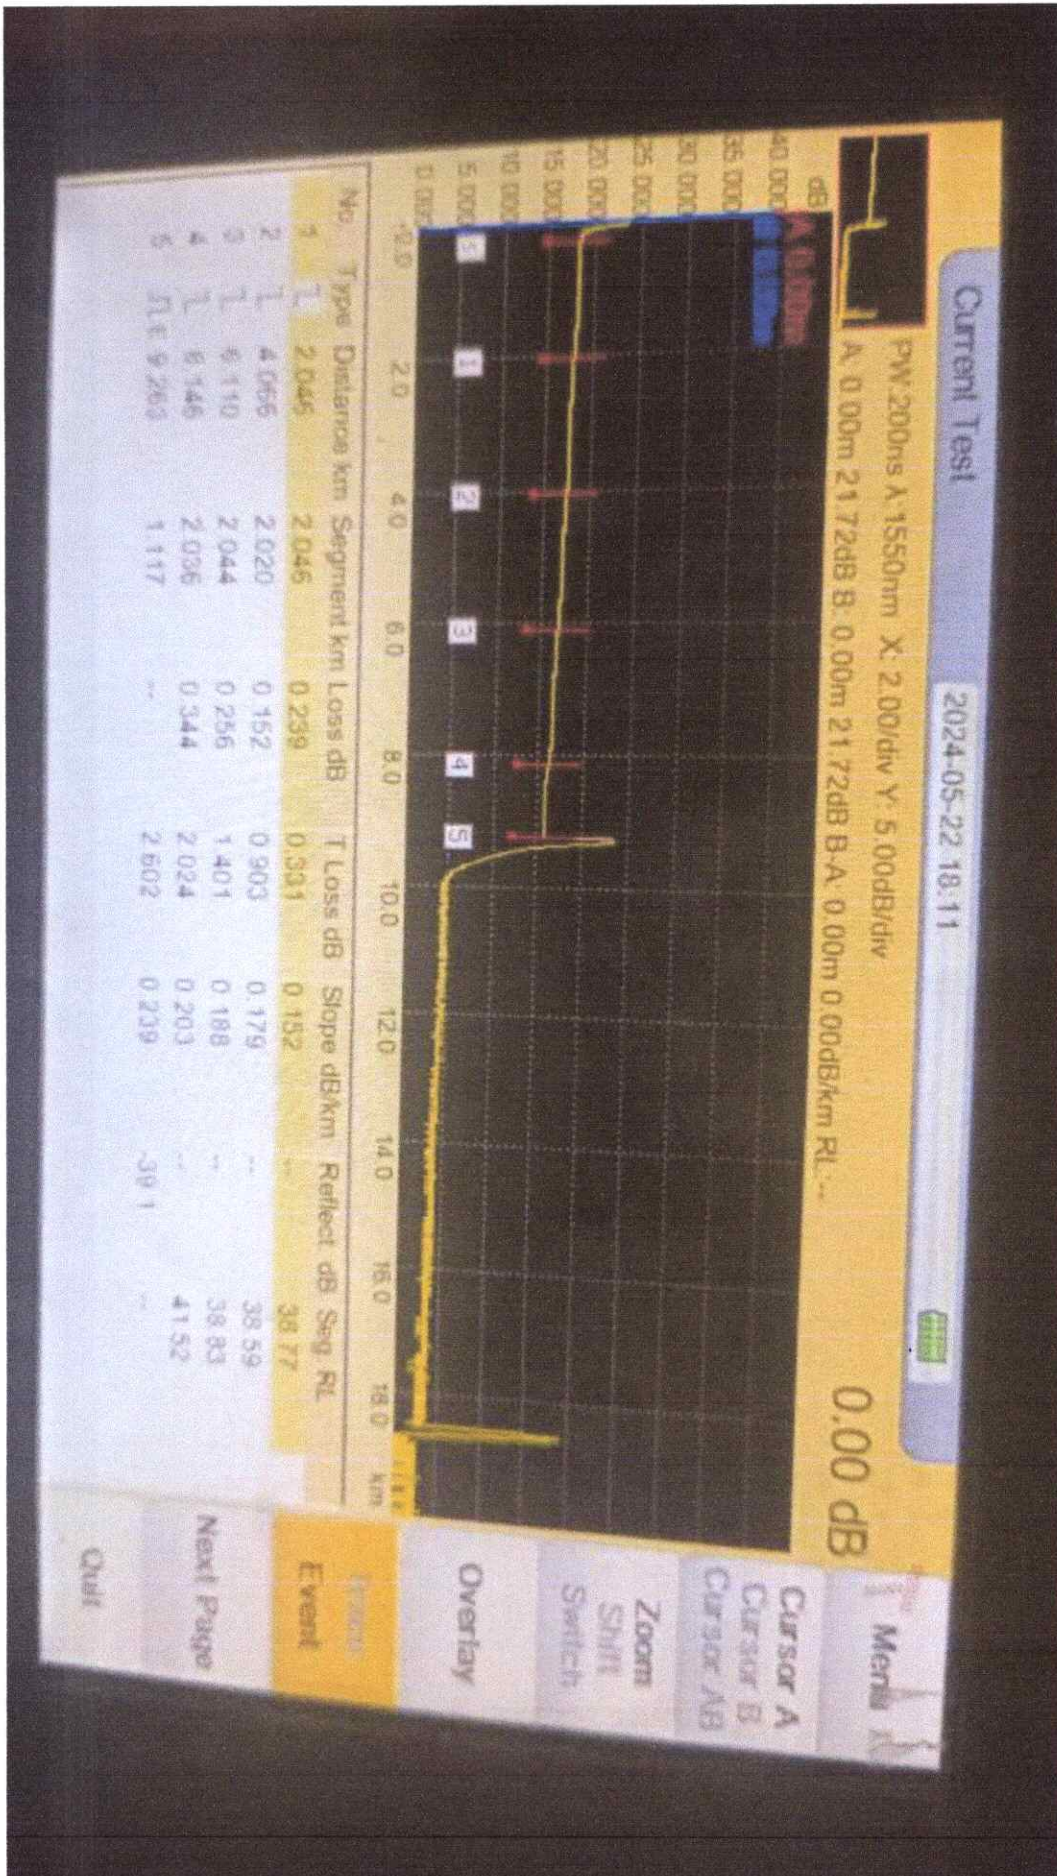

Tube 2 Core 2


Panjang : 9.263 Meter
 Total Loss dB : 2.414

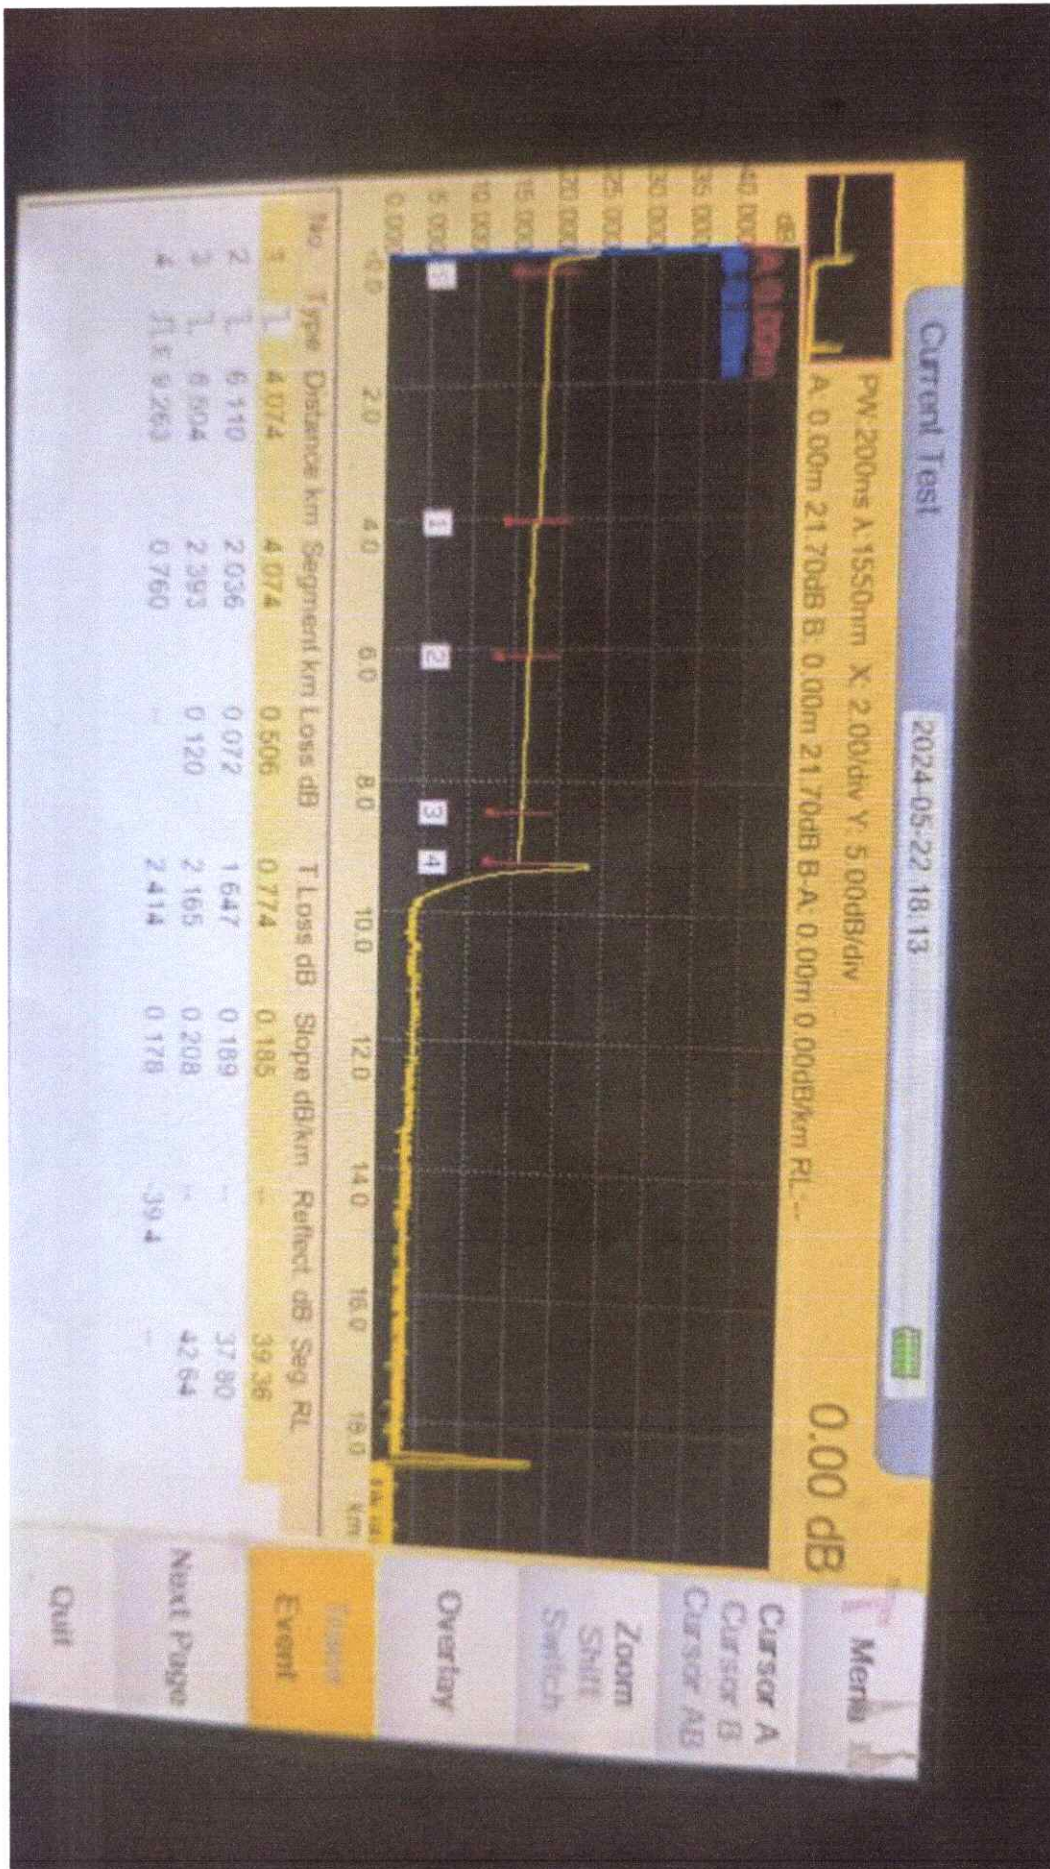

Tube 2 Core 3

Panjang : 9.263 Meter


Total Loss dB : 2.667

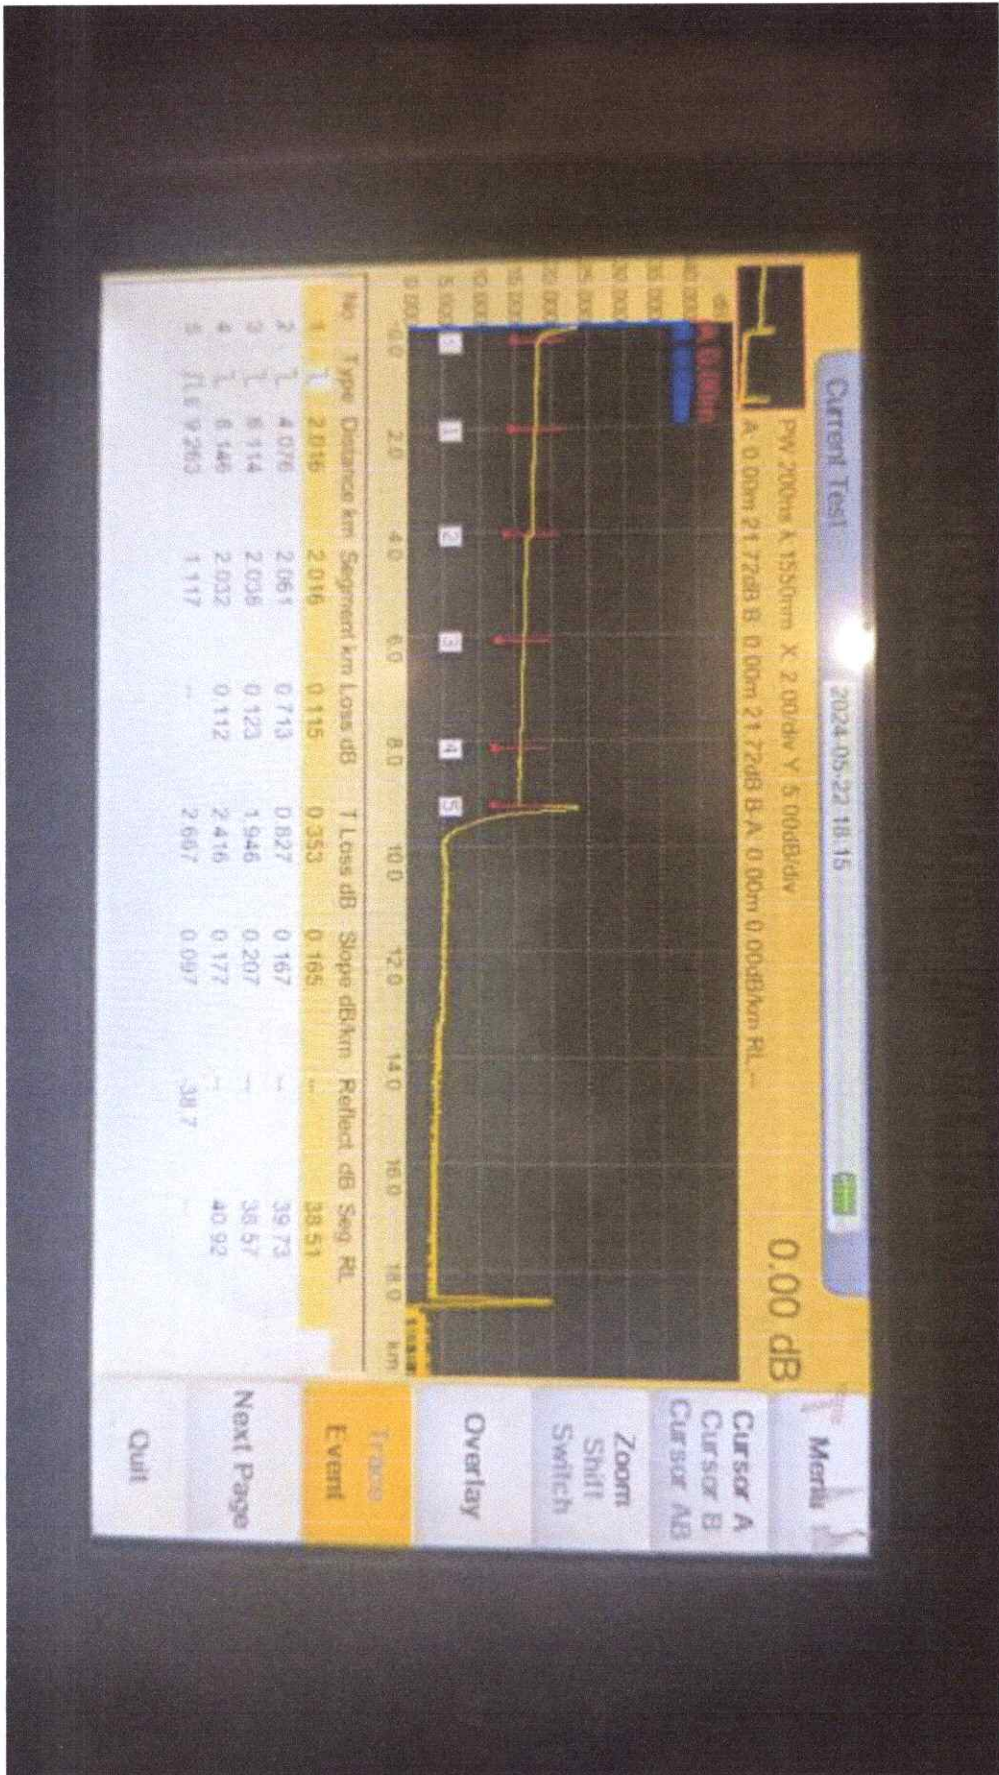

Tube 2 Core 4

Panjang : 9.263 Meter


Total Loss dB : 2.077

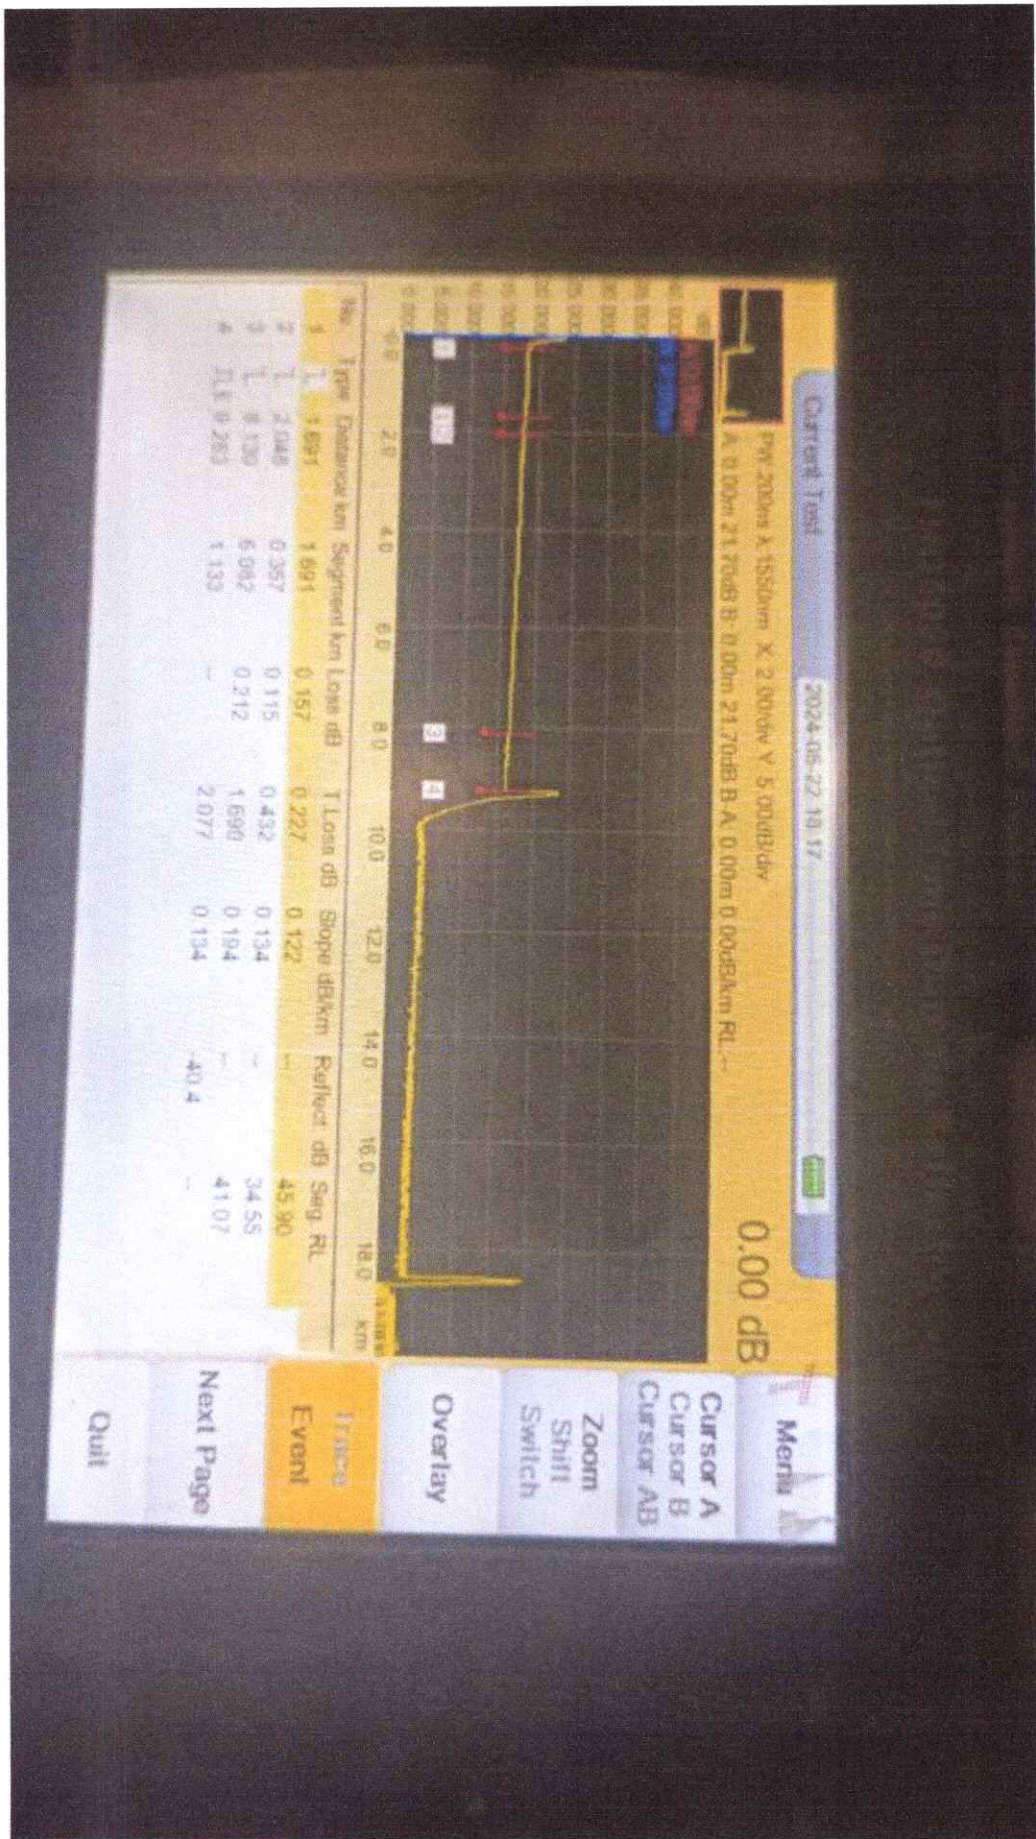

Tube 2 Core 5

Panjang : 9.263 Meter


Total Loss dB : 2.194

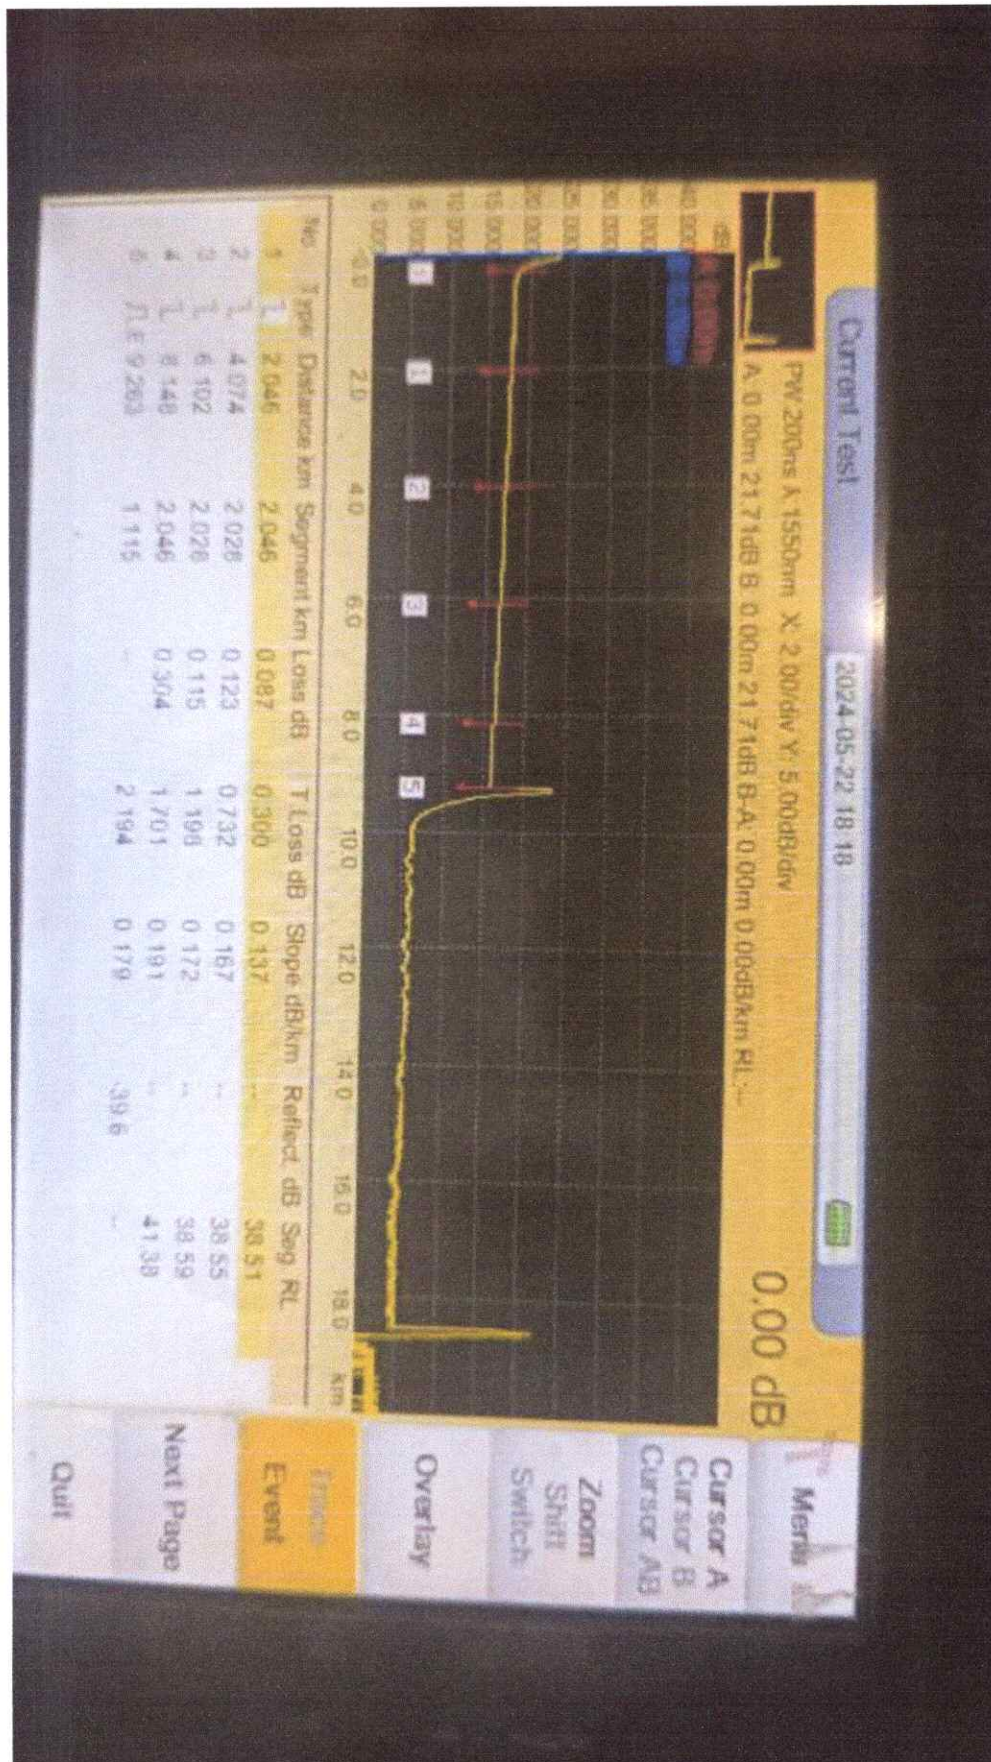


Tube 2 Core 6

Panjang : 9.263 Meter

Total Loss dB : 2.241

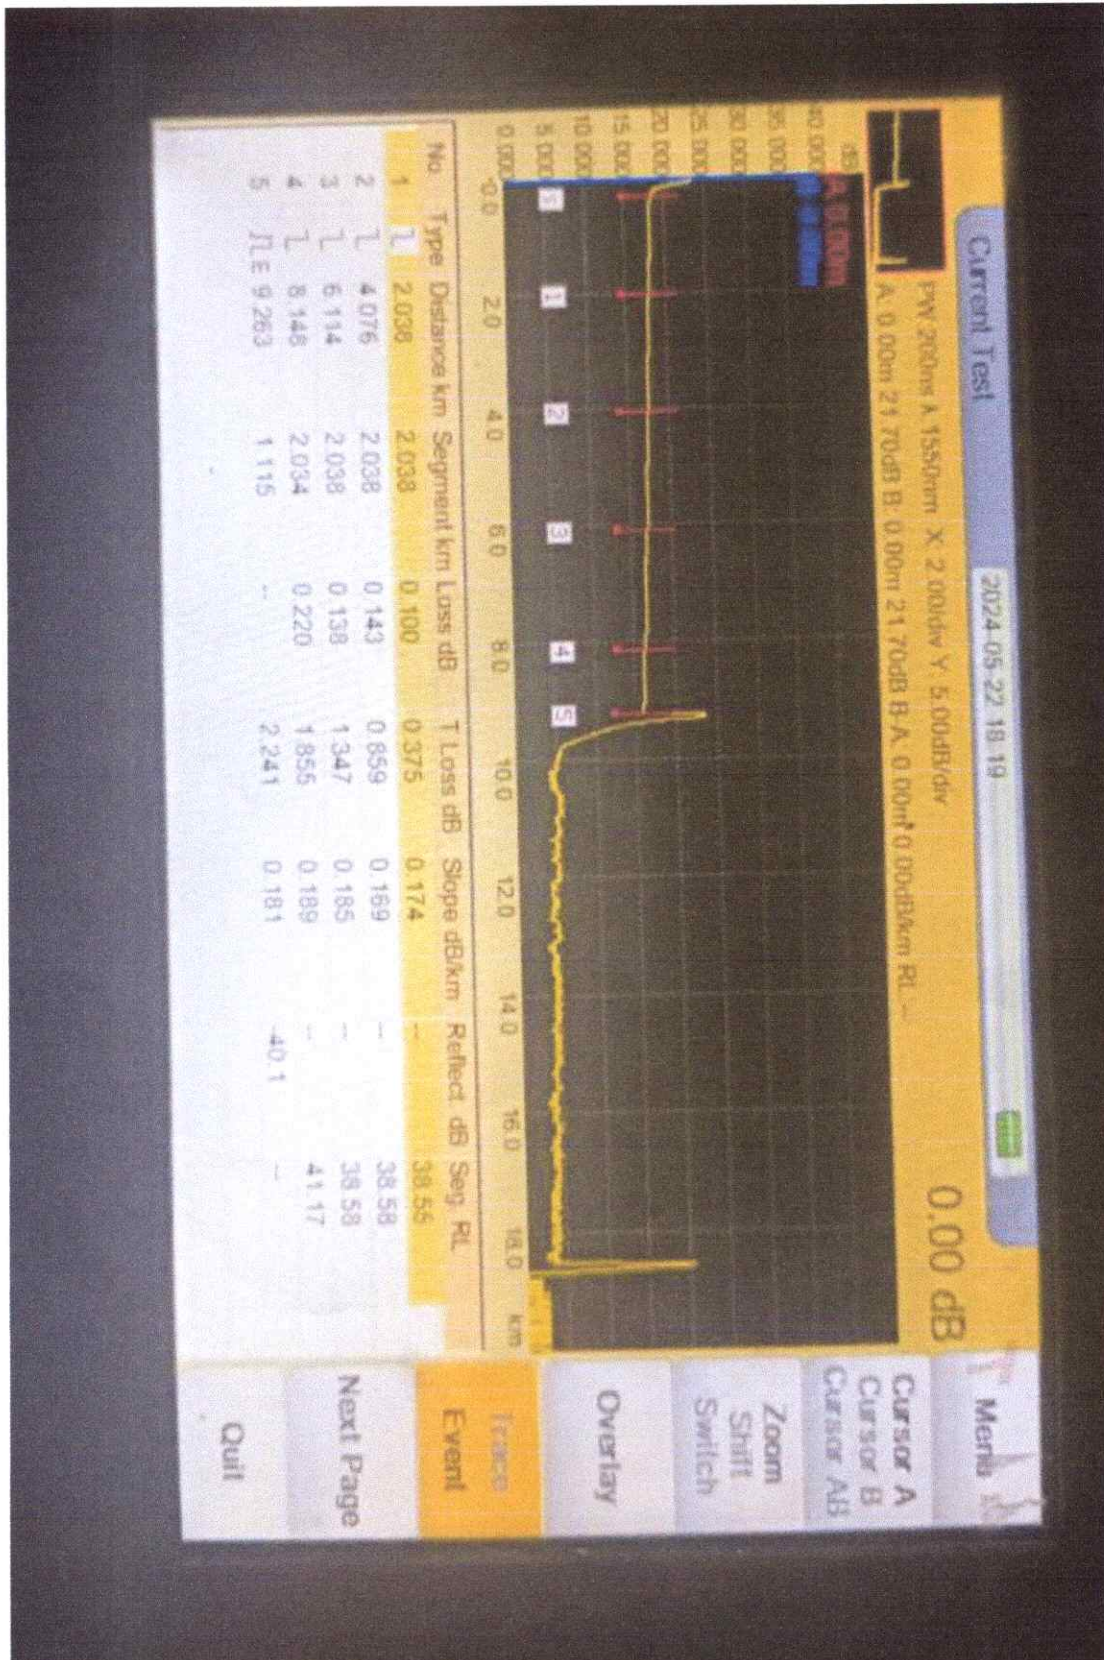


Panjang : 9.265 Meter
Total Loss dB : 2.870

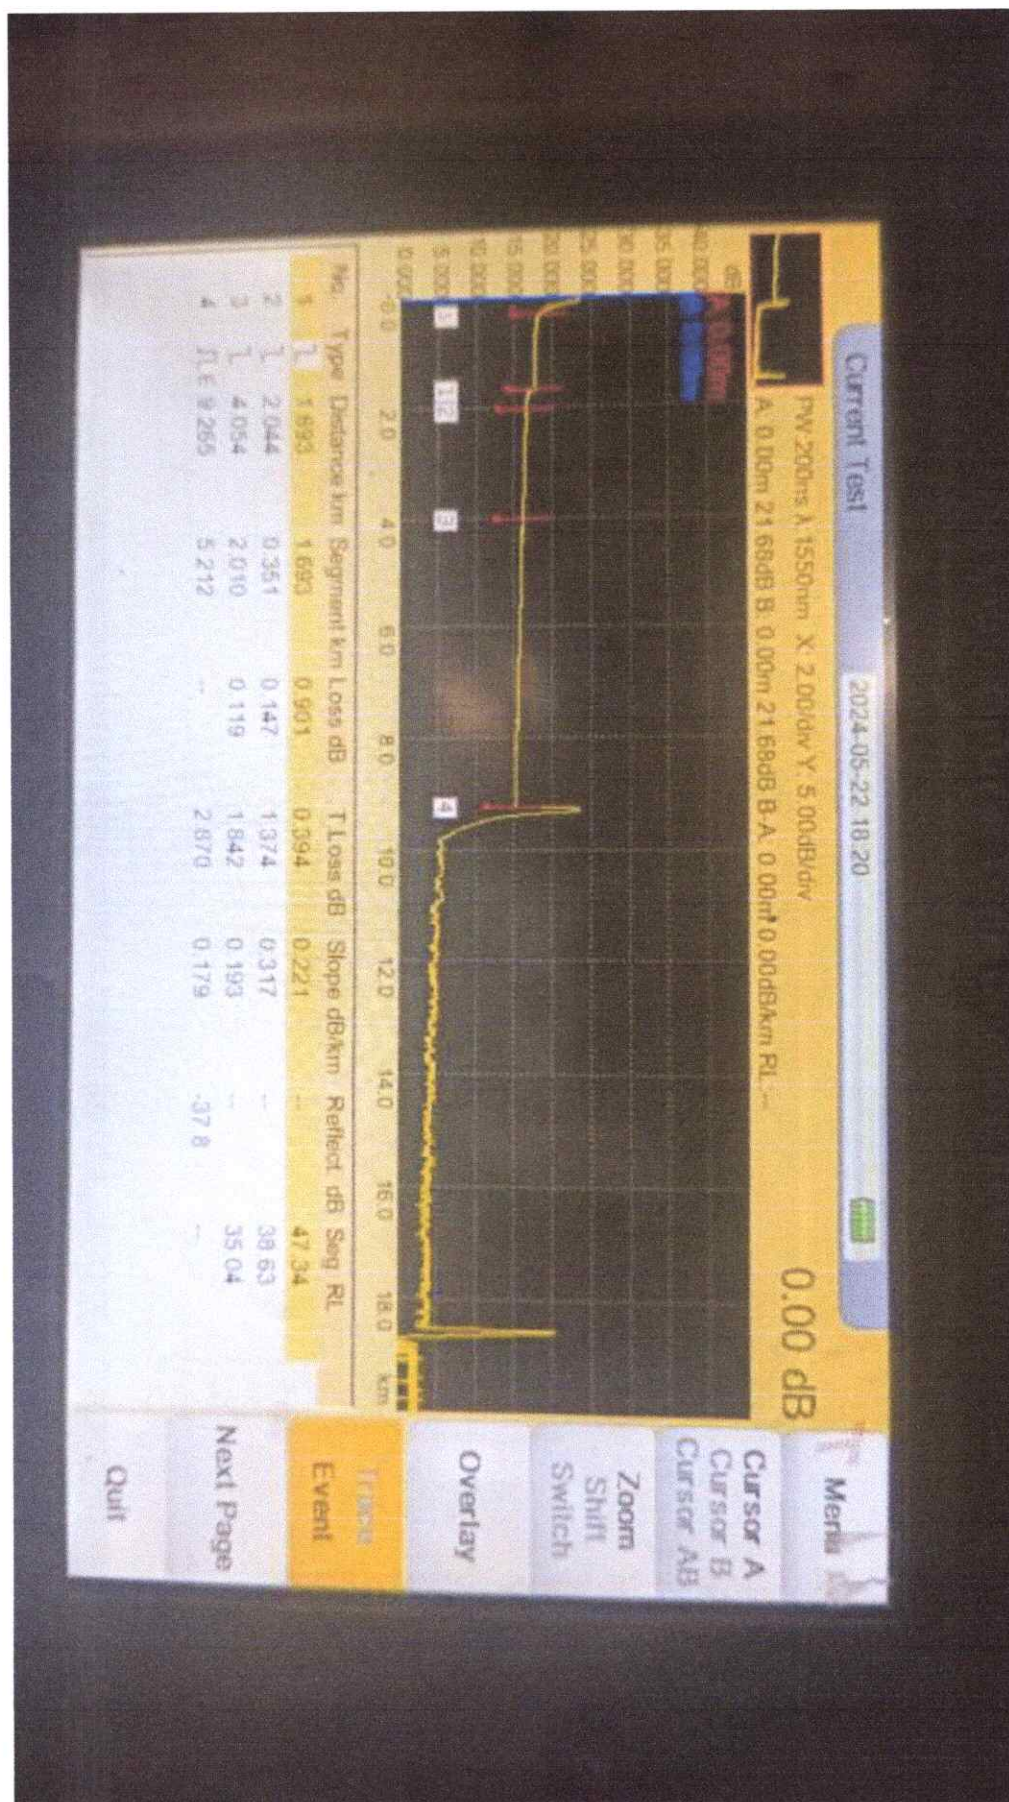

Tube 2 Core 8

Panjang : 9.265 Meter

Total Loss dB : 2.201

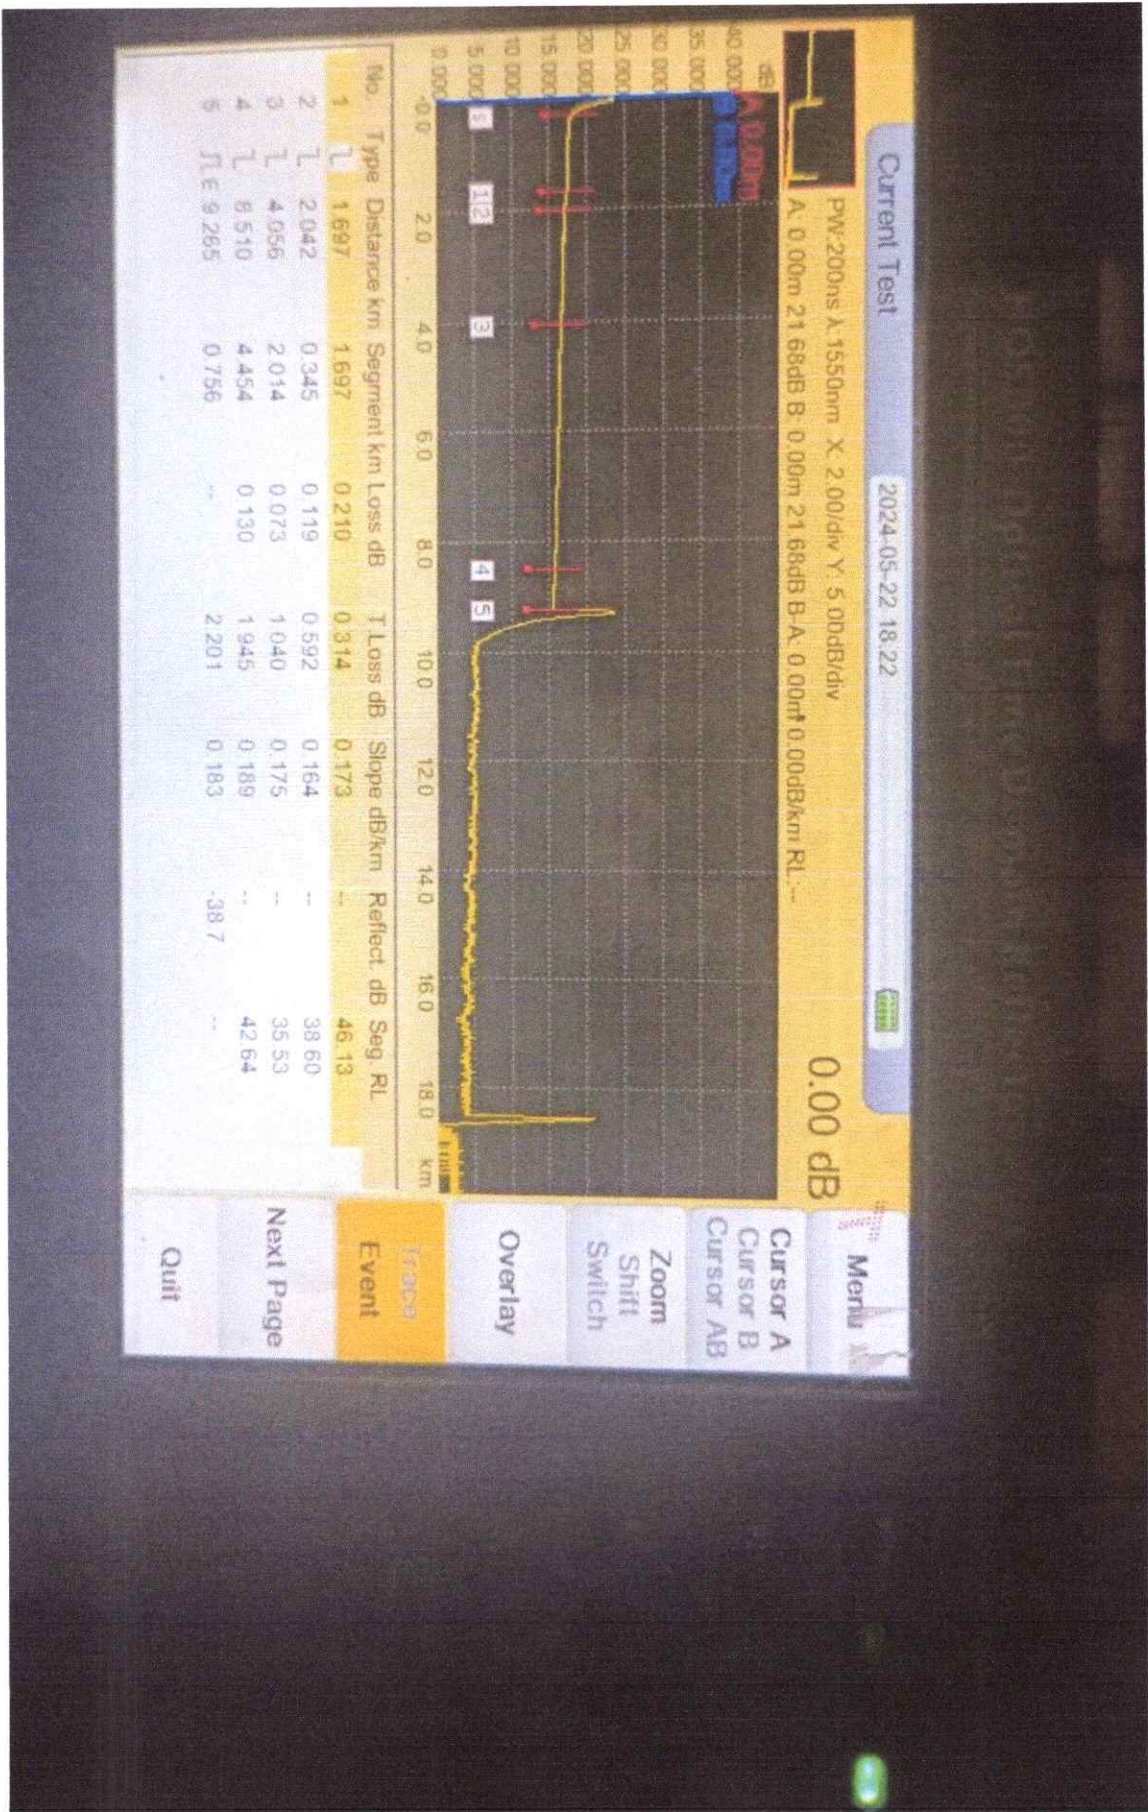


Panjang : 9.265 Meter

Total Loss dB : 2.201

Tube 2 Core 9

Panjang : 9.265 Meter
 Total Loss dB : 3.019

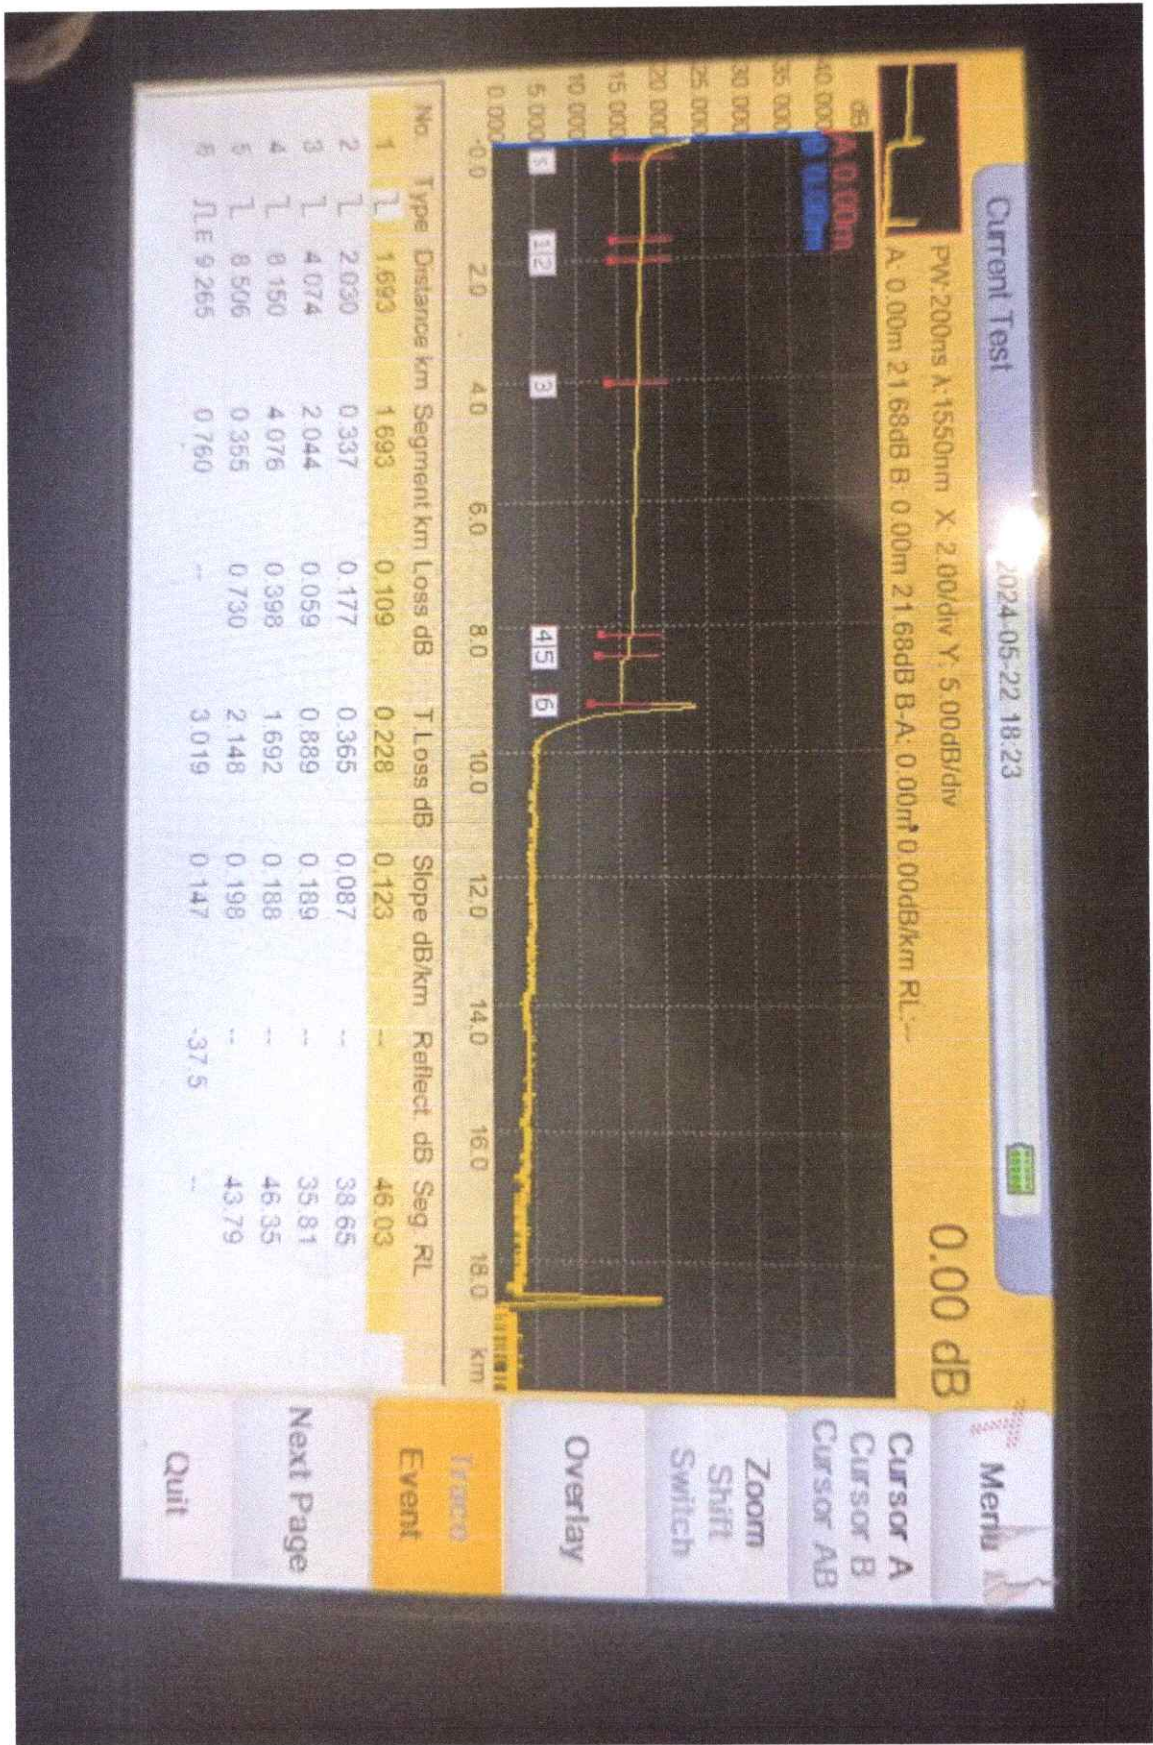

Tube 2 Core 10

Panjang : 9.265 Meter


Total Loss dB : 3.570



Tube 2 Core 11

Panjang : 9.265 Meter


Total Loss dB : 2.756

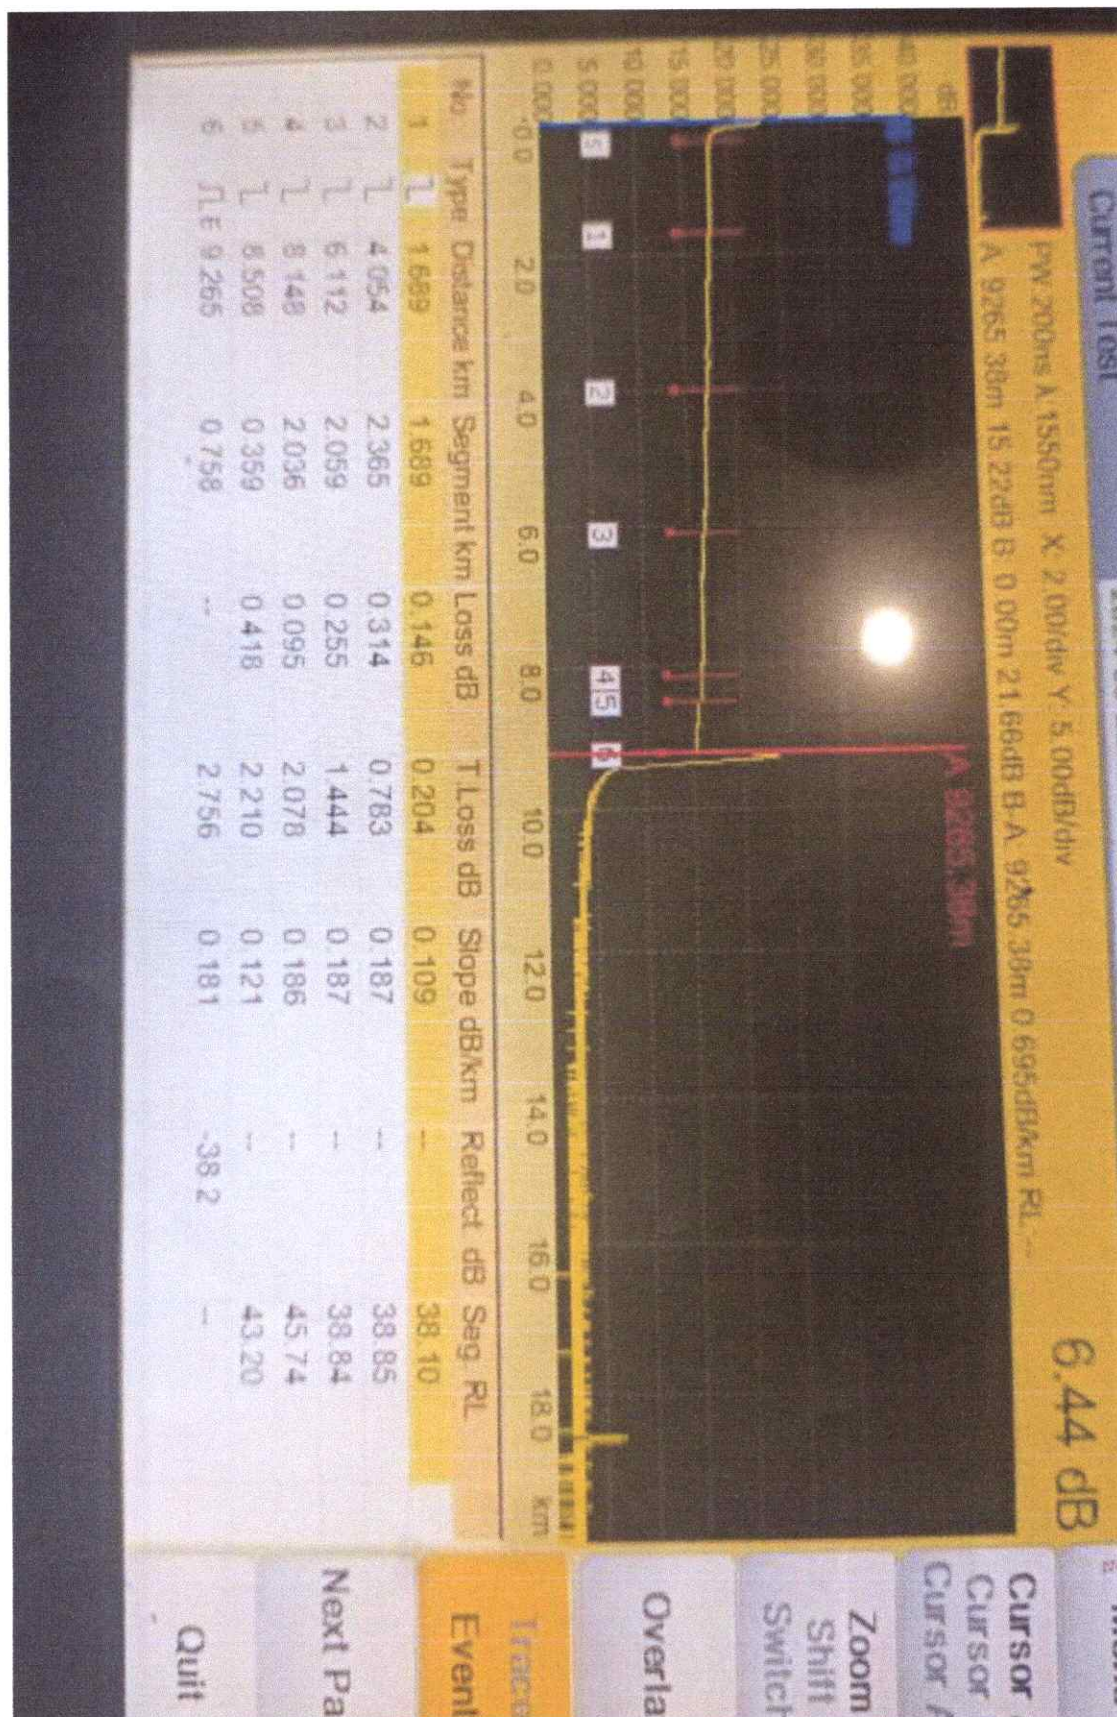

Tube 2 Core 12

Panjang : 9.265 Meter

Total Loss dB : 2.997

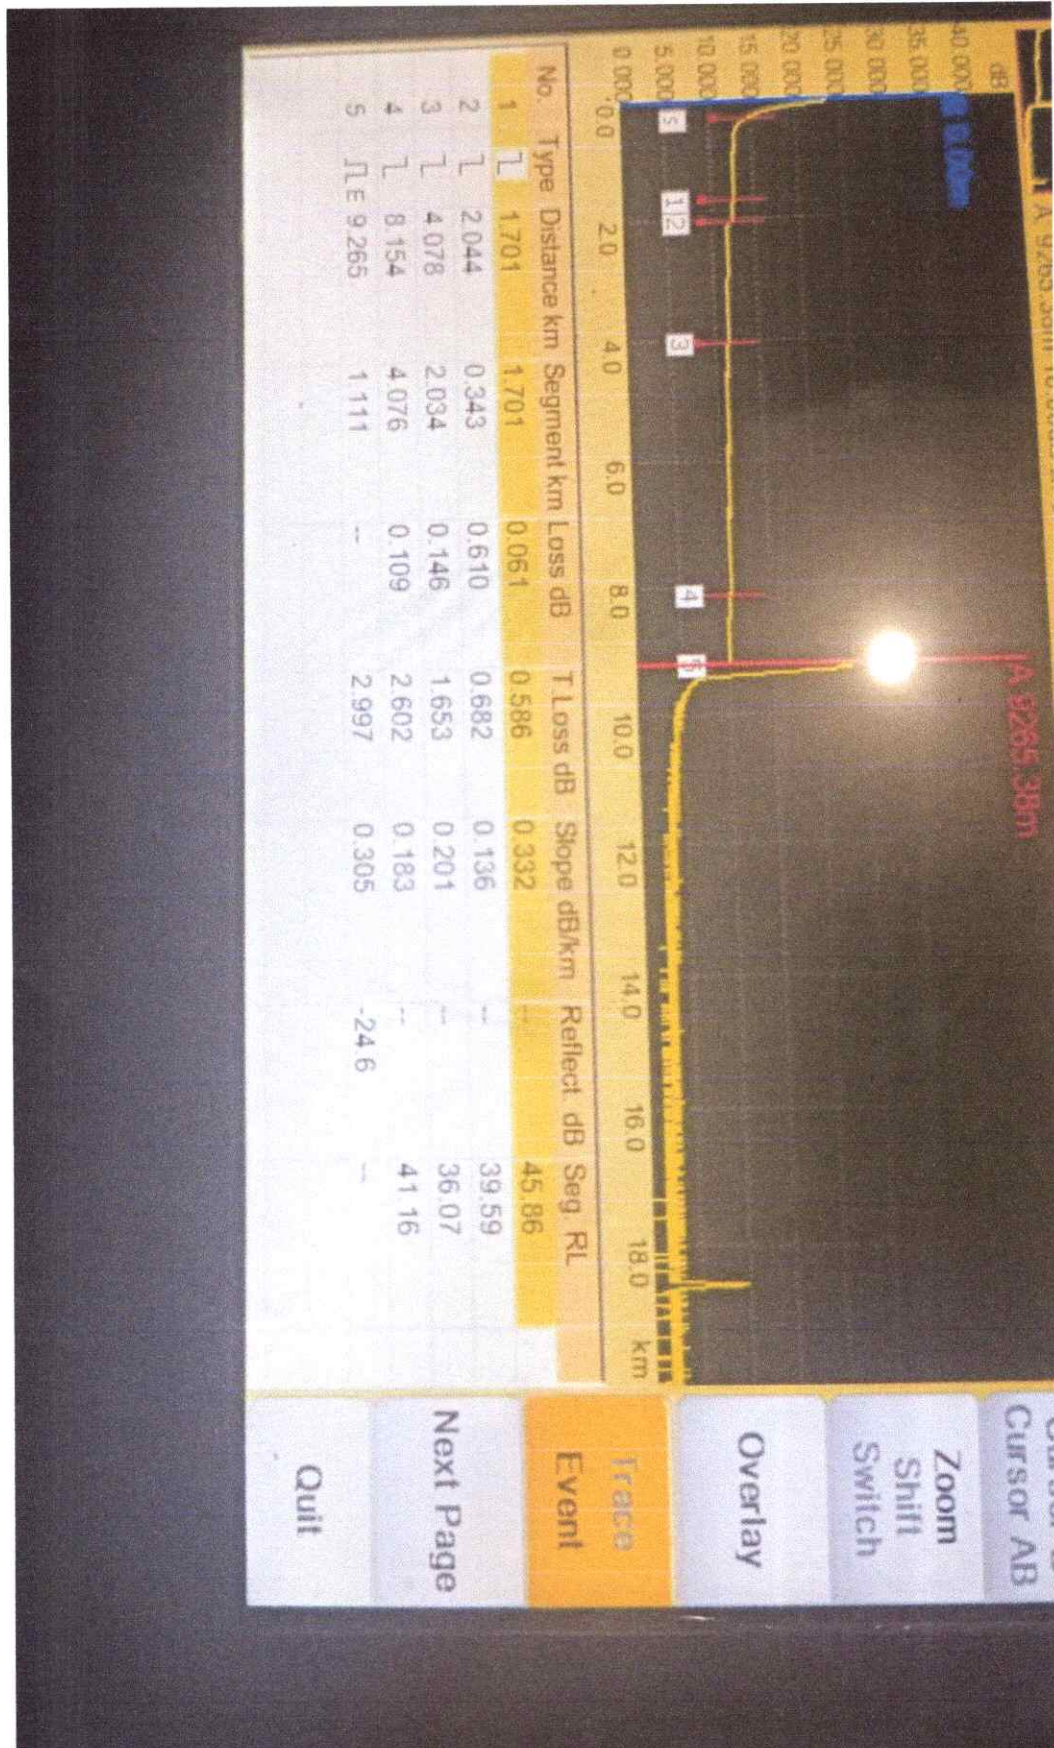

Status Transaksi

Melacak Transaksi Anda

Status Transaksi

ID Transaksi	202407121008612866
Nomor Dokumen	202407121008612866
Tanggal Pembuatan	Jul 12, 2024 10:08:28 (GMT +7)
Jumlah Nominal Debit	IDR 130,210,964.00
Model Instruksi	Segera
Status Transaksi	● Sukses

Single Transfer To Mandiri - In-House Transfer to Third Party

Sumber Dana	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM
Rekening Tujuan	1560000178584 CYBERPLUS MEDIA PRAT
Informasi Bank Penerima	PT. Bank Mandiri Tbk
Jumlah	IDR 130,210,964.00
Jumlah Nominal Debit	IDR 130,210,964.00
Nomor Referensi	PV2407057
Keterangan	PV2407057
Uraian	Pemb. 50 Persen FTTH Cawang ke Ariobimo
Model Instruksi	Segera
Tanggal Instruksi	Jul 15, 2024
Notifikasi Tambahan	Email - SMS -

