



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : CITRA INDOTAMA, CV

Cheque No. : 0111 5986 1692
P/V No. : PV-MBR2407/010
Date : 05-Jul-2024

External Document No. PV2407016

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	\$\$ / Rp
Being Payment Of :			
Penarikan FO dari Central MKK ke Lot 325H	VOB-000:		55,825,000
PPh 23 (Rp. 33.735.000,- X 2%)	121303		(674,700)
			-
			-
			-
			-
			-
Total in words : Fifty Five Million One Hundred Fifty Thousand Three Hundred Rupiah Only			Rp 55,150,300
Prepared by : Fransiska Citra Ayu	Checked by : Apriansah	Approved by : Robby Susilo	Received by :
Date : 05-Jul-2024	Date :	Date :	Date :



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : CITRA INDOTAMA, CV
Cheque No. : 0111 5986 1692
P/V No. : PV-MBR2407/010
Date : 05-Jul-2024

External Document No. PV2407016

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	SS / Rp
Being Payment Of :			
<u>Penarikan FO dari Central MKK ke Lot 325H</u>	<u>VOB-000:</u>		<u>55,825,000</u>
<u>PPH 23 (Rp. 33.735.000,- X 2%)</u>	<u>121303</u>		<u>(674,700)</u>
			-
			-
			-
			-
			-

Total in words : Fifty Five Million One Hundred Fifty Thousand Three Hundred Rupiah Only

Rp 55,150,300

Prepared by : <u>Fransiska Citra Ayu</u>	Checked by : <u>Apriansah</u>	Approved by : <u>Robby Susilo</u>	Received by :
Date : <u>05-Jul-2024</u>	Date :	Date :	Date :



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

Kepada Yth : PROCURMENT
Perusahaan : PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Alamat : Jln Markisa No.1 Mukakuning Batamindo
ttn : Ibu Ferawaty Marpaung

Invoice No : 0068/ INV/CI/VI/2024
PO No : PUO/24/0044
Tgl PO : 16 April 24

Hal: Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H

No	JENIS	SATUAN	PO		
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH
	Material				
1	Kabel fiber optic 12 core	MTR	1,400	14,500	20,300,000
2	OTB 12 core rack mount	UNT	2	145,000	290,000
3	Kabel Ties	PKG	3	100,000	300,000
4	Flexible dan Paralon	MTR	120	10,000	1,200,000
	Total Material				22,090,000
	Jasa				
1	Penarikan Kabel Fiber Optik 12 core	MTR	1,400	9,000	12,600,000
2	Buka Tutup Mainhole dan Pengeringan	TITIK	5	145,000	725,000
3	Pemasangan OTB Rack Mount	UNT	2	300,000	600,000
4	Splasing Optic	COR	72	50,000	3,600,000
5	Mobilisasi	LS	1	1,000,000	1,000,000
6	Roding Pipa Duct	MTR	1,350	7,000	9,450,000
7	Galian Tanah Kedalaman 80 cm	MTR	150	12,000	1,800,000
8	Penarikan Subduct	MTR	280	7,000	1,960,000
9	Pemasangan dan Instalasi OTB Wall	UNT	4	500,000	2,000,000
					33,735,000
Grand Total					55,825,000

Terbilang : Lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah

Batam, 12 Juni 2024

CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG

Direktur

Kami mohon di bayarkan melalui rekening Giro BCA
A/C : 326.239.5500 AN CV CITRA INDOTAMA



CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 0111 5986 1692

POSTED
Pai/24/0681

DATE
25/06/24

SIGNED

RECEIVED
25 JUN 2024

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Kabel fiber optic 12 core	16,000	1,400	m	22,400,000
2.	OTB 12 core rack mount	1,100,000	2	unit	2,200,000
3.	Kabel ties	100,000	3	pax	300,000
4.	flexible dan paralon	8,000	120	m	960,000
TOTAL					25,860,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Penarikan Kabel Fiber Optik 12 core	12,000	1,400	m	N/A	1	16,800,000
2.	Buka Tutup Mainhole dan Pengeringan	250,000	5	titik	N/A	1	1,250,000
3.	Pemasangan OTB Rack Mount	500,000	2	unit	N/A	1	1,000,000
4.	Splasing Optic	55,000	24	core	N/A	1	1,320,000
5.	Mobilisasi	2,000,000	1	ls	N/A	1	2,000,000
6.	Roding pipa duct	12,000	1,350	m	N/A	1	16,200,000
7.	Galian tanah kedalaman 80 cm	12,000	150	m	N/A	1	1,800,000
8.	Penarikan subduct	12,000	150	m	N/A	1	1,800,000
TOTAL							42,170,000

Kode JUST/24/0084

Judul Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H

Tanggal Pengajuan 18 Mar 2024

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1. Barang		25,860,000
2. Jasa		42,170,000
Total		68,030,000

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Pigtail SC/PC SM Biru	15,000	24	PCS	360,000
2.	Protection Slave FO	1,000	24	PCS	24,000
3.	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	15,233	150	MTR	2,284,950
TOTAL					2,668,950

B. Sumber Anggaran

Anggaran : Telecom Equipment (# BMN21-0001)

Sub Anggaran

Fiber to The Home (# BCM21-0014)

Sisa Budget

Rencana Pemakaian

Rp. 68,030,000

18,528,315,752

Kontrol Anggaran



DESMIATI MARUAO
Accounting Manager
DateTime : 2024-03-28 11:52:27

Diajukan oleh,



IBRAHIM
Senior Field Operation Officer
DateTime : 2024-03-27 12:49:45

Diperiksa oleh,



EDDY NAIBAHQ
Deputy CORO
DateTime : 2024-03-27 15:11:15

Disetujui oleh,



TIMBUL NAINGGOLAN
Chief Operational & Regulatory
Officer
DateTime : 2024-03-28 12:01:11

Disetujui oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-03-28 11:00:01

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2024-03-27 12:25:16

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 0111 5986 1692



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

No: 38 /SPH-CI- IV/2024

Yth, PROCUREMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H


ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	24	PCS		
2	material inventory	Protection Slave FO	24	PCS		
3	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	150	MTR		
4	material vendor	Kabel fiber optic 12 core	1400	m	14.500	20.300.000
5	material vendor	OTB 12 core rack mount	2	unit	145.000	290.000
6	material vendor	Kabel ties	3	pax	100.000	300.000
7	material vendor	flexible dan paralon	120	m	10.000	1.200.000
		Sub Total Material				22.090.000
8	jasa	Penarikan Kabel Fiber Optik 12 core	1400	m	9.000	12.600.000
9	jasa	Buka Tutup Mainhole dan Pengeringan	5	titik	145.000	725.000
10	jasa	Pemasangan OTB Rack Mount	2	unit	300.000	600.000
11	jasa	Splasing Optic	24	core	50.000	1.200.000
12	jasa	Mobilisasi	1	ls	1.000.000	1.000.000
13	jasa	Roding pipa duct	1350	m	7.000	9.450.000
14	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	150	m	12.000	1.800.000
15	jasa	Penarikan subduct	150	m	7.000	1.050.000
		Sub Total Material				28.425.000
		Grand Total Material & Jasa				50.515.000

Note:

1. Lama pekerjaan : 16 hari kerja
2. Pembayaran: Max 30 hari setelah Invoice
3. Garansi : 3 bulan setelah ATP

Batam, 15 April 2024
CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG
Direktur





CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh .Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

No: 38 /SPH-CI/ IV/2024

Yth, PROCUREMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	24	PCS		
2	material inventory	Protection Slave FO	24	PCS		
3	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	150	MTR		
4	material vendor	Kabel fiber optic 12 core	1400	m	14.300	20.020.000
5	material vendor	OTB 12 core rack mount	2	unit	145.000	290.000
6	material vendor	Kabel ties	3	pax	100.000	300.000
7	material vendor	flexible dan paralon	120	m	10.000	1.200.000
		Sub Total Material				21.810.000
8	jasa	Penarikan Kabel Fiber Optik 12 core	1400	m	10.000	14.000.000
9	jasa	Buka Tutup Mainhole dan Pengeringan	5	titik	280.000	1.400.000
10	jasa	Pemasangan OTB Rack Mount	2	unit	500.000	1.000.000
11	jasa	Splasing Optic	24	core	60.000	1.440.000
12	jasa	Mobilisasi	1	ls	1.500.000	1.500.000
13	jasa	Roding pipa duct	1350	m	9.000	12.150.000
14	jasa	Galian tanah kedalam 80 cm	150	m	25.000	3.750.000
15	jasa	Penarikan subduct	150	m	9.000	1.350.000
		Sub Total Material				36.590.000
		Grand Total Material & Jasa				58.400.000

Note:

1. Lama pekerjaan : 16 hari kerja
2. Pembayaran: Max 30 hari setelah Invoice
3. Garansi : 3 bulan setelah ATP

Batam, 03 April 2024
CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG
Direktur





PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Telecommunication - Electrical

Komplek Mangsang Permai Blok C No. 182 Kec. Sei Beduk Kota Batam

Telp.: 0778-7499112 Phone: 0812 774 4312 WA: 0851 0304 4312

Email: ptsinarkasih teknologi indonesia@gmail.com

QUOTATION NO:012/SKTI-BTM/IV/2024

Kepada Yth Dirut PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Jln MARKISA BATAMINDO INDUSTRIAL PARK MUKA-KUNING

Pekerjaan

Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	24	PCS		0
2	material inventory	Protection Slave FO	24	PCS		0
3	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	150	MTR		0
4	material vendor	Kabel fiber optic 12 core	1400	m	15.000	21.000.000
5	material vendor	OTB 12 core rack mount	2	unit	1.200.000	2.400.000
6	material vendor	Kabel ties	3	pax	150.000	450.000
7	material vendor	flexible dan paralon	120	m	12.000	1.440.000
		Sub Total Material				25.290.000
8	jasa	Penarikan Kabel Fiber Optik 12 core	1400	m	9.000	12.600.000
9	jasa	Buka Tutup Mainhole dan Pengeringan	5	titik	200.000	1.000.000
10	jasa	Pemasangan OTB Rack Mount	2	unit	750.000	1.500.000
11	jasa	Splasing Optic	24	core	55.000	1.320.000
12	jasa	Mobilisasi	1	ls	2.000.000	2.000.000
13	jasa	Roding pipa duct	1350	m	9.000	12.150.000
14	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	150	m	30.000	4.500.000
15	jasa	Penarikan subduct	150	m	9.000	1.350.000
		Sub Total Material				36.420.000
		Grand Total Material & Jasa				61.710.000

Note:

1. Lama pekerjaan : 30 Hari
2. Pembayaran: 100% setelah Pekerjaan Selesai
3. Garansi : 90 Hari

Batam 03 April 2024

PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Romulo N





PT. LINK ASIA PERKASA

GENERAL CONTRACTOR, TELECOMMUNICATION NETWORK

HEAD OFFICE: KOMPLEKS MKGR BLOK SWADAYA B NO 14 KIBING, KEC BATUAJI 29422
Phone 0778 8100005 Hp 081374283067

No: 26/SPH-FO-IV/2024

Yth, Ibu Frawaty Marpaung, Procurement PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jln Markisa No 1 Mukakuning Batamindo

Dear Ibu Ferawaty Marpaung, terlampir SPH Penarikan Optic Lot 325

Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	24	PCS		
2	material inventory	Protection Slave FO	24	PCS		
3	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	150	MTR		
4	material vendor	Kabel fiber optic 12 core	1400	m	15.000	21.000.000
5	material vendor	OTB 12 core rack mount	2	unit	1.500.000	3.000.000
6	material vendor	Kabel ties	3	pax	75.000	225.000
7	material vendor	flexible dan paralon	120	m	12.000	1.440.000
		Sub Total Material				25.665.000
8	jasa	Penarikan Kabel Fiber Optik 12 core	1400	m	10.500	14.700.000
9	jasa	Buka Tutup Mainhole dan Pengeringan	5	titik	220.000	1.100.000
10	jasa	Pemasangan OTB Rack Mount	2	unit	600.000	1.200.000
11	jasa	Splasing Optic	24	core	55.000	1.320.000
12	jasa	Mobilisasi	1	ls	2.000.000	2.000.000
13	jasa	Roding pipa duct	1350	m	11.000	14.850.000
14	jasa	Galian tanah kedalam 80 cm	150	m	26.000	3.900.000
15	jasa	Penarikan subduct	150	m	9.500	1.425.000
		Sub Total Material				40.495.000
		Grand Total Material & Jasa				66.160.000

Note:

1. Lama pekerjaan : 25 hari kerja
2. Pembayaran: Max 30 hari (Max 100%)
3. Garansi : 2 bulan setelah ATP

Batam, 2 April 2024
PT Link Asia Perkasa

ERIC NATHANAEL
Direktur



Judul Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H

Tanggal 15 Apr 2024

Kode Referensi JUST/24/0084



Vendor :CITRA INDOTAMA, CV

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Kabel fiber optic 12 core	1400	m	16,000	20,020,000	20,300,000	22,400,000
2	OTB 12 core rack mount	2	unit	1,100,000	290,000	290,000	2,200,000
3	Penarikan Kabel Fiber Optik 12 core	1400	m	12,000	14,000,000	12,600,000	16,800,000
4	Buka Tutup Mainhole dan Pengeringan	5	titik	250,000	1,400,000	725,000	1,250,000
5	Pemasangan OTB Rack Mount	2	unit	500,000	1,000,000	600,000	1,000,000
6	Splasing Optic	24	core	55,000	1,440,000	1,200,000	1,320,000
7	Mobilisasi	1	ls	2,000,000	1,500,000	1,000,000	2,000,000
8	Roding pipa duct	1350	m	12,000	12,150,000	9,450,000	16,200,000
9	Galian tanah kedalaman 80 cm	150	m	12,000	3,750,000	1,800,000	1,800,000
10	Penarikan subduct	150	m	12,000	1,350,000	1,050,000	1,800,000
11	Kabel ties	3	pax	100,000	300,000	300,000	300,000
12	flexible dan paralon	120	m	8,000	1,200,000	1,200,000	960,000
Subtotal					58,400,000	50,515,000	68,030,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 16 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP 0 %
 - ☐ Termin-1 0 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☒ Retensi 100 %

1. Lama Pengerjaan 16 hari
 2. Pembayaran termin 30 hari setelah invoice diterima
 3. Garansi 3 bulan setelah ATP
- Garansi : 180 hari

Vendor :SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Kabel fiber optic 12 core	1400	m	16,000	21,000,000	21,000,000	22,400,000
2	OTB 12 core rack mount	2	unit	1,100,000	2,400,000	2,400,000	2,200,000
3	Penarikan Kabel Fiber Optik 12 core	1400	m	12,000	12,600,000	12,600,000	16,800,000
4	Buka Tutup Mainhole dan Pengeringan	5	titik	250,000	1,000,000	1,000,000	1,250,000
5	Pemasangan OTB Rack Mount	2	unit	500,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000
6	Splasing Optic	24	core	55,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000

7	Mobilisasi	1	ls	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
8	Roding pipa duct	1350	m	12,000	12,150,000	12,150,000	16,200,000
9	Galian tanah kedalaman 80 cm	150	m	12,000	4,500,000	4,500,000	1,800,000
10	Penarikan subduct	150	m	12,000	1,350,000	1,350,000	1,800,000
11	Kabel ties	3	pax	100,000	450,000	450,000	300,000
12	flexible dan paralon	120	m	8,000	1,440,000	1,440,000	960,000
				Subtotal	61,710,000	61,710,000	68,030,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 30 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP 0 %
 - ☐ Termin-1 0 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☒ Retensi 100 %


1. Lama Pengerjaan 30 hari
 2. Pembayaran 100% setelah pengerjaan selesai
 3. Garansi 90 hari
- Garansi : 90 hari

Vendor :Link Asia Perkasa

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Kabel fiber optic 12 core	1400	m	16,000	21,000,000	21,000,000	22,400,000
2	OTB 12 core rack mount	2	unit	1,100,000	3,000,000	3,000,000	2,200,000
3	Penarikan Kabel Fiber Optik 12 core	1400	m	12,000	14,700,000	14,700,000	16,800,000
4	Buka Tutup Mainhole dan Pengeringan	5	titik	250,000	1,100,000	1,100,000	1,250,000
5	Pemasangan OTB Rack Mount	2	unit	500,000	1,200,000	1,200,000	1,000,000
6	Splasing Optic	24	core	55,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000
7	Mobilisasi	1	ls	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
8	Roding pipa duct	1350	m	12,000	14,850,000	14,850,000	16,200,000
9	Galian tanah kedalaman 80 cm	150	m	12,000	3,900,000	3,900,000	1,800,000
10	Penarikan subduct	150	m	12,000	1,425,000	1,425,000	1,800,000
11	Kabel ties	3	pax	100,000	225,000	225,000	300,000
12	flexible dan paralon	120	m	8,000	1,440,000	1,440,000	960,000
				Subtotal	66,160,000	66,160,000	68,030,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 25 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP 0 %
 - ☐ Termin-1 0 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☒ Retensi 100 %



1. Lama pekerjaan : 25 hari kerja
 2. Pembayaran: Max 30 hari (Max 100%)
 3. Garansi : 2 bulan setelah ATP
- Garansi : 60 hari

Alasan Skip Quotation

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/suplier **CITRA INDOTAMA, CV** dengan vendor id **VDR21-0003** sebagai pelaksana pekerjaan **Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 50,515,000**

Alasan penunjukan
Harga lebih murah

Catatan Direktur Operasional
Ok

Diajukan oleh,



LIA MARTHA GIYAN SAFITRI
Procurement Officer
DateTime : 2024-04-15 16:48:13

Diperiksa oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-04-16 08:50:59

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2024-04-16 10:16:34

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 0111 5986 1692

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0044

Supplier Code : VOB-0003	Location Code : KBTM
Order Date : 16 April 2024	Reference : BAPV/24/0039-15 Apr 2024
Expect. Rcpt. Date : 01 May 2024	Shipment Method : FOB Batam
Payment Terms : Max30 Days	Page No. : 1 of 1

SUPPLIER	DELIVER TO
CITRA INDOTAMA, CV Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1 Batam BT Indonesia TEL: 0778-395 000	KANTOR BATAM PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H Material :					
1.	Kabel fiber optic 12 core	1400 MTR	14,500.00	-	20,300,000.00
2.	OTB 12 core rack mount	2 UNT	145,000.00	-	290,000.00
3.	Kabel Ties	3 PKG	100,000.00	-	300,000.00
4.	Flexible dan Paralon	120 MTR	10,000.00	-	1,200,000.00
Jasa :					
5.	Penarikan Kabel Fiber Optik 12 core	1400 MTR	9,000.00	-	12,600,000.00
6.	Buka Tutup Mainhole dan Pengeringan	5 TITIK	145,000.00	-	725,000.00
7.	Pemasangan OTB Rack Mount	2 UNT	300,000.00	-	600,000.00
8.	Splasing Optic	24 COR	50,000.00	-	1,200,000.00
9.	Mobilisasi	1 LS	1,000,000.00	-	1,000,000.00
10.	Roding Pipa Duct	1350 MTR	7,000.00	-	9,450,000.00
11.	Galian Tanah Kedalaman 80 cm	150 MTR	12,000.00	-	1,800,000.00
12.	Penarikan Subduct	150 MTR	7,000.00	-	1,050,000.00
Note: 1. Lama Pekerjaan : 16 Hari kerja 2. Pembayaran : Max 30 hari setelah invoice 3. Garansi : 3 bulan setelah ATP					

CANCELLED

 Abdullah Pratama Habibie Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 50,515,000.00
---	--	--

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0044

Supplier Code : VOB-0003
Order Date : 16 April 2024
Expect. Rcpt. Date : 01 May 2024
Payment Terms : Max30 Days

Location Code : KBTM
Reference : BAPV/24/0039-15 Apr 2024
Shipment Method : FOB Batam
Page No. : 1 of 2

SUPPLIER

CITRA INDOTAMA, CV
Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1
Batam BT
Indonesia
TEL: 0778-395 000

DELIVER TO

KANTOR BATAM
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H Material :					
1.	Kabel fiber optic 12 core	1400 MTR	14,500.00	-	20,300,000.00
2.	OTB 12 core rack mount	2 UNT	145,000.00	-	290,000.00
3.	Kabel Ties	3 PKG	100,000.00	-	300,000.00
4.	Flexible dan Paralon	120 MTR	10,000.00	-	1,200,000.00
Jasa :					
5.	Penarikan Kabel Fiber Optik 12 core	1400 MTR	9,000.00	-	12,600,000.00
6.	Buka Tutup Mainhole dan Pengeringan	5 TITIK	145,000.00	-	725,000.00
7.	Pemasangan OTB Rack Mount	2 UNT	300,000.00	-	600,000.00
8.	Splasing Optic	24 COR	50,000.00	-	1,200,000.00
9.	Mobilisasi	1 LS	1,000,000.00	-	1,000,000.00
10.	Roding Pipa Duct	1350 MTR	7,000.00	-	9,450,000.00
11.	Galian Tanah Kedalaman 80 cm	150 MTR	12,000.00	-	1,800,000.00
12.	Penarikan Subduct	150 MTR	7,000.00	-	1,050,000.00
BATK/24/0010-6 Juni 2024					
13.	Pemasangan dan Instalasi OTB Wall	4 UNT	500,000.00	-	2,000,000.00
14.	Splasing Optic	48 COR	50,000.00	-	2,400,000.00
15.	Penarikan subduct	130 MTR	7,000.00	-	910,000.00
Note:					
1. Lama Pekerjaan : 16 Hari kerja					
2. Pembayaran : Max 30 hari setelah invoice					

CHEQUE

BANK :mandiri
NUMBER :0111 5986 1692



Telekomunikasi

We response to your need

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0044

Supplier Code	: VOB-0003	Location Code	: KBTM
Order Date	: 16 April 2024	Reference	: BAPV/24/0039-15 Apr 2024
Expect. Rcpt. Date	: 01 May 2024	Shipment Method	: FOB Batam
Payment Terms	: Max30 Days	Page No.	: 2 of 2

SUPPLIER

CITRA INDOTAMA, CV
Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1
Batam BT
Indonesia
TEL: 0778-395 000

DELIVER TO

KANTOR BATAM
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
-----	-------------	----------	---------------------	------------	-----------------

3. Garansi : 3 bulan setelah ATP

CHEQUE
CHEQUE

BANK mandiri
NUMBER 0111 5986 1692

Abdullah Pratama Habibie
Authorised Signature

Invoice Send to :
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning
Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200
NPWP PPN
01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"

Total IDR 55,825,000.00



**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/24/0011**

Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H

Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Juni 2024 telah dilaksanakan Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H sesuai dengan No. PUO/24/0044 tanggal 16 April 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			PO	REALISASI	
	Material				
1	Kabel fiber optic 12 core	MTR	1,400	1,400	
2	OTB 12 core rack mount	UNT	2	2	
3	Kabel Ties	PKG	3	3	
4	Flexible dan Paralon	MTR	120	120	
	Jasa Engineering				
1	Penarikan Kabel Fiber Optik 12 core	MTR	1,400	1,400	
2	Buka Tutup Mainhole dan Pengeringan	TITIK	5	5	
3	Pemasangan OTB Rack Mount	UNT	2	2	
4	Splasing Optic	COR	24	72	
5	Mobilisasi	LS	1	1	
6	Roding Pipa Duct	MTR	1,350	1,350	
7	Galian Tanah Kedalaman 80 cm	MTR	150	150	
8	Penarikan Subduct	MTR	150	280	
9	Pemasangan dan Instalasi OTB Wall	UNT	0	4	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi			CV. CITRA INDOTAMA
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Senior FOO	 Eddy Naibaho Deputy CORO	 Timbul Nainggolan Chief Operational & Regulatory	 Daendels Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**


BAL/24/0108

Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 06 June 2024

Purchase Order : PUO/24/0044
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Kabel fiber optic 12 core	MTR	1,400.00	1,400.00	
2.	OTB 12 core rack mount	UNT	2.00	2.00	
3.	Kabel Ties	PKG	3.00	3.00	
4.	Flexible dan Paralon	MTR	120.00	120.00	
5.	Penarikan Kabel Fiber Optik 12 core	MTR	1,400.00	1,400.00	
6.	Buka Tutup Mainhole dan Pengeringan	TITIK	5.00	5.00	
7.	Pemasangan OTB Rack Mount	UNT	2.00	2.00	
8.	Splasing Optic	COR	24.00	24.00	
9.	Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
10.	Roding Pipa Duct	MTR	1,350.00	1,350.00	
11.	Galian Tanah Kedalaman 80 cm	MTR	150.00	150.00	
12.	Penarikan Subduct	MTR	150.00	150.00	
13.	Pemasangan dan Instalasi OTB Wall	UNT	4.00	4.00	
14.	Splasing Optic	COR	48.00	48.00	
15.	Penarikan subduct	MTR	130.00	130.00	



Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)

BAL/24/0108

Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 06 June 2024

Purchase Order : PUO/24/0044
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

Batam , 6 Jun 2024

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

User Mengetahui

Ibrahim

Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vender,

Menyetujui,

Timbul Nainggolan.

General Manager

IT-GRN 24/000024

Input & Check By	Posted By
Risna Uli Susanti	Apriansah

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 0111 5986 1692

BERITA ACARA TAMBAH/KURANG

(BATK)

BATK/24/0010

Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Juni 2024

Pelaksana Pekerjaan : Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H

No. PO : PUO/24/0044- 16 April 2024

Harga PO Awal : Rp 50,515,000

Harga PO Setelah Realisasi : Rp 55,825,000

BATK : Rp 5,310,000

% BATK : 10.51%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan CV CI maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:


No	JENIS PEKERJAAN/BARANG	SATUAN	PO			REALISASI		
			VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	JUMLAH
	Material							
1	Kabel fiber optic 12 core	MTR	1,400	14,500	20,300,000	1,400	14,500	20,300,000
2	OTB 12 core rack mount	UNT	2	145,000	290,000	2	145,000	290,000
3	Kabel Ties	PKG	3	100,000	300,000	3	100,000	300,000
4	Flexible dan Paralon	MTR	120	10,000	1,200,000	120	10,000	1,200,000
	Total Material				22,090,000			22,090,000
	Jasa							
1	Penarikan Kabel Fiber Optik 12 core	MTR	1,400	9,000	12,600,000	1,400	9,000	12,600,000
2	Buka Tutup Mainhole dan Pengerangan	TITIK	5	145,000	725,000	5	145,000	725,000
3	Pemasangan OTB Rack Mount	UNT	2	300,000	600,000	2	300,000	600,000
4	Splasing Optic	COR	24	50,000	1,200,000	72	50,000	3,600,000
5	Mobilisasi	LS	1	1,000,000	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000
6	Roding Pipa Duct	MTR	1,350	7,000	9,450,000	1,350	7,000	9,450,000
7	Galian Tanah Kedalaman 80 cm	MTR	150	12,000	1,800,000	150	12,000	1,800,000
8	Penarikan Subduct	MTR	150	7,000	1,050,000	280	7,000	1,960,000
9	Pemasangan dan Instalasi OTB Wall	UNT	0	0	0	4	500,000	2,000,000
					28,425,000			33,735,000
	Grand Total				50,515,000			55,825,000

1. Selisih Nilai BATK 5,310,000

2. % BATK 5,310,000 / 50,515,000 10.51%

Maka total Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H adalah sebesar : Rp. 55.825.000,- (Lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi	CV. CITRA INDOTAMA
Menyetujui,	Vendor,
 Abdulah Pratama Habibie Direktur Utama	 Daendels Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 0111 5986 1692

BERITA ACARA TAMBAH/KURANG

(BATK)

BATK/24/0010

Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Juni 2024

Pelaksana Pekerjaan : Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H

No. PO : PUO/24/0044- 16 April 2024

Harga PO Awal : Rp 50,515,000

Harga PO Setelah Realisasi : Rp 55,825,000

BATK : Rp 5,310,000

% BATK : 10.51%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan CV CI maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS	SATUAN	PO			REALISASI		
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	JUMLAH
	Material							
1	Kabel fiber optic 12 core	MTR	1,400	14,500	20,300,000	1,400	14,500	20,300,000
2	OTB 12 core rack mount	UNT	2	145,000	290,000	2	145,000	290,000
3	Kabel Ties	PKG	3	100,000	300,000	3	100,000	300,000
4	Flexible dan Paralon	MTR	120	10,000	1,200,000	120	10,000	1,200,000
	Total Material				22,090,000			22,090,000
	Jasa							
1	Penarikan Kabel Fiber Optik 12 core	MTR	1,400	9,000	12,600,000	1,400	9,000	12,600,000
2	Buka Tutup Mainhole dan Pengeringan	TITIK	5	145,000	725,000	5	145,000	725,000
3	Pemasangan OTB Rack Mount	UNT	2	300,000	600,000	2	300,000	600,000
4	Splasing Optic	COR	24	50,000	1,200,000	72	50,000	3,600,000
5	Mobilisasi	LS	1	1,000,000	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000
6	Roding Pipa Duct	MTR	1,350	7,000	9,450,000	1,350	7,000	9,450,000
7	Galian Tanah Kedalaman 80 cm	MTR	150	12,000	1,800,000	150	12,000	1,800,000
8	Penarikan Subduct	MTR	150	7,000	1,050,000	280	7,000	1,960,000
9	Pemasangan dan Instalasi OTB Wall	UNT	0	0	0	4	500,000	2,000,000
					28,425,000			33,735,000
	Grand Total				50,515,000			55,825,000

1. Selisih Nilai BATK 5,310,000

2. % BATK 5,310,000 / 50,515,000 10.51%

Maka total Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H adalah sebesar : Rp. 55.825.000,- (Lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi	CV. CITRA INDOTAMA
Menyetujui,	
<u>Abdullah Pratama Habibie</u>	
Direktur Utama	Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 0111 5986 1692

BERITA ACARA TAMBAH/KURANG

(BATK)

BATK/24/0010

Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Juni 2024
Pelaksana Pekerjaan : Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H
No. PO : PUO/24/0044- 16 April 2024
Harga PO Awal : Rp 50,515,000
Harga PO Setelah Realisasi : Rp 55,825,000
BATK : Rp 5,310,000
% BATK : 10.51%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan CV CI maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :


Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS	SATUAN	PO			REALISASI		
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	JUMLAH
	Material							
1	Kabel fiber optic 12 core	MTR	1,400	14,500	20,300,000	1,400	14,500	20,300,000
2	OTB 12 core rack mount	UNT	2	145,000	290,000	2	145,000	290,000
3	Kabel Ties	PKG	3	100,000	300,000	3	100,000	300,000
4	Flexible dan Paralon	MTR	120	10,000	1,200,000	120	10,000	1,200,000
	Total Material				22,090,000			22,090,000
	Jasa							
1	Penarikan Kabel Fiber Optik 12 core	MTR	1,400	9,000	12,600,000	1,400	9,000	12,600,000
2	Buka Tutup Mainhole dan Pengerangan	TITIK	5	145,000	725,000	5	145,000	725,000
3	Pemasangan OTB Rack Mount	UNT	2	300,000	600,000	2	300,000	600,000
4	Splasing Optic	COR	24	50,000	1,200,000	72	50,000	3,600,000
5	Mobilisasi	LS	1	1,000,000	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000
6	Roding Pipa Duct	MTR	1,350	7,000	9,450,000	1,350	7,000	9,450,000
7	Galian Tanah Kedalaman 80 cm	MTR	150	12,000	1,800,000	150	12,000	1,800,000
8	Penarikan Subduct	MTR	150	7,000	1,050,000	280	7,000	1,960,000
9	Pemasangan dan Instalasi OTB Wall	UNT	0	0	0	4	500,000	2,000,000
					28,425,000			33,735,000
Grand Total					50,515,000			55,825,000

1. Selisih Nilai BATK 5,310,000
2. % BATK 5,310,000 / 50,515,000 10.51%

Maka total Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325 H adalah sebesar : Rp. 55.825.000,- (Lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi	CV. CITRA INDOTAMA
Menyetujui,	Vendor,
 Abdulah Pratama Habibie Direktur Utama	 Daendels Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%






FOTO DOKUMENTASI RODING PIPA DUCT LOT 325 PEGAUNIHAN


Picture 1

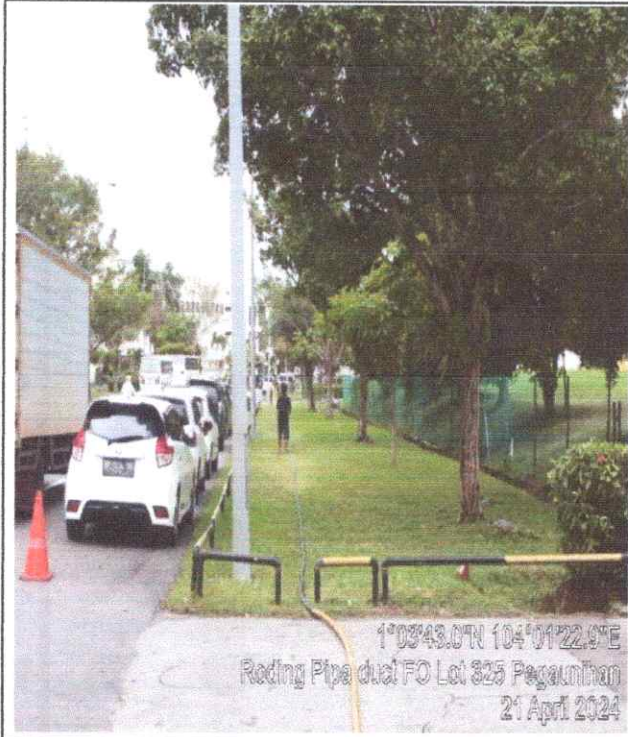

Picture 2

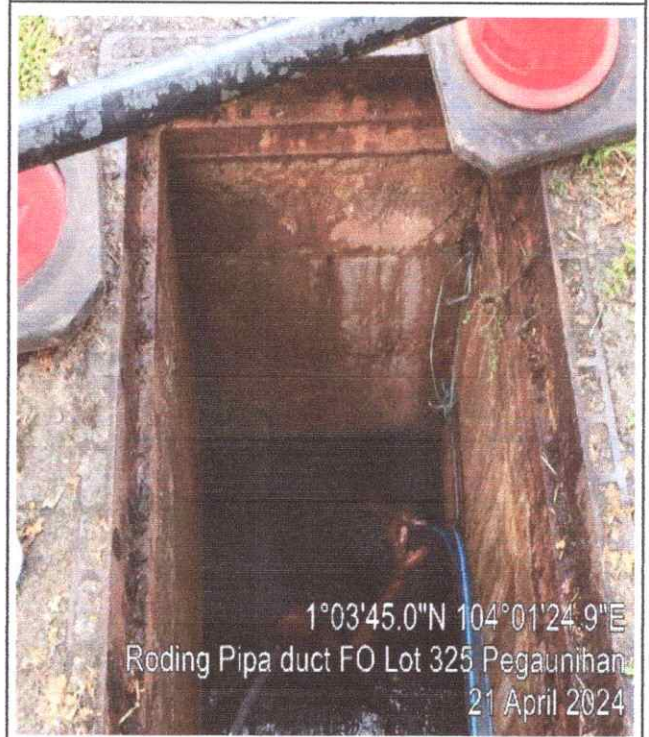

Picture 3

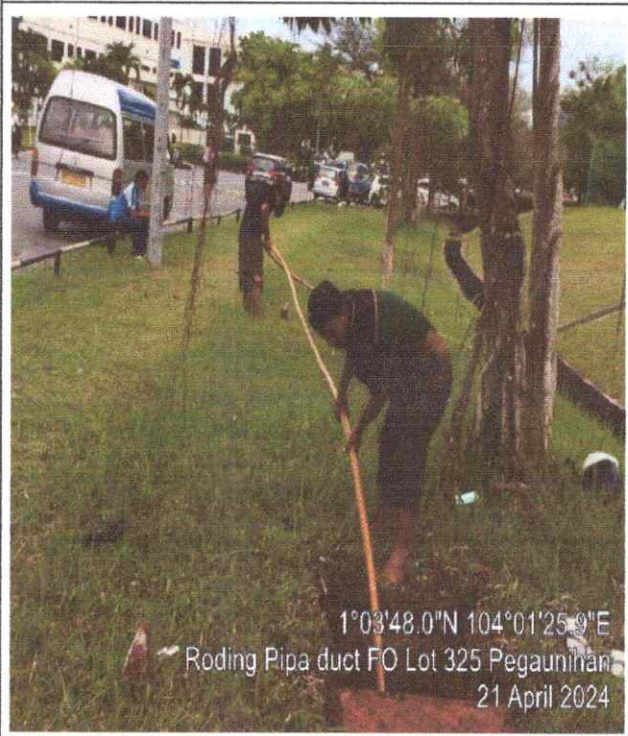

Picture 4



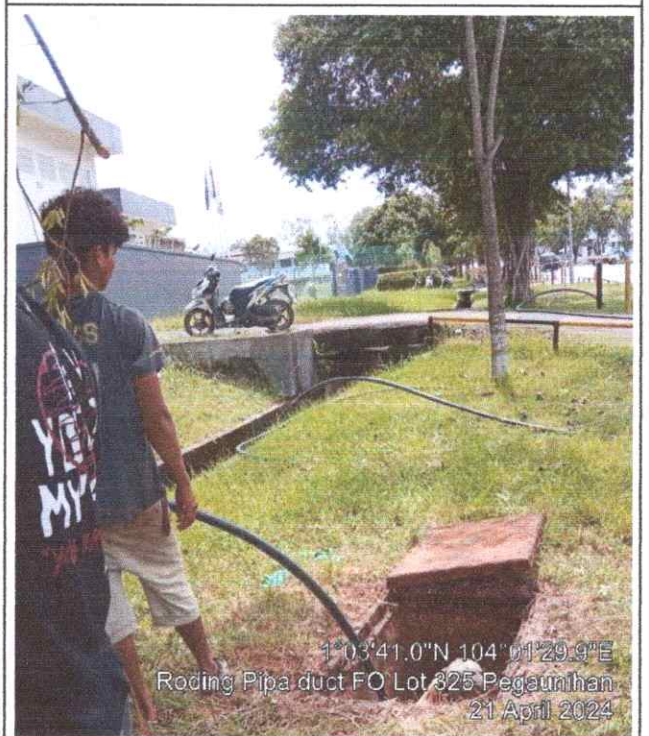


FOTO DOKUMENTASI RODING PIPA DUCT LOT 325 PEGAUNIHAN


Picture 1

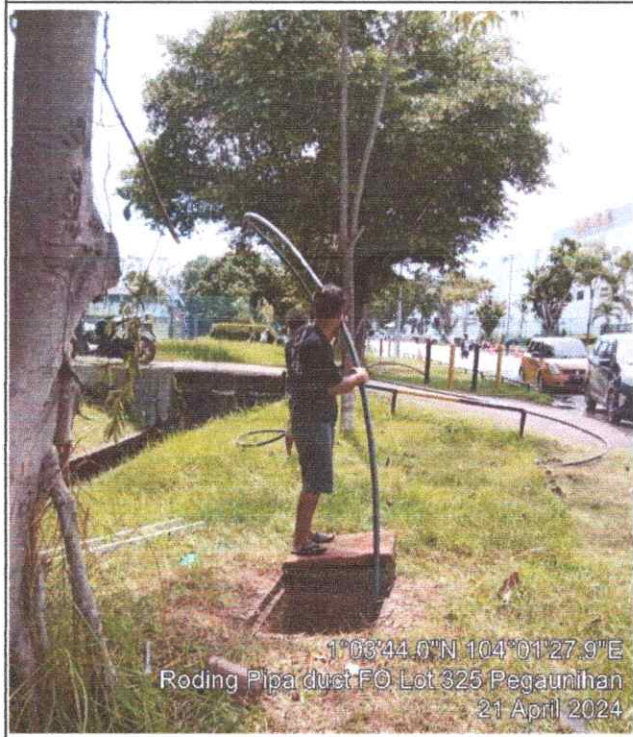

Picture 2

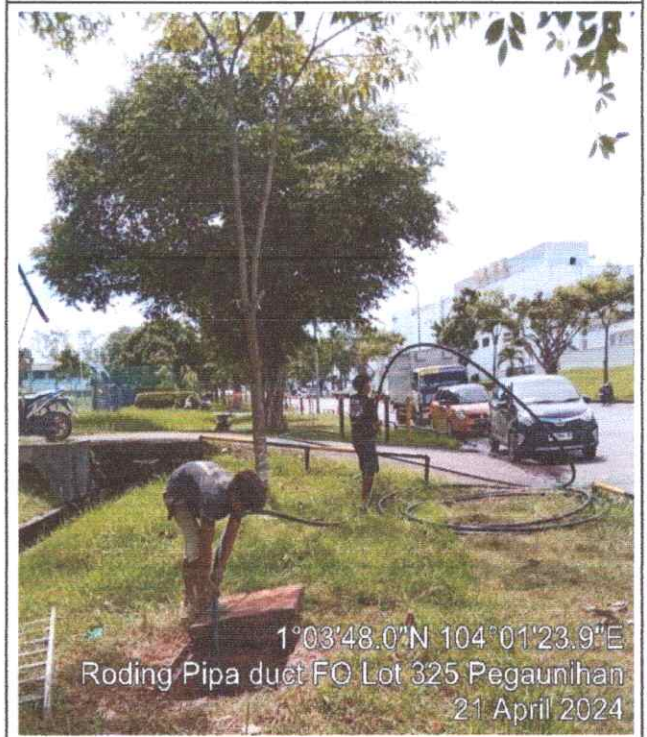

Picture 3

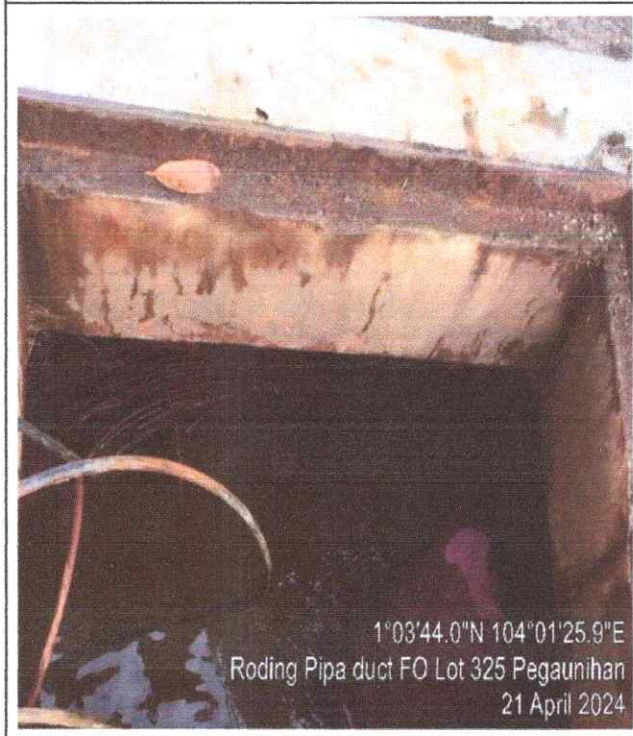

Picture 4


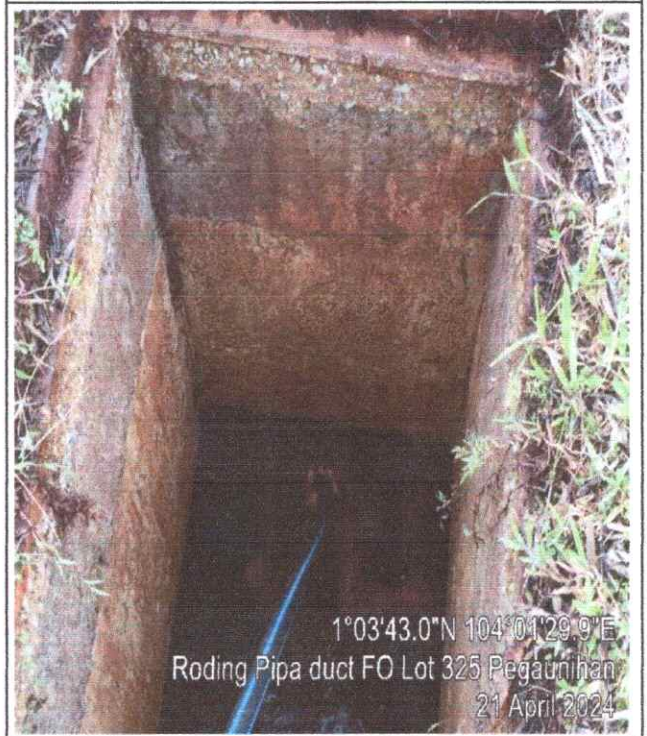


FOTO DOKUMENTASI RODING PIPA DUCT LOT 325 PEGAUNIHAN

Picture 1




Picture 2

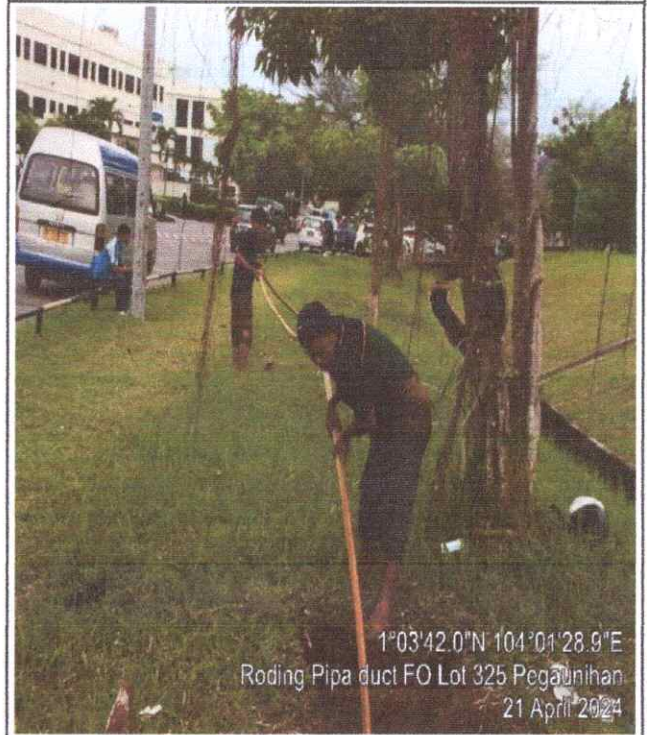

Picture 3



Picture 4

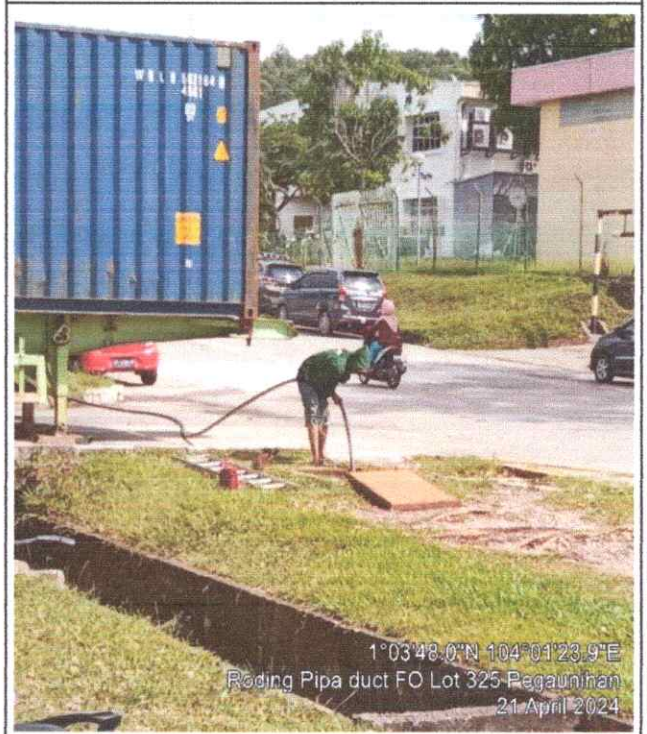

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2024-0084

Penarikan kabel Fiber Optic dari central MKK ke Lot 325

TE012756

Main asset No.

61,461,000.00

AMOUNT DEBIT/(KREDIT)

2,400,000.00

Completed Date

6 Jun 24

Completed Document

BAU/24/0108

QTY

150

UOM

MTR

Group

Infra

Start Dep

6 Jun 24

Usage

10

TE-Perangkat Kecil (PRK)

3

TE-Infrastruktur (INFRA)

10

61,461,000.00

Filled by Inventory & FA

User

ibrahim

TE012757

2,400,000.00

Completed Date

6 Jun 24

Completed Document

BAU/24/0108

QTY

130

UOM

MTR

Group

Infra

Start Dep

6 Jun 24

Usage

10

TE-Perangkat Kecil (PRK)

3

TE-Infrastruktur (INFRA)

10

2,080,000.00

Filled by Inventory & FA

User

ibrahim

TE012757

250,000.00

Completed Date

6 Jun 24

Completed Document

BAU/24/0108

QTY

1

UOM

UNT

Group

Infra

Start Dep

6 Jun 24

Usage

10

TE-Perangkat Kecil (PRK)

3

TE-Infrastruktur (INFRA)

10

250,000.00

Filled by Inventory & FA

User

ibrahim

TE012757

250,000.00

Completed Date

6 Jun 24

Completed Document

BAU/24/0108

QTY

1

UOM

UNT

Group

Infra

Start Dep

6 Jun 24

Usage

10

TE-Perangkat Kecil (PRK)

3

TE-Infrastruktur (INFRA)

10

250,000.00

Filled by Inventory & FA

User

ibrahim

TE012757

139,200.00

Completed Date

6 Jun 24

Completed Document

BAU/24/0108

QTY

24

UOM

PCS

Group

Infra

Start Dep

6 Jun 24

Usage

10

TE-Perangkat Kecil (PRK)

3

TE-Infrastruktur (INFRA)

10

139,200.00

Filled by Inventory & FA

User

ibrahim

TE012757

16,800.00

Completed Date

6 Jun 24

Completed Document

BAU/24/0108

QTY

24

UOM

PCS

Group

Infra

Start Dep

6 Jun 24

Usage

10

TE-Perangkat Kecil (PRK)

3

TE-Infrastruktur (INFRA)

10

16,800.00

Filled by Inventory & FA

User

ibrahim

TE012757

Prepared By,

Record BY

Reviewed & Posted By

User By,

Apriansah

ibrahim

Status Transaksi

Melacak Transaksi Anda

Status Transaksi

ID Transaksi	202407011159861692
Nomor Dokumen	202407011159861692
Tanggal Pembuatan	Jul 01, 2024 11:59:19 (GMT +7)
Jumlah Nominal Debit	IDR 55,153,200.00
Model Instruksi	Segera
Status Transaksi	● sukses

Single Transfer To Other Bank - Clearing (ID: SKN/LLG) Transfer

SOR Number	20240702001205031371
599102093313801	
Sumber Dana	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM
Rekening Tujuan	3262395500 CV. CITRA INDOTAMA
Informasi Bank Penerima	BCA (Bank Central Asia) LLG : 0140397
Metode Transfer	LLG
Dibebankan ke	OUR
Jumlah	IDR 55,150,300.00
SKN Fee	IDR 2,900 (IDR 2,900.00 / catatan)
Total Biaya	IDR 2,900.00
Jumlah Nominal Debit	IDR 55,153,200.00
Nomor Referensi	PV2407016
Keterangan	PV2407016
Uraian	Penarikan FO dari Central MKK ke Lot 32 5H
Model Instruksi	Segera
Tanggal Instruksi	Jul 02, 2024
Notifikasi Tambahan	Email - SMS -
