



Telekomunikasi

We response to your need

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0177

Supplier Code	: VOB-0120	Location Code	: KBTM
Order Date	: 19 September 2024	Reference	: BAPV/24/0172-18 Sep 2024
Expect. Rcpt. Date	: 04 October 2024	Shipment Method	: FOB BANDUNG
Payment Terms	: Max30 Days	Page No.	: 1 of 1

SUPPLIER

SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT
KOMPLEK MANGSANG PERMAI BLOK C No. 182
KEC. SEI BEDUK KOTA BATAM
Batam BT
Indonesia
TEL: 08127744312
Attn: ROMULO NADEAK

DELIVER TO

KANTOR BATAM
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
Pembangunan jaringan backhaule CKL Energy (Kawasan Bintang Industri) Material					
1.	Material safety slekan	2 UNT	250,000.00	-	500,000.00
2.	Galvanis 2 inch dan Aksesoris	1 BATA NG	400,000.00	-	400,000.00
Jasa					
3.	Galian tanah kedalaman 80 cm	220 MTR	24,000.00	-	5,280,000.00
4.	Boring Jalan	30 MTR	90,000.00	-	2,700,000.00
5.	Penarikan Subduct HDPE	220 MTR	8,000.00	-	1,760,000.00
6.	Penarikan FO 48 Core backhaul	240 MTR	8,000.00	-	1,920,000.00
7.	Installasi pipa galvanis	1 BATA NG	105,000.00	-	105,000.00
8.	Splacing/OTDR	12 COR	50,000.00	-	600,000.00
9.	Pemasangan safety slekan	2 PCS	145,000.00	-	290,000.00
10.	Gambar autocad	1 LS	300,000.00	-	300,000.00
11.	Documentasi	1 LS	300,000.00	-	300,000.00
12.	Transportasi / Mobilisasi	1 LS	500,000.00	-	500,000.00
13.	Biaya Ijin Galian BP Batam	1 LS	2,000,000.00	-	2,000,000.00
Note:					
- Lama pekerjaan: 10 Hari					
- Garansi : 90 Hari					
- Pembayaran : 100% setelah Pekerjaan Selesai					

CANCELLED

Robby Susilo

Authorised Signature

Invoice Send to :

PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning
Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200

NPWP PPN

01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"

Total

IDR 16,655,000.00



Telekomunikasi

We response to your need

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0177

Supplier Code : VOB-0120
Order Date : 19 September 2024
Expect. Rcpt. Date : 04 October 2024
Payment Terms : Max30 Days

Location Code : KBTM
Reference : BAPV/24/0172-18 Sep 2024
Shipment Method : FOB BANDUNG
Page No. : 1 of 2

SUPPLIER

SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT
KOMPLEK MANGSANG PERMAI BLOK C No. 182
KEC. SEI BEDUK KOTA BATAM
Batam BT
Indonesia
TEL: 08127744312
Attn: ROMULO NADEAK

DELIVER TO

KANTOR BATAM
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	Pembangunan jaringan backhaule CKL Energy (Kawasan Bintang Industri) Material				
1.	Material safety slekan	2 UNT	250,000.00	-	500,000.00
2.	Galvanis 2 inch dan Aksesoris	1 BATA NG	400,000.00	-	400,000.00
	Jasa				
3.	Galian tanah kedalaman 80 cm	220 MTR	24,000.00	-	5,280,000.00
4.	Boring Jalan	30 MTR	90,000.00	-	2,700,000.00
5.	Penarikan Subduct HDPE	220 MTR	8,000.00	-	1,760,000.00
6.	Penarikan FO 48 Core backhaul	240 MTR	8,000.00	-	1,920,000.00
7.	Instalasi pipa galvanis	1 BATA NG	105,000.00	-	105,000.00
8.	Splasing/OTDR	12 COR	50,000.00	-	600,000.00
9.	Pemasangan safety slekan	2 PCS	145,000.00	-	290,000.00
10.	Gambar autocad	1 LS	300,000.00	-	300,000.00
11.	Documentasi	1 LS	300,000.00	-	300,000.00
12.	Transportasi / Mobilisasi	1 LS	500,000.00	-	500,000.00
13.	Biaya Ijin Galian BP Batam BATK/24/0028-1 Nov 24	1 LS	2,000,000.00	-	2,000,000.00
14.	Pemasangan ODP Splitter 1:8	1 PCS	385,000.00	-	385,000.00
15.	Pemasangan SUB ODP Splitter 1:16 - Lama pekerjaan: 10 Hari	1 PCS	385,000.00	-	385,000.00

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0177

Supplier Code	: VOB-0120	Location Code	: KBTM
Order Date	: 19 September 2024	Reference	: BAPV/24/0172-18 Sep 2024
Expect. Rcpt. Date	: 04 October 2024	Shipment Method	: FOB BANDUNG
Payment Terms	: Max30 Days	Page No.	: 2 of 2

SUPPLIER

SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT
KOMPLEK MANGSANG PERMAI BLOK C No. 182
KEC. SEI BEDUK KOTA BATAM
Batam BT
Indonesia
TEL: 08127744312
Attn: ROMULO NADEAK

DELIVER TO

KANTOR BATAM
PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
-----	-------------	----------	---------------------	------------	-----------------

- Garansi : 90 Hari
- Pembayaran : 100% setelah Pekerjaan Selesai



Robby Susilo

Authorised Signature

Invoice Send to :

PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning
Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200

NPWP PPN

01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"

Total

IDR 17,425,000.00


**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING
(BATC)
BATC/24/0033**

Pembangunan jaringan backhaule CKL Energy (Kawasan Bintang Industri)

Pada hari ini, Jumat tanggal 1 November 2024 telah dilaksanakan Pembangunan jaringan backhaule CKL Energy (Kawasan Bintang Industri) sesuai dengan No. PUO/24/0177 tanggal 19 September 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Material safety slekan	unt	2	2	
2	Galvanis 2 inch dan Aksesoris	batang	1	1	
	Jasa				
1	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	220	220	
2	Boring Jalan	MTR	30	30	
3	Penarikan Subduct HDPE	MTR	220	220	
4	Penarikan FO 48 Core backhaul	MTR	240	240	
5	Instalasi pipa galvanis	BATANG	1	1	
6	Splasing/OTDR	COR	12	12	
7	Pemasangan safety slekan	PCS	2	2	
8	Gambar autocad	LS	1	1	
9	Documentasi	LS	1	1	
10	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	
11	Biaya Ijin Galian BP Batam	LS	1	1	
12	Pemasangan ODP Splitter 1:8	pcs	-	1	
13	Pemasangan SUB ODP Splitter 1:16	pcs	-	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			PT Sinar Kasih Teknologi Indonesia
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Senior FO Officer	 Eddy Naibaho Deputy CORO	 Timbul Nainggolan CORO GM Kepri	 Romulo Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0335

Pembangunan jaringan backhaule CKL Energy (Kawasan Bintang Industri)

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 01 November 2024

Purchase Order : PUO/24/0177
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Material safety slekan	UNT	2.00	2.00	
2.	Galvanis 2 inch dan Aksesoris	BATANG	1.00	1.00	
3.	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	220.00	220.00	
4.	Boring Jalan	MTR	30.00	30.00	
5.	Penarikan Subduct HDPE	MTR	220.00	220.00	
6.	Penarikan FO 48 Core backhaul	MTR	240.00	240.00	
7.	Instalasi pipa galvanis	BATANG	1.00	1.00	
8.	Splicing/OTDR	COR	12.00	12.00	
9.	Pemasangan safety slekan	PCS	2.00	2.00	
10.	Gambar autocad	LS	1.00	1.00	
11.	Documentasi	LS	1.00	1.00	
12.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
13.	Biaya Ijin Galian BP Batam	LS	1.00	1.00	
14.	Pemasangan ODP Splitter 1:8	PCS	1.00	1.00	
15.	Pemasangan SUB ODP Splitter 1:16	PCS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 1 Nov 2024

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

User Mengetahui

**SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,
PT**



**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0335

Pembangunan jaringan backhaule CKL Energy (Kawasan Bintang Industri)

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 01 November 2024

Purchase Order : PUO/24/0177
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan										
	 Ibrahim  Eddy Naibaho				Vendor  ROMULO NADEAK										
Menyetujui,															
<u>Robby Susilo</u> Chief Financial & HR Officer - GM Nasional <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="2">IT-GRN.....</th></tr><tr><th style="width: 50%;">Input & Check By</th><th style="width: 50%;">Posted By</th></tr></thead><tbody><tr><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td></tr><tr><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td></tr><tr><td style="height: 20px;">Risna Uli Susanti</td><td style="height: 20px;">Apriansah</td></tr></tbody></table>						IT-GRN.....		Input & Check By	Posted By					Risna Uli Susanti	Apriansah
IT-GRN.....															
Input & Check By	Posted By														
Risna Uli Susanti	Apriansah														

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)

BAL/24/0335






Pembangunan jaringan backhaule CKL Energy (Kawasan Bintang Industri)

Supplier Code : VOB-0120

Purchase Order : PUO/24/0177

Document Date : 01 November 2024

Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan								
 Ibrahim	 Eddy Naibaho		Vendor  ROMULO NADEAK										
Menyetujui,													
 <u>Robby Susilo</u> Chief Financial & HR Officer - GM Nasional													
<table><tr><td colspan="2">IT-GRN 24/</td></tr><tr><td>Input & Check By</td><td>Posted By</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Risna Uli Susanti</td><td>Apriansah</td></tr></table>						IT-GRN 24/		Input & Check By	Posted By			Risna Uli Susanti	Apriansah
IT-GRN 24/													
Input & Check By	Posted By												
													
Risna Uli Susanti	Apriansah												

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)


BAL/24/0335

Pembangunan jaringan backhaule CKL Energy (Kawasan Bintang Industri)

Supplier Code VOB 0120 Purchase Order PUO/24/0177
Document Date 01 November 2024 Page No 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BQQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------


Ibrahim


Eddy Naibaho



Vendor

ROMULO NADEAK

Menyetujui,


Robby Susito

Chief Financial & HR Officer - GM Nasional

IT-GRN 24/000263	
Input & Check By	Proses By
	
Rosha Li Susanti	Impianan

**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(BATK)
BATK/24/0028**

Pembangunan FTTH Ruko Pasir Putih

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Jumat , 1 November 2024
Pelaksana Pekerjaan : Pembangunan FTTH Ruko Pasir Putih
No. PO : PUO/24/0177- tanggal 19 September 2024
Harga PO : Rp 16,655,000

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan PT SKTI, maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS PEKERJAAN/BARANG	SATUAN	BOQ			REALISASI		JUMLAH HARGA
			VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	
	MATERIAL							
1	Material safety slekan	UNIT	2	250,000	500,000	2	250,000	500,000
2	Galvanis 2 inch dan Aksesoris	btg	1	400,000	400,000	1	400,000	400,000
	Total Material				900,000			900,000
	Jasa Engineering							
1	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	220	24,000	5,280,000	220	24,000	5,280,000
2	Boring Jalan	MTR	30	90,000	2,700,000	30	90,000	2,700,000
3	Penarikan Subduct HDPE	MTR	220	8,000	1,760,000	220	8,000	1,760,000
4	Penarikan FO 48 Core backhaul	MTR	240	8,000	1,920,000	240	8,000	1,920,000
5	Instalasi pipa galvanis	BTG	1	105,000	105,000	1	105,000	105,000
6	Splicing/OTDR	COR	12	50,000	600,000	12	50,000	600,000
7	Pemasangan safety slekan	PCS	2	145,000	290,000	2	145,000	290,000
8	Gambar autocad	LS	1	300,000	300,000	1	300,000	300,000
9	Documentasi	LS	1	300,000	300,000	1	300,000	300,000
10	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	500,000	500,000	1	500,000	500,000
11	Biaya Ijin Galian BP Batam	LS	1	2,000,000	2,000,000	1	2,000,000	2,000,000
12	Pemasangan ODP Splitter 1:8	pcs	-	-	-	1	385,000	385,000
13	Pemasangan SUB ODP Splitter 1:16	pcs	-	-	-	1	385,000	385,000
	Total Jasa Engineering				15,755,000			16,525,000
	Total Material &				16,655,000			17,425,000

1. Selisih Nilai BATK 770,000
2. % BATK 770,000 / 16,655,000 4.62%

Maka total Pembangunan jaringan backhaule CKL Energy (Kawasan Bintang Industri) adalah sebesar : Rp. 17.425.000,- (Tujuh belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

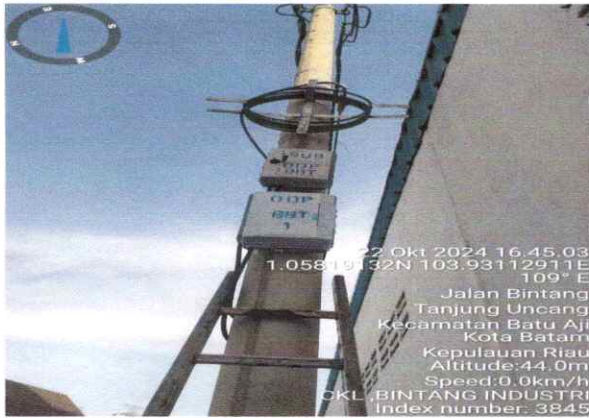
Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi	PT Sinar Kasih Teknologi Indonesia
Menyetujui,	
	
Robby Susilo Chief Financial & HR Officer - GM Nasional	Romulo Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%

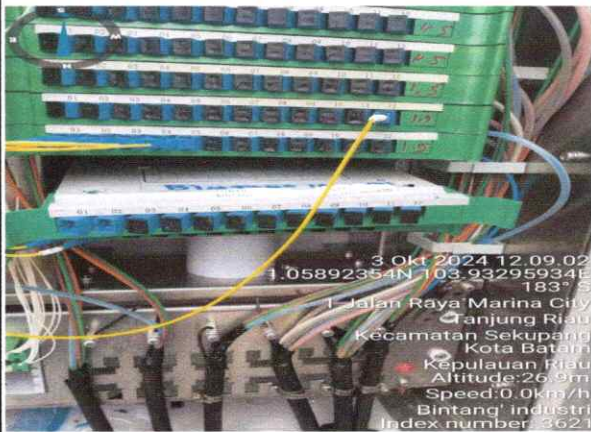
DOKUMENTASI FTTH CKL BINTANG INDUSTRI



PEMASANGAN ODP



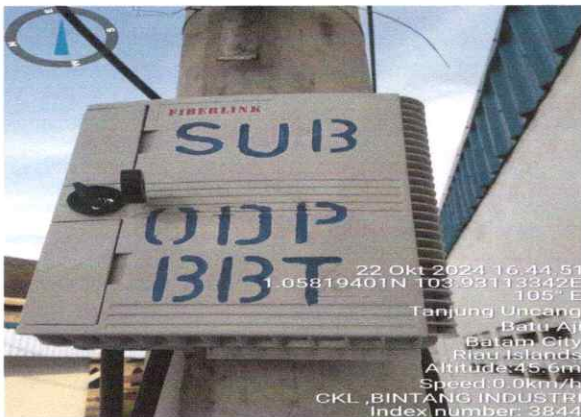
PERAPIAN GALIAN



ODC SIMPANG POLSEK BATU AJI



KOMPLEK BINTANG INDUSTRI



SUB ODP

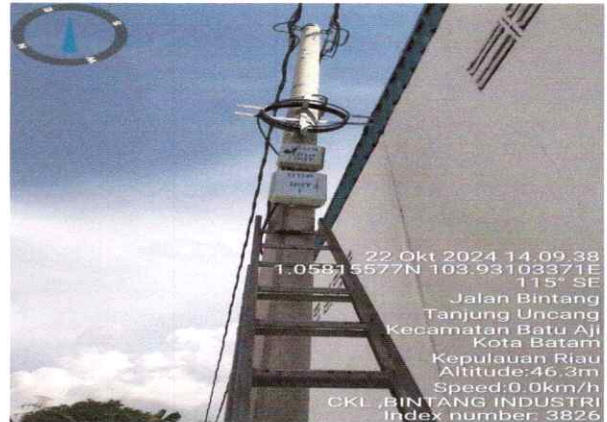


PENIMBUNAN GALIAN

DOKUMENTASI FTTH CKL BINTANG INDUSTRI



SUB ODP TERBUKA



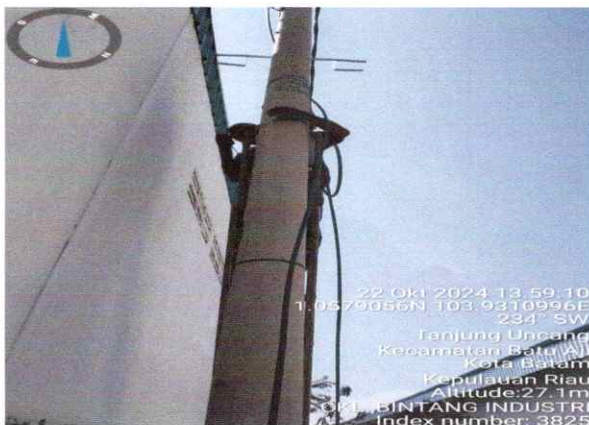
SLEKAN FO



GALVANIS NAIKTURUN KABEL FO



ODP DAN SUB ODP



PEMASANGAN AKSESORIES TIANG



PENARIKAN HDPE

DOKUMENTASI FTTH CKL BINTANG INDUSTRI



PENARIKAN KABEL



HANGER SLEKAN



PENARIKAN KABEL FO



ODP TERMINASI

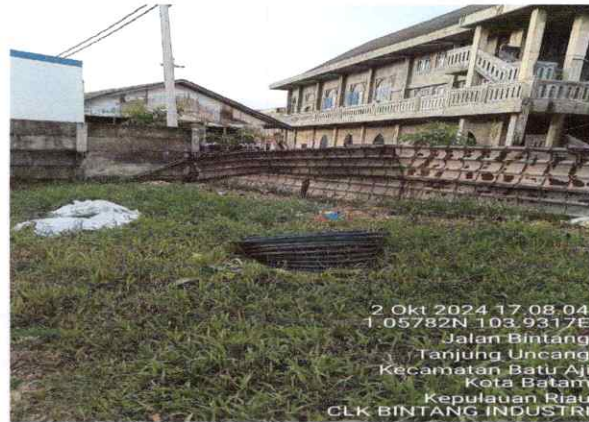


PENARIKAN HDPE

DOKUMENTASI FTTH CKL BINTANG INDUSTRI



PENIMBUNAN GALIAN



GALIAN TANAH

PENARIKAN KABEL



PENARIKAN KABEL

PENARIKAN KABEL

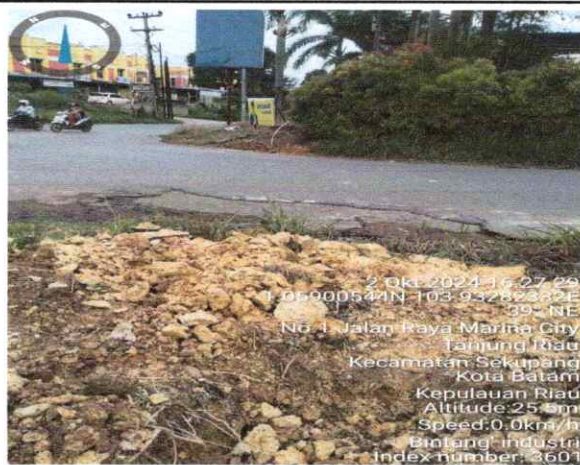
DOKUMENTASI FTTH CKL BINTANG INDUSTRI



UJI TERIMA



POWER PON DI ODP



FINISHING GALIAN



GALIAN TANAH



ODP1



ODP TERBUKA

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2024-0272
CIP2024-099

Pembangunan jaringan backbone CKL Energy (Kawasan Bintang Industri)

Main asset No.

TE013047

Completed Date

Completed Document

QTY

UOM

Group

Start Dep

Usage

TE-Perangkat Kecil (PRK)

TE-Infrastruktur (INFRA)

TE NO.

User

Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Est Doc No	AMOUNT DEBIT/(CREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
J2024-0272	Pembangunan jaringan backbone CKL Energy (Kawasan Bintang Industri)	11/2/2024	BK-MNK2409/032	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	PUO/24/0177	3,312,000.00	1-Nov-24	BAL/24/0335	240	MTR	Infra	1-Nov-24	10	-	3,312,000.00	TE013048	Brahim
J2024-0272	Pembangunan jaringan backbone CKL Energy (Kawasan Bintang Industri)	11/2/2024	BK-MNK2409/032	Protection Slave FO	PUO/24/0177	8,400.00	1-Nov-24	BAL/24/0335	12	PCS	Infra	1-Nov-24	10	-	8,400.00	TE013048	Brahim
J2024-0272	Pembangunan jaringan backbone CKL Energy (Kawasan Bintang Industri)	11/2/2024	BK-MNK2410/009	SPH 156/2023/08206	PUO/24/0177	515,000.00	1-Nov-24	BAL/24/0335	1	PCS	PRK	1-Nov-24	3	515,000.00	-	TE013049	Brahim
J2024-0272	Pembangunan jaringan backbone CKL Energy (Kawasan Bintang Industri)	11/2/2024	BK-MNK2410/009	Protection Slave FO	PUO/24/0177	8,400.00	1-Nov-24	BAL/24/0335	12	PCS	Infra	1-Nov-24	10	-	8,400.00	TE013048	Brahim
J2024-0272	Pembangunan jaringan backbone CKL Energy (Kawasan Bintang Industri)	11/2/2024	BK-MNK2410/009	Pigtail SC/PC 3M Baru	PUO/24/0177	69,600.00	1-Nov-24	BAL/24/0335	12	PCS	Infra	1-Nov-24	10	-	69,600.00	TE013048	Brahim
J2024-0272	Pembangunan jaringan backbone CKL Energy (Kawasan Bintang Industri)	11/2/2024	BK-MNK2410/009	Splicer 1.38 SC/PC BPU-SH1118/2206067	PUO/24/0177	755,000.00	1-Nov-24	BAL/24/0335	1	PCS	PRK	1-Nov-24	3	755,000.00	-	TE013050	Brahim
J2024-0272	Pembangunan jaringan backbone CKL Energy (Kawasan Bintang Industri)	11/2/2024	BK-MNK2410/009	Cable Pipe Subduct HDPE 40/315	PUO/24/0177	3,608,000.00	1-Nov-24	BAL/24/0335	220	MTR	Infra	1-Nov-24	10	-	3,608,000.00	TE013048	Brahim
J2024-0272	Pembangunan jaringan backbone CKL Energy (Kawasan Bintang Industri)	11/2/2024	BK-MNK2410/023	Stack Support Filling 4	PUO/24/0177	120,000.00	1-Nov-24	BAL/24/0335	1	PCS	Infra	1-Nov-24	10	-	120,000.00	TE013048	Brahim

Prepared By,

Record By


Reviewed & Posted By

User By,




Uji


Aptihasah


Ibrahim
