



PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Telecommunication - Electrical

Komplek Mangsang Permai Blok C No. 182 Kec. Sei Beduk Kota Batam
Telp.: 0778-7499112 Phone: 0812 774 4312 WA: 0851 0304 4312
Email: ptsinarkasiteknologiindonesia@gmail.com

INVOICE NO 022/SKTI-BTM/XII/2024

Kepada Yth Dirut PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Jln Markisa Batamindo Industrial Park Muka Kuning

INVOICE Pekerjaan

Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	144 Core Fiber Optical ODC	2	UNT		0
2	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	408	PCS		0
3	material inventory	Protection Slave FO	696	PCS		0
4	material inventory	Cable Fiber Optic 144	7.800	MTR		0
5	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	7.460	MTR		0
6	material vendor	288 Core Fiber Optical ODC	1	unit	16.000.000	16.000.000
7	material vendor	Join Closure 144 Core	1	pcs	1.200.000	1.200.000
8	material vendor	Material safety slekan	37	pcs	150.000	5.550.000
9	material vendor	Galvanis 2 inch dan Aksesoris	15	btg	320.000	4.800.000
10	material vendor	Material semen + pasir untuk dudukan ODC	3	ls	1.000.000	3.000.000
		Sub Total Material				30.550.000
11	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	7.153	m	24.000	171.672.000
12	jasa	Boring Jalan	307	m	89.300	27.415.100
13	jasa	Penarikan Subduct HDPE	7.460	m	6.400	47.744.000
14	jasa	Penarikan FO 144 Core backhaul	7.800	m	7.000	54.600.000
15	jasa	Installasi pipa galvanis	15	btg	120.000	1.800.000
16	jasa	Splasing/OTDR	552	core	50.000	27.600.000
17	jasa	Pemasangan safety slekan	37	pcs	105.000	3.885.000
18	jasa	Pemasangan Dudukan ODC	3	unit	1.200.000	3.600.000
19	jasa	Pemasangan UC	1	pcs	300.000	300.000
20	jasa	Gambar autocad	1	ls	500.000	500.000
21	jasa	File Documentasi	1	ls	300.000	300.000
22	jasa	Uji Terima	1	ls	2.000.000	2.000.000
23	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	3.000.000	3.000.000
24	jasa	Izin	1	ls	70.000.000	70.000.000
		HANHOLE	4		2.000.000	8.000.000
		Sub Total Jasa				422.416.100
		Grand Total				452.966.100

Batam 06 Desember 2024

PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

NO REKENING=109-001-6901-795

ATAS NAMA= PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA


BANK = MANDIRI KCP BATAM PANBIL


ROMULO Nadeak

Dokumentasi backbone ODC ODESA TU SEAX



HANHOLE ODC

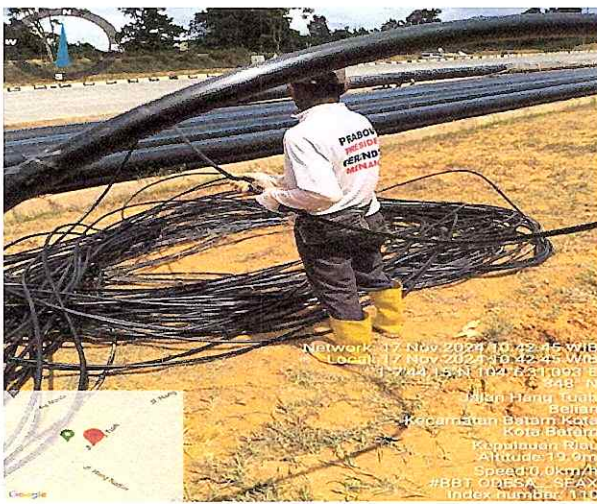

TARIK KABEL



SLAKE KABEL



ODC 144 ODESA




G T 80 CM




GALIAN TITIK BORING




GALIAN TITIK BORING

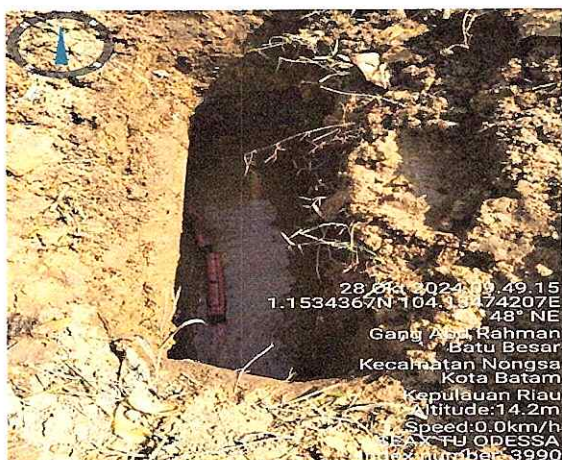


ROZOK

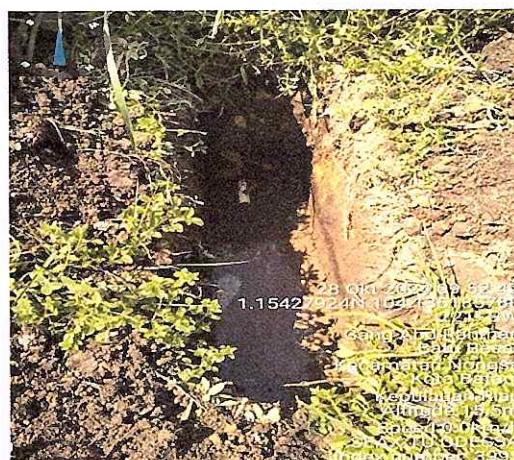

ROZOK

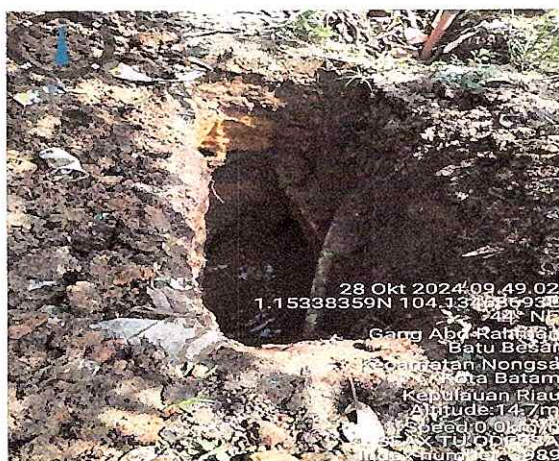

ROZOK

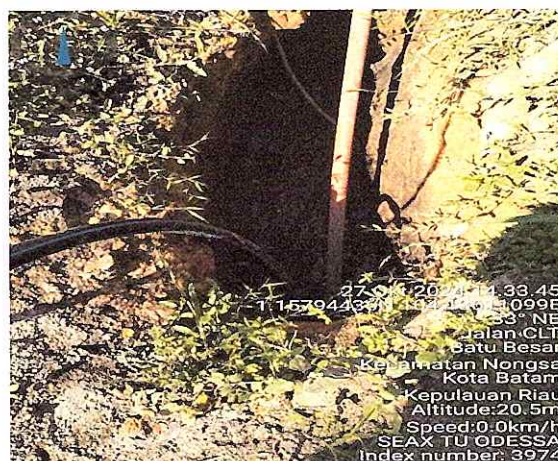

ROZOK



PONDASI ODC



HDPE



BOBOK JALUR KABEL ANTAR ODC



BOBOK JALUR KABEL ANTAR ODC



PEMBUATAN PATOK SLEKAN



PATOK SLEKAN




BORING



BORING



ROZOK

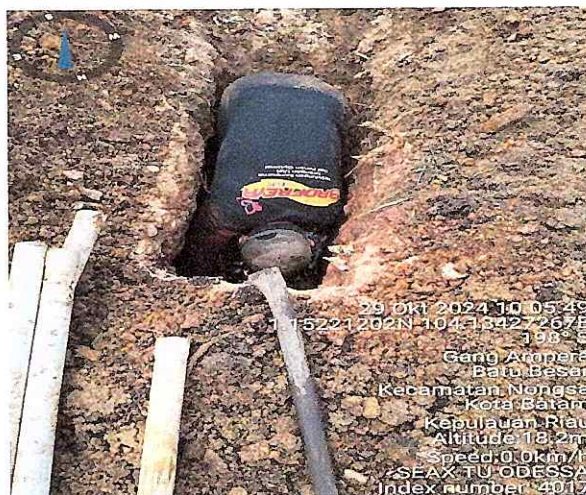

ROZOX




ROZOK



ROZOK



ROZOK BORING

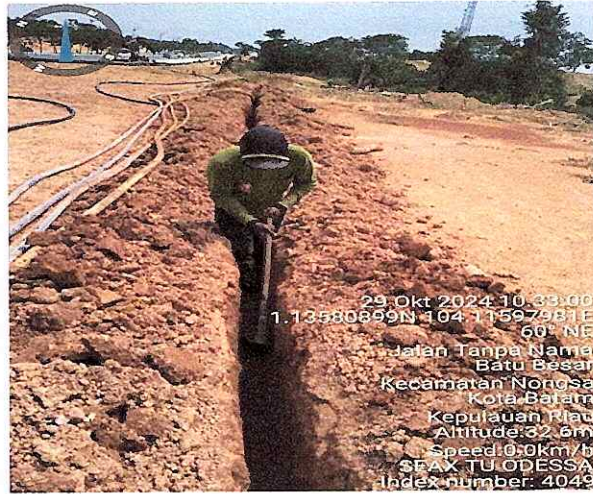

GT




BORING



GT



ROZOK T BEBAN

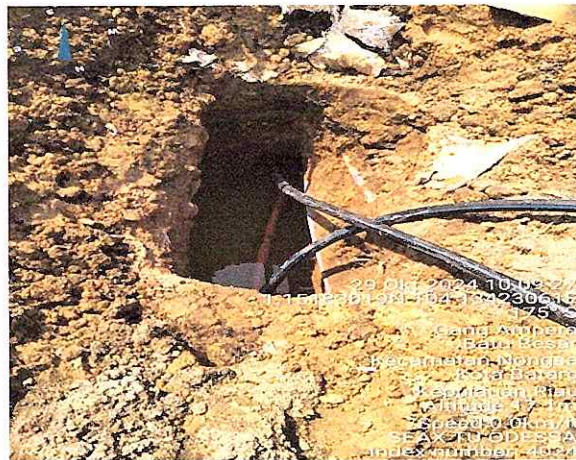

BORINGAN




TRANS



BORINGAN



BORINGAN

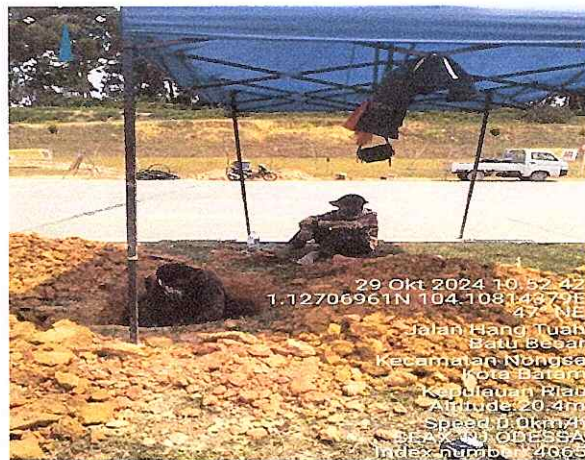

BORINGAN



ODC ISAT TERMINASI TANJUNG BEBAN




BORINGAN




TRANSPORTASI



PASANG ODC ISAT SEAX T BEBAN

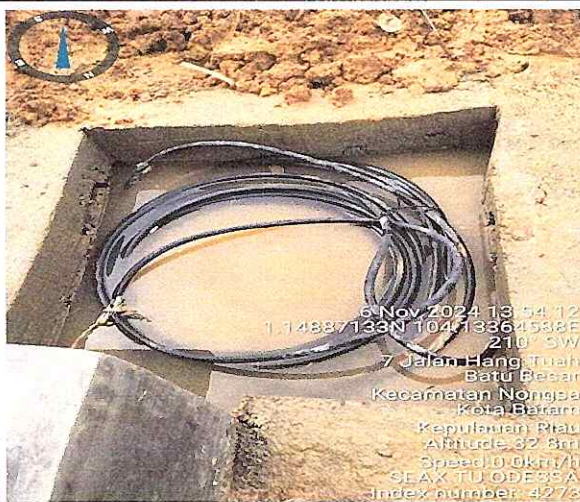

HH TANJUNG BEBAN ISAT

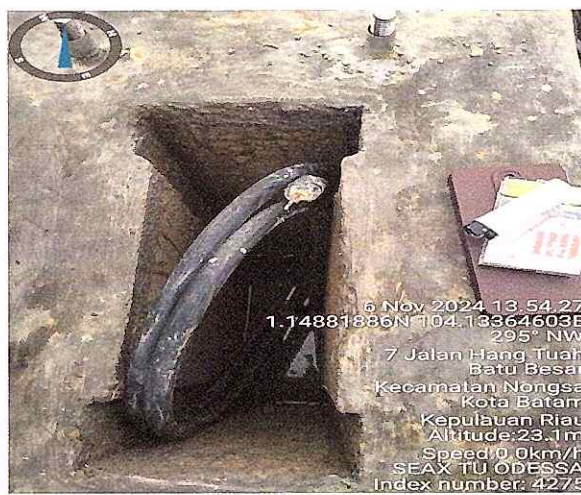

PONDASI ODC T BEBAN ISAT SEAX



ODC SUMMERLAND 288



ODC TERTUTUP SUMMER LAND




TERMINASI ODC



GALIAN TANAH




SPLICING

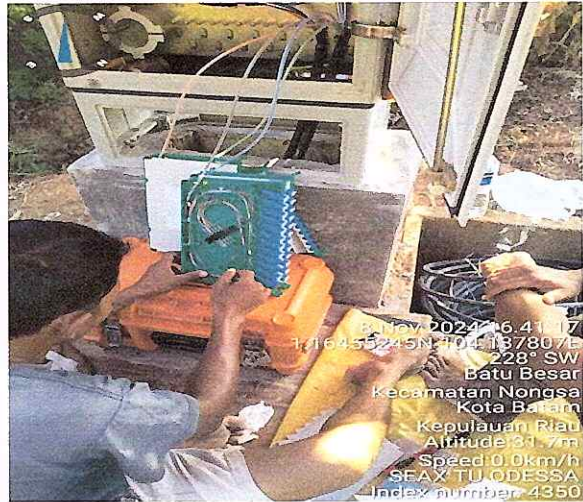

SPLICING



TERMINASI ODC

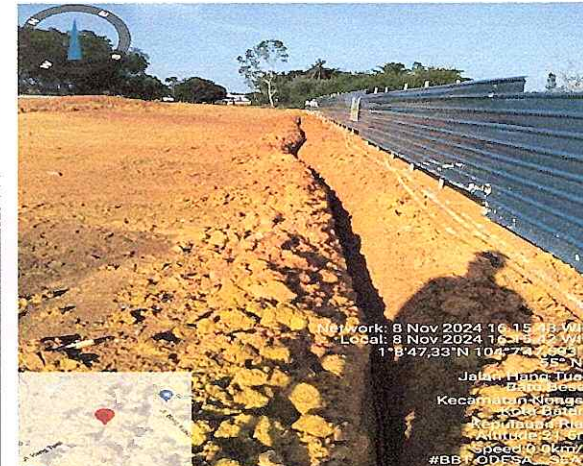


GALIAN TANAH



GALIAN TANAH



PATOK

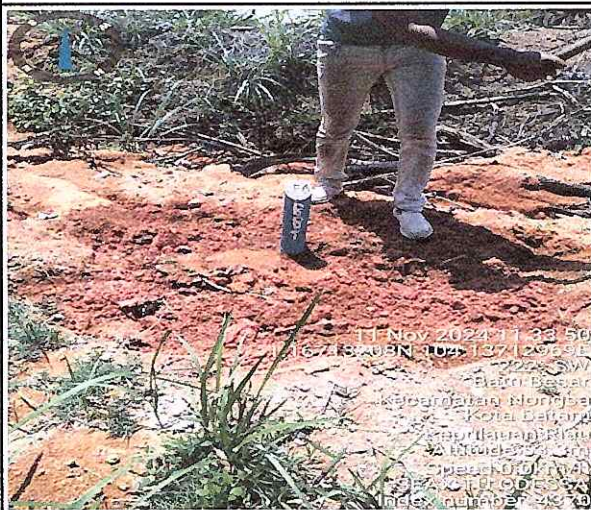

PATOK



GALIAN LAMPU MERAH NONGSA



GALIAN TANAH



GALIAN TANAH



PATOK



PATOK



PATOK




PATOK



PATOK



PATOK

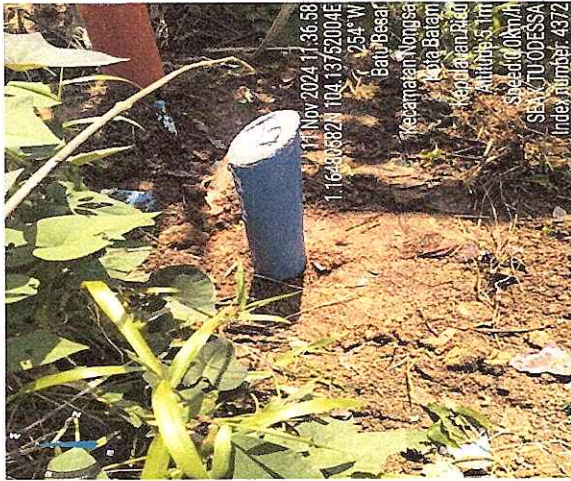

PATOK



PATOK



PATOK



PATOK



PATOK



PATOK



PATOK RUTE KABEL




PATOK RUTE KABEL



GALVANIS DI PARIT



GALVANIS DI PARIT

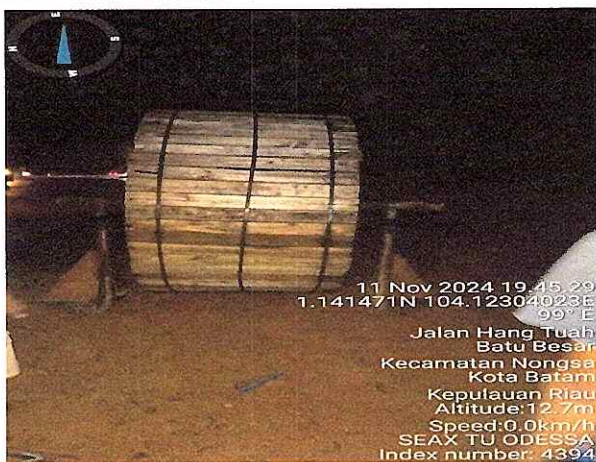

TARIK KABEL



PATOK RUTE




ODC SUMMMER LAND NONGSA



TARIK KABEL



CEK GALIAN BP BATAM

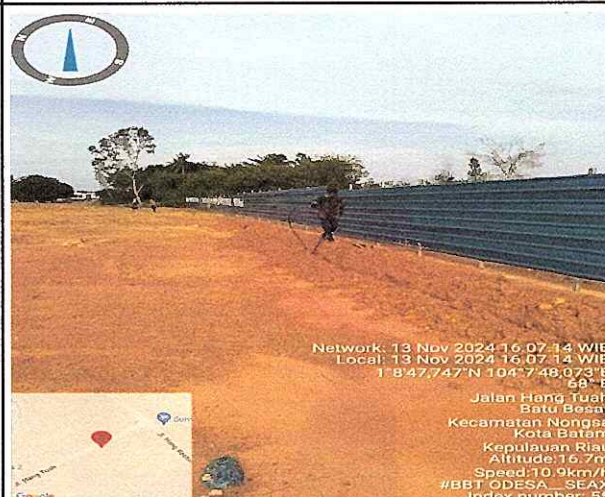


GALIAN JLN HANG TUAH



TARIK KABEL




TARIK KABEL

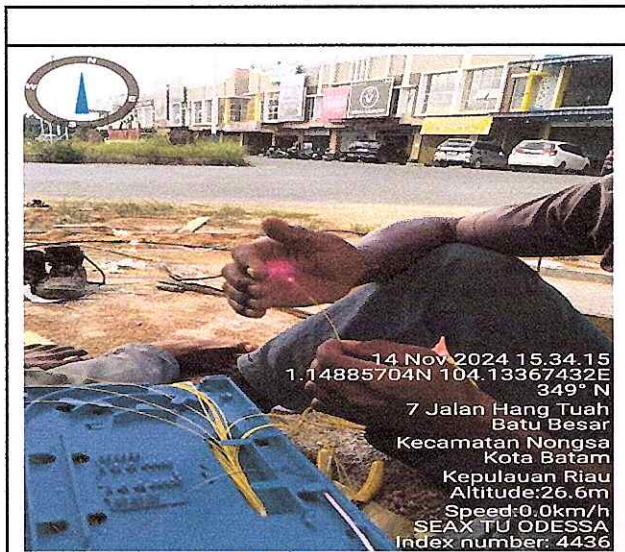

14 Nov 2024 15.34.15
1.14885704N 104.13367432E
349° N
7 Jalan Hang Tuah
Batu Besar
Kecamatan Nongsa
Kota Batam
Kepulauan Riau
Altitude: 26.6m
Speed: 0.0km/h
SEAX TU ODESSA
Index number: 4436

ODC SUMMER LAND

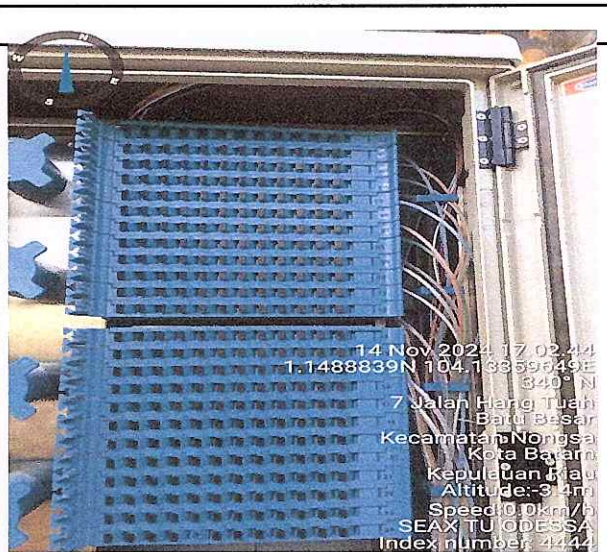

14 Nov 2024 17.02.44
1.1488839N 104.13359549E
340° N
7 Jalan Hang Tuah
Batu Besar
Kecamatan Nongsa
Kota Batam
Kepulauan Riau
Altitude: 3.4m
Speed: 0.0km/h
SEAX TU ODESSA
Index number: 4442

ODC SUMMER LAND NONGSA




14 Nov 2024 16.37.59
1.14881937N 104.13366281E
133° SE
7 Jalan Hang Tuah
Batu Besar
Kecamatan Nongsa
Kota Batam
Kepulauan Riau
Altitude: 18.3m
Speed: 0.0km/h
SEAX TU ODESSA
Index number: 4443



14 Nov 2024 16.37.55
1.14881819N 104.13366157E
181° S
7 Jalan Hang Tuah
Batu Besar
Kecamatan Nongsa
Kota Batam
Kepulauan Riau
Altitude: 14.1m
Speed: 0.0km/h
SEAX TU ODESSA
Index number: 4442

TERMINASI ODC SPLICING

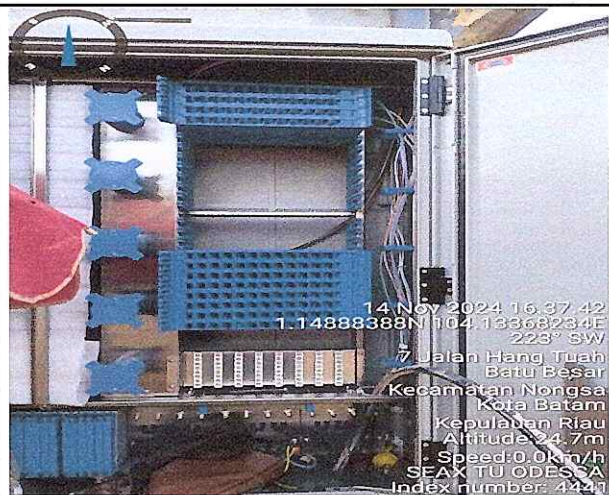

14 Nov 2024 16.37.42
1.14888388N 104.13368234E
228° SW
7 Jalan Hang Tuah
Batu Besar
Kecamatan Nongsa
Kota Batam
Kepulauan Riau
Altitude: 24.7m
Speed: 0.0km/h
SEAX TU ODESSA
Index number: 4441

ODC 288 SUMMER LAND




14 Nov 2024 16.07.55
1.14882866N 104.13365781E
336° NW
7 Jalan Hang Tuah
Batu Besar
Kecamatan Nongsa
Kota Batam
Kepulauan Riau
Altitude: 22.5m
Speed: 0.0km/h
SEAX TU ODESSA
Index number: 4442


ODC 288 SUMMER LAND



TRANSPORTASI

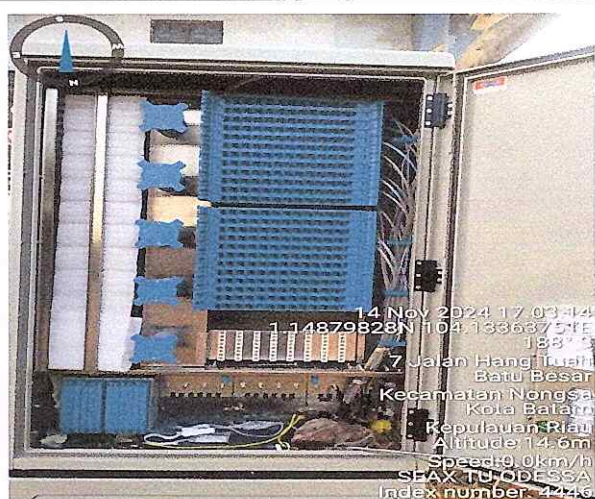


PASANG ODC 288 SUMMER LAND

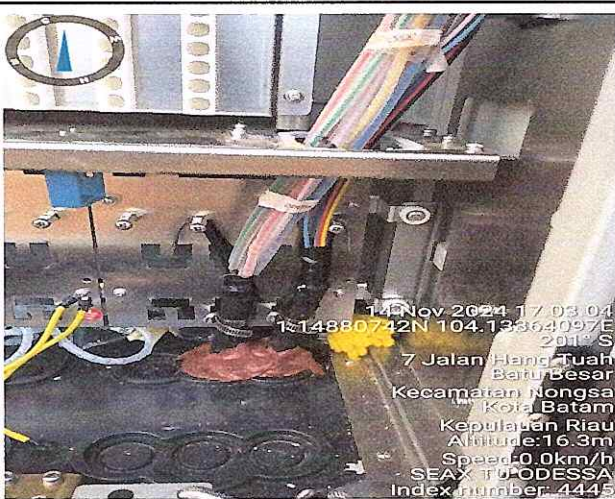


PASANG ODC




PASANG ODC DI ODESA

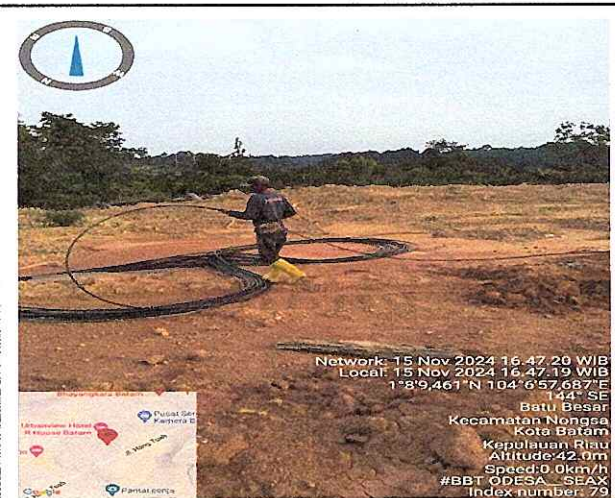

TARIK KABEL

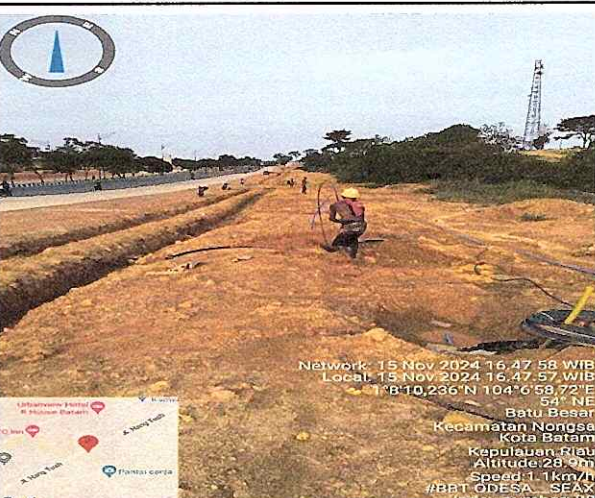


TARIK KABEL

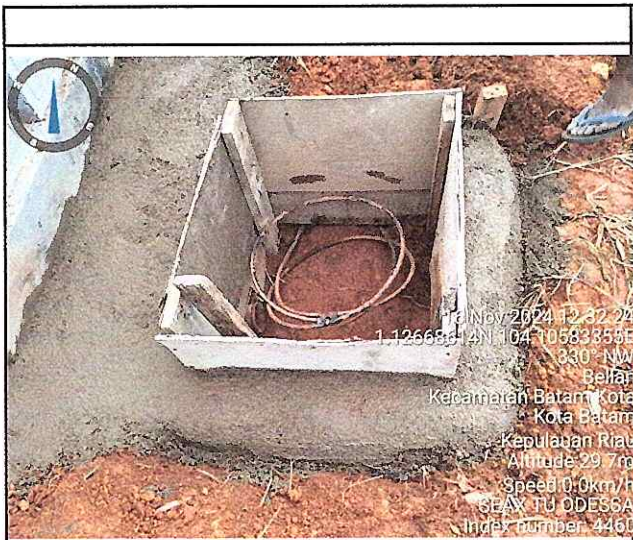

HH




PERTEMUAN KABEL DI CLOSURE

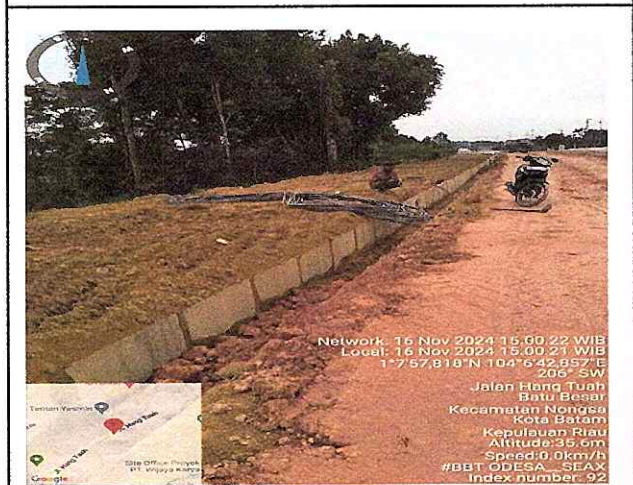

TARIK KABEL



TARIK KABEL

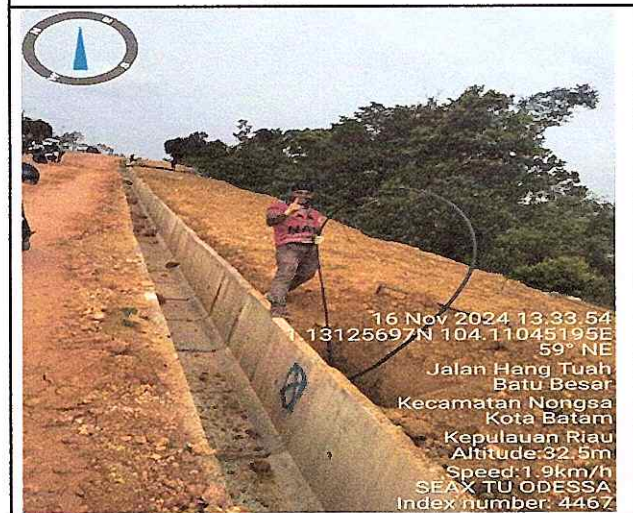

TARIK KABEL



TARIK KABEL

**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/24/0036**

Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX

Pada hari ini, Jumat tanggal 2 Desember 2024 telah dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX sesuai dengan No. PUO/24/0194 tanggal 14 Oktober 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	288 Core Fiber Optical ODC	UNT	1	1	
2	Join Closure 144 Core	UNT	2	1	
3	Material safety slekan	PCS	37	37	
4	Galvanis 2 inch dan Aksesoris	BATANG	17	15	
5	Material semen + pasir untuk dudukan ODC	LS	3	3	
	Jasa Engineering				
1	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	7,153	7,153	
2	Boring Jalan	MTR	307	307	
3	Penarikan Subduct HDPE	MTR	7,460	7,460	
4	Penarikan FO 144 Core backhaul	MTR	7,800	7,800	
5	Instalasi pipa galvanis	BATANG	17	15	
6	Splacing/OTDR	COR	696	552	
7	Pemasangan safety slekan	PCS	37	37	
8	Pemasangan Dudukan ODC	UNT	3	3	
9	Pemasangan UC	PCS	2	1	
10	Gambar autocad	LS	1	1	
11	File Dokumentasi	LS	1	1	
12	Uji Terima	LS	1	1	
13	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	
14	Izin	LS	1	1	
15	Handhole	LS	0	4	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			PT SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA
User,	Mengetahui	Menyetujui,	Vendor,
 Boby Field Operation Officer	 Eddy Naibaho Deputy CORO	 Timbul Nainggolan CORO GM Kepri	 Romulo Nadeak Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**
BAL/24/0370
Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX

Supplier Code : VOB-0120		Purchase Order : PUO/24/0194	
Document Date : 02 December 2024		Page No. : 1	

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	288 Core Fiber Optical ODC	UNT	1.00	1.00	
2.	Join Closure 144 Core	UNT	2.00	2.00	
3.	Material safety slekan	PCS	37.00	37.00	
4.	Galvanis 2 Inch dan Aksesoris	BATANG	17.00	17.00	
5.	Material semen + pasir untuk dudukan ODC	LS	3.00	3.00	
6.	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	7,153.00	7,153.00	
7.	Boring Jalan	MTR	307.00	307.00	
8.	Penarikan Subduct HDPE	MTR	7,460.00	7,460.00	
9.	Penarikan FO 144 Core backhaul	MTR	7,800.00	7,800.00	
10.	Instalasi pipa galvanis	BATANG	17.00	17.00	
11.	Splacing/OTDR	COR	696.00	696.00	
12.	Pemasangan safety slekan	PCS	37.00	37.00	
13.	Pemasangan Dudukan ODC	UNT	3.00	3.00	
14.	Pemasangan UC	PCS	2.00	2.00	
15.	Gambar autocad	LS	1.00	1.00	
16.	File Dokumentasi	LS	1.00	1.00	
17.	Uji Terima	LS	1.00	1.00	
18.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
19.	Izin	LS	1.00	1.00	
20.	Join Closure 144 Core	UNT	(1.00)	(1.00)	

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0370
Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX

Supplier Code	: VOB-0120	Purchase Order	: PUO/24/0194
Document Date	: 02 December 2024	Page No.	: 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
21.	Galvanis 2 inch dan Aksesoris	BATANG	(2.00)	(2.00)	
22.	Instalasi pipa galvanis	BATANG	(2.00)	(2.00)	
23.	Splasing/OTDR	COR	(144.00)	(144.00)	
24.	Pemasangan UC	PCS	(1.00)	(1.00)	
25.	Pemasangan Handhole	BATANG	4.00	4.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.
Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 2 Dec 2024
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
User Mengetahui


BOBY W NADEAK



Eddy Naibaho

SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,
PT
Vendor,


ROMULO NADEAK

Menyetujui,

Robby Susilo
Chief Financial & HR Officer - GM Nasional

IT-GRN.24/000285	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0370

Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX

Supplier Code : VOB-0120		Purchase Order : PUO/24/0194			
Document Date : 02 December 2024		Page No. : 1			
No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	288 Core Fiber Optical ODC	UNT	1.00	1.00	
2.	Join Closure 144 Core	UNT	2.00	2.00	
3.	Material safety slekan	PCS	37.00	37.00	
4.	Galvanis 2 inch dan Aksesoris	BATANG	17.00	17.00	
5.	Material semen + pasir untuk dudukan ODC	LS	3.00	3.00	
6.	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	7,153.00	7,153.00	
7.	Boring Jalan	MTR	307.00	307.00	
8.	Penarikan Subduct HDPE	MTR	7,460.00	7,460.00	
9.	Penarikan FO 144 Core backhaul	MTR	7,800.00	7,800.00	
10.	Instalasi pipa galvanis	BATANG	17.00	17.00	
11.	Splicing/OTDR	COR	666.00	666.00	
12.	Pemasangan safety slekan	PCS	37.00	37.00	
13.	Pemasangan Dudukan ODC	UNT	3.00	3.00	
14.	Pemasangan UC	PCS	2.00	2.00	
15.	Gambar autocad	LS	1.00	1.00	
16.	File Dokumentasi	LS	1.00	1.00	
17.	Uji Terima	LS	1.00	1.00	
18.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
19.	Izin	LS	1.00	1.00	
20.	Join Closure 144 Core	UNT	(1.00)	(1.00)	

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0370

Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 02 December 2024

Purchase Order : PUO/24/0194
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
21.	Galvanis 2 inch dan Aksesoris	BATANG	(2.00)	(2.00)	
22.	Instalasi pipa galvanis	BATANG	(2.00)	(2.00)	
23.	Splading/OTDR	COR	(144.00)	(144.00)	
24.	Pemasangan UC	PCS	(1.00)	(1.00)	
25.	Pemasangan Handhole	BATANG	4.00	4.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 2 Dec 2024
PT. Batam Bintan Telekomunikasi.
User Mengetahui



BOBY W NADEAK



Eddy Nalbaho


SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,
PT

Vendor,




ROMULO NADEAK

Menyetujui,



Robby Susilo

Chief Financial & HR Officer - GM Nasional

IT-GRN.....	
Input & Check By	Postes By
	
Risma Uji Susanti	Amansah

**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(CATK)
BATH/24/0030**

Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX

Pada hari ini:
 Hari/Tanggal : Jumat, 6 Desember 2024
 Pelaksanaan Pekerjaan : Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX
 No. PO : PU/O/24/0194 - tanggal 14 Oktober 2024.
 Harga PO Awal : Rp 454.546.100
 Realisasi PO : Rp 452.966.100

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dari inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT. QUT dan PT SKTL, maka disepakati terdapat pengurangan/pengurangan, atau pekerjaan tersebut yang dilaksanakan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:


No	JENIS PEKERJAAN/BARANG	SATUAN	BOK			REALISASI		JUMLAH NARGA
			VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	
	MATERIAL							
1	233 Core Fiber Optik ODC	UNT	1	16.000.000	16.000.000	1	16.000.000	16.000.000
2	Join Closure 144 Core	UNT	2	1.200.000	2.400.000	2	1.200.000	2.400.000
3	Materai safety siletan	PCS	37	150.000	5.550.000	37	150.000	5.550.000
4	Gelvanik 2 inch dan Aksesoris	BATANG	17	320.000	5.440.000	15	320.000	4.800.000
5	Materai sistem + pelat untuk dukungan ODC	LS	3	1.000.000	3.000.000	3	1.000.000	3.000.000
	Total Material				52.880.000			50.550.000
	Jasa Engineering							
1	Galian tanah beraturan 80 cm	MTR	7.153	24.000	171.672.000	7.153	24.000	171.672.000
2	Boring Jalan	MTR	807	89.300	72.075.100	807	89.300	72.075.100
3	Pemilihan Subduct HDPE	MTR	7.460	6.400	47.744.000	7.460	6.400	47.744.000
4	Pemilihan PO 144 Core backhaul	MTR	7.800	7.000	54.600.000	7.800	7.000	54.600.000
5	Instalasi pipa galian	BATANG	17	120.000	2.040.000	15	120.000	1.800.000
6	Splicing/OTDR	COR	696	50.000	34.800.000	552	50.000	27.600.000
7	Pemasangan safety siletan	PCS	37	105.000	3.885.000	37	105.000	3.885.000
8	Pemasangan Dudukan ODC	UNT	3	1.200.000	3.600.000	3	1.200.000	3.600.000
9	Pemasangan UC	PCS	2	300.000	600.000	2	300.000	600.000
10	Gambar autocad	LS	1	500.000	500.000	1	500.000	500.000
11	File Dokumentasi	LS	1	300.000	300.000	1	300.000	300.000
12	Uji Tension	LS	1	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000	2.000.000
13	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000	3.000.000
14	Libi	LS	1	70.000.000	70.000.000	1	70.000.000	70.000.000
15	Handhole	unit	4	2.000.000	8.000.000	4	2.000.000	8.000.000
	Total Jasa Engineering				422.156.100			422.156.100
	Total Material &				454.546.100			452.966.100

1. Selisih Nilai BATH (1.580.000)

2. % BATH $\frac{1.580.000}{454.546.100} = -0.35\%$

Maka total Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX adalah sebesar Rp. 452.966.100,- (Empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus, rupiah)

Dengan Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai bukti dan mestinya.

PT. Widyatama Bina Telekomunikasi	PT. SINAR KASHI TEKNOLOGI INDONESIA
Menyetujui,	Vendor,
	
Abdulrahman H. H. H. Direktur Utama	Remele Nadek Direktur

ke SEAX

Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Est Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	3			TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
													TE-Perangkat Kechi (PRK)	TE - Perangkat Besar (PRB)	10			
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		208 Core Fiber Optical ODC	PIU/24/0194	16,000,000.00	2-Dec-24	1	UNT	PRB	2-Dec-24	10	-	-	16,000,000.00	-	12/2/2024	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Join Closure 144 Core	PIU/24/0194	2,400,000.00	2-Dec-24	2	UNT	PRK	2-Dec-24	3	2,400,000.00	-	-	-	TE013079	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Material safety sediaan	PIU/24/0194	5,550,000.00	2-Dec-24	37	PCS	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	5,550,000.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Galvanis 2 inch dan Aluminium	PIU/24/0194	5,440,000.00	2-Dec-24	17	BATAN G	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	5,440,000.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Material semen + pasir untuk dusukan ODC	PIU/24/0194	3,000,000.00	2-Dec-24	3	LS	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	3,000,000.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Galian tanah kedalaman 80 cm	PIU/24/0194	171,672,000.00	2-Dec-24	7153	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	171,672,000.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Boring Jalan	PIU/24/0194	27,415,100.00	2-Dec-24	307	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	27,415,100.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Panarikan Subduct MOPE	PIU/24/0194	47,744,000.00	2-Dec-24	7460	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	47,744,000.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Pemilihan FO 144 Core backhaul	PIU/24/0194	54,600,000.00	2-Dec-24	7500	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	54,600,000.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Instalasi pipa galvanis	PIU/24/0194	2,040,000.00	2-Dec-24	17	BATAN G	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	2,040,000.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Splicing OTDR	PIU/24/0194	34,800,000.00	2-Dec-24	696	COR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	34,800,000.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Pemasangan safety sediaan	PIU/24/0194	3,885,000.00	2-Dec-24	37	PCS	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	3,885,000.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Pemasangan Dusukan ODC	PIU/24/0194	3,600,000.00	2-Dec-24	3	UNT	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	3,600,000.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Pemasangan UC	PIU/24/0194	600,000.00	2-Dec-24	2	PCS	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	600,000.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Gambar autocad	PIU/24/0194	500,000.00	2-Dec-24	1	LS	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	500,000.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		File Documentasi	PIU/24/0194	300,000.00	2-Dec-24	1	LS	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	300,000.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Uji Teknis	PIU/24/0194	2,000,000.00	2-Dec-24	1	LS	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	2,000,000.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Transportasi / Mobilisasi	PIU/24/0194	3,000,000.00	2-Dec-24	1	LS	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	3,000,000.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Izin	PIU/24/0194	70,000,000.00	2-Dec-24	1	LS	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	70,000,000.00	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Join Closure 144 Core	PIU/24/0194	(1,200,000.00)	2-Dec-24	-1	UNT	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	(1,200,000.00)	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Galvanis 2 inch dan Aksesoris	PIU/24/0194	(640,000.00)	2-Dec-24	-2	BATAN G	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	(640,000.00)	TE013077	Boby W
J2024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024		Instalasi pipa galvanis	PIU/24/0194	(240,000.00)	2-Dec-24	-2	BATAN G	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	-	(240,000.00)	TE013077	Boby W

Jab. No. / Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Date	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Perangkat Besar (PRB)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2410/018	Splicing/OTDR	PUO/24/0194	(7,200,000.00)	2-Dec-24	BA/24/0370	-144	COR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	(7,200,000.00)	TE013077	Boby W
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2410/018	Pemasangan UC	PUO/24/0194	(300,000.00)	2-Dec-24	BA/24/0370	-1	PCS	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	(300,000.00)	TE013077	Boby W
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2410/018	Pemasangan Handhole	PUO/24/0194	8,000,000.00	2-Dec-24	BA/24/0370	4	BATAN G	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	8,000,000.00	TE013077	Boby W
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2410/018	144 Core Fiber Optical ODC	PUO/24/0194	7,900,000.00	2-Dec-24	BA/24/0370	1	Unit	PRK	2-Dec-24	3	7,900,000.00	-	-	TE013080	Boby W
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2410/022	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	PUO/24/0194	9,840,000.00	2-Dec-24	BA/24/0370	600	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	9,840,000.00	TE013077	Boby W
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2410/022	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	PUO/24/0194	16,400,000.00	2-Dec-24	BA/24/0370	1000	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	16,400,000.00	TE013077	Boby W
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2410/024	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	PUO/24/0194	32,800,000.00	2-Dec-24	BA/24/0370	2000	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	32,800,000.00	TE013077	Boby W
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2410/031	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	PUO/24/0194	16,400,000.00	2-Dec-24	BA/24/0370	1000	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	16,400,000.00	TE013077	Boby W
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2410/032	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	PUO/24/0194	6,560,000.00	2-Dec-24	BA/24/0370	400	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	6,560,000.00	TE013077	Boby W
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2410/033	Cable Fiber Optic 144 Duct G652D	PUO/24/0194	90,000,000.00	2-Dec-24	BA/24/0370	3000	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	90,000,000.00	TE013077	Boby W
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2410/033	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	PUO/24/0194	13,120,000.00	2-Dec-24	BA/24/0370	800	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	13,120,000.00	TE013077	Boby W
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2410/033	Protection Slave FO	PUO/24/0194	696,000.00	2-Dec-24	BA/24/0370	696	PCS	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	696,000.00	TE013077	Boby W
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2410/033	Fiber SC/PC SM Biru	PUO/24/0194	2,366,400.00	2-Dec-24	BA/24/0370	408	PCS	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	2,366,400.00	TE013077	Boby W
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2411/007	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	PUO/24/0194	16,400,000.00	2-Dec-24	BA/24/0370	1000	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	16,400,000.00	TE013077	Boby W
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2411/011	Cable Fiber Optic 144 Duct G652D	PUO/24/0194	90,000,000.00	2-Dec-24	BA/24/0370	3000	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	90,000,000.00	TE013077	Boby W
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2411/015	Cable Fiber Optic 144 Duct G652D	PUO/24/0194	54,000,000.00	2-Dec-24	BA/24/0370	1800	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	54,000,000.00	TE013077	Boby W
12024-0364	Pembangunan Backhaul ODC ODESSA ke SEAX	12/2/2024	BK-MNK2411/015	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	PUO/24/0194	9,840,000.00	2-Dec-24	BA/24/0370	600	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	9,840,000.00	TE013077	Boby W

Prepared By,

Record BY

Reviewed/Posted By

User By






Uti

Adriansyah
