



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

Kepada Yth : PROCURMENT
Perusahaan : PT.Batam Bintang Telekomunikasi
Alamat : Jln Markisa No.1 Mukakuning Batamindo
ttn : Ibu Ferawaty Marpaung

Invoice No : 0035/ INV/CI/II/2024
PO No : PUO/24/0016
Tgl PO : 25 Januari 24

Hal: Pembangunan jaringan backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda Kepri

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
		material				
1	material vendor	Kabel Duct 6 core	380	MTR	12,500	4,750,000
2	material vendor	Semen dan pasir	1	LS	500,000	500,000
3	material vendor	Pipa Galvanis 2 inch	2	BTG	400,000	800,000
						6,050,000
		Jasa				
1	Jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	380	MTR	24,000	9,120,000
2	Jasa	Boring Jalan	30	MTR	90,000	2,700,000
3	Jasa	Penarikan Subduct HDPE	360	MTR	8,000	2,880,000
4	Jasa	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	UNT	450,000	450,000
5	Jasa	installasi pipa galvanis 2 inch	2	BTG	200,000	400,000
6	Jasa	bobok lantai semen dan perbaikan kembali	5	MTR	150,000	750,000
7	Jasa	Penarikan FO 6 core	380	MTR	8,000	3,040,000
8	Jasa	Splasing dan otdr	4	COR	50,000	200,000
9	Jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	LS	1,410,000	1,410,000
10	Jasa	Izin Galian BP Batam	1	LS	2,000,000	2,000,000
						22,950,000
Grand Total						29,000,000

Terbilang : Dua puluh sembilan juta rupiah

Kami mohon di bayarkan melalui rekening Giro BCA
A/C : 326.239.5500 AN CV CITRA INDOTAMA

Batam, 12 Februari 2024
CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG
Direktur

A. Rincian Biaya

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Galian tanah kedalaman 80 cm	29,000	380	m	N/A	1	11,020,000
2.	Boring Jalan	90,000	30	m	N/A	1	2,700,000
3.	Penarikan Subduct HDPE	12,000	360	m	N/A	1	4,320,000
4.	Pemasangan ODP dan Terminasi	500,000	1	unit	N/A	1	500,000
5.	installasi pipa galvanis 2 inch	500,000	2	btg	N/A	1	1,000,000
6.	bobok lantai semen dan perbaikan kembali	150,000	5	m	N/A	1	750,000
7.	Penarikan FO 6 core	10,000	380	m	N/A	1	3,800,000
8.	Splacing dan otdr	50,000	4	core	N/A	1	200,000
9.	Transportasi / Mobilisasi	1,000,000	1	ls	N/A	1	1,000,000
10.	Izin Galian BP Batam	3,500,000	1	ls	N/A	1	3,500,000
						TOTAL	28,790,000

Kode	JUST/24/0026
Judul	Pembangunan jaringan backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda Kepri
Tanggal Pengajuan	22 Jan 2024

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1. Barang		5,100,000
2. Jasa		28,790,000
Total		33,890,000

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	15,000	360	MTR	5,400,000
2.	Protection Slave FO	1,000	4	PCS	4,000
3.	Pigtail SC/PC SM Biru	10,000	4	PCS	40,000
4.	Splitter 1:8 SC/PC Biru	550,000	1	PCS	550,000
TOTAL					5,994,000

B. Sumber Anggaran

Anggaran : Telecom Equipment (# BMN21-0001)

Kontrol Anggaran

Sub Anggaran		Rencana Pemakaian		Kontrol Anggaran	
Fiber to The Home (# BCM21-0014)		Rp. 33,890,000			DESMIATI MARUAO Accounting Manager DateTime : 2024-01-23 14:32:03
Sisa Budget		19,116,549,230			
Diajukan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,	Disetujui oleh,	Disetujui oleh,	
					
IBRAHIM Senior Field Operation Officer DateTime : 2024-01-23 13:02:14	EDDY NAIRAHQ Deputy CORO DateTime : 2024-01-23 13:10:27	TIMBUL NAINGGOLAN Chief Operational & Regulatory Officer DateTime : 2024-01-23 14:17:14	ROBBY SUSILO Chief Financial & HR Officer DateTime : 2024-01-23 14:18:57	ABDULLAH PRATAMA HABIBIE Direktur Operasional DateTime : 2024-01-23 14:00:08	



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

No: 05 /SPH/CI/ I/2024

Yth, PROCUREMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

Pembangunan jaringan backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda Kepri

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	360	MTR	-	-
2	material inventory	Protection Slave FO	4	PCS	-	-
3	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	4	PCS	-	-
4	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	1	PCS	-	-
5	material vendor	Kabel Duct 6 core	380	m	12.500	4.750.000
6	material vendor	Semen dan pasir	1	ls	500.000	500.000
7	material vendor	Pipa Galvanis 2 inch	2	btg	400.000	800.000
		Total Material				6.050.000
8	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	380	m	24.000	9.120.000
9	jasa	Boring Jalan	30	m	90.000	2.700.000
10	jasa	Penarikan Subduct HDPE	360	m	8.000	2.880.000
11	jasa	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	unit	450.000	450.000
12	jasa	installasi pipa galvanis 2 inch	2	btg	200.000	400.000
13	jasa	bobok lantai semen dan perbaikan kembali	5	m	150.000	750.000
14	jasa	Penarikan FO 6 core	380	m	8.000	3.040.000
15	jasa	Splasing dan otdr	4	core	50.000	200.000
16	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	1.410.000	1.410.000
17	jasa	Izin Galian BP Batam	1	ls	2.000.000	2.000.000
		Total Jasa				22.950.000
TOTAL Material dan Jasa						29.000.000
<i>Terbilang, Dua puluh sembilan juta rupiah</i>						

Note:

1. Lama pekerjaan: 14 Hari kerja
2. Pembayaran : max 30 hari setelah Invoice
3. Garansi 2 bulan

Batam, 25 januari 2024
CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG
Direktur

Pembangunan jaringan backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda Kepri

CD cia Dongan <indotama_cia@yahoo.co.id>
To: Ferawaty Marpaung Thu 1/25/2024 9:44 AM
Cc: Lia Martha Giyan Safitri
SPH Final Pembangunan jari...
600 KB

Dengan Hormat,

Pagi Bu Fera. Terlampir Revisi SPH Final Pembangunan Backhaul RS
Bhayangkara Polda Kepri.

Terimakasih,

Charles

Pada Rabu, 24 Januari 2024 pukul 08:55:36 WIB, Ferawaty Marpaung
<era@bbt.co.id> menulis:



PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Telecommunication - Elektrical

Komplek Mangsang Permai Blok C No. 182 Kec. Sei Beduk Kota Batam

Telp.: 0778-7499112 Phone: 0812 774 4312 WA: 0851 0304 4312

Email: ptsinarkasiteknologiindonesia@gmail.com

QUOTATION 002/SKTI-BTM/I/2024

KepadaYth Dirut PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Jln Markisa Batamindo Industrial Park Muka Kuning

Pekerjaan

Pembangunan jaringan backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda Kepri

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	360	MTR	-	-
2	material inventory	Protection Slave FO	4	PCS	-	-
3	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	4	PCS	-	-
4	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	1	PCS	-	-
5	material vendor	Kabel Duct 6 core	380	m	12.000	4.560.000
6	material vendor	Semen dan pasir	1	ls	1.100.000	1.100.000
7	material vendor	Pipa Galvanis 2 inch	2	btg	380.000	760.000
		Total Material				6.420.000
8	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	380	m	28.000	10.640.000
9	jasa	Boring Jalan	30	m	85.000	2.550.000
10	jasa	Penarikan Subduct HDPE	360	m	10.000	3.600.000
11	jasa	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	unit	350.000	350.000
12	jasa	installasi pipa galvanis 2 inch	2	btg	120.000	240.000
13	jasa	bobok lantai semen dan perbaikan kembali	5	m	150.000	750.000
14	jasa	Penarikan FO 6 core	380	m	10.000	3.800.000
15	jasa	Splasing dan otdr	4	core	50.000	200.000
16	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	0	0
17	jasa	Izin Galian BP Batam	1	ls	2.000.000	2.000.000
		Total Jasa				24.130.000
Grand Total						30.550.000

Note:

1. Lama pekerjaan: 12 Hari Kerja
2. Pembayaran : 100% Setelah Pekerjaan Selesai
3. Garansi jika ada 90 Hari

Batam 24 Januari 2023

PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Pembangunan jaringan backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda
Kepri



ptsinarkasih teknologiindonesia

<ptsinarkasiteknologiindonesia@gmail.com>

To: Ferawaty Marpaung; Ibrahim

Thu 1/25/2024 1:25 PM

Cc: Lia Martha Giyan Safitri

NEGosiasi RS. Bhayangkara B...
475 KB

NEGosiasi RS. Bhayangkara B...
172 KB

2 attachments (547 KB)

Save all to OneDrive - Persada Nusantara Telekomunikasi

Download all

Terlampir harga negoisasinya Bapak/Ibu

Romulo N



PT. MIRACLE AGUNG SENTOSA

TELECOMMUNICATION & ELECTRICAL

Alamat, Perumahan Benih Raya Blok C6 no.6 Tanjung Riau ,Sekupang, Kota Batam , Kepulauan Riau

Telepon . 081276886164, Email.ptmiracleagungsentosa.com

Batam, 25 Januari 2024

Nomor : 04/MAS-01/2024

Kepada Yth;

Manager Procurement

PT Batam Bintang Telekomunikasi

Up.Ibu Ferawati Marpaung

Perihal: **Pembangunan Jaringan Backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda Kepri**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Permintaan Penawaran Harga dari PT Batam Bintang Telekomunikasi, untuk Pekerjaan Pembangunan jaringan backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda Kepri.

Berikut terlampir Bill Of Quantity Penawaran dari perusahaan kami.

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	360	MTR	-	-
2	material inventory	Protection Slave FO	4	PCS	-	-
3	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	4	PCS	-	-
4	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	1	PCS	-	-
5	material vendor	Kabel Duct 6 core	380	m	14,000	5,320,000
6	material vendor	Semen dan pasir	1	ls	500,000	500,000
7	material vendor	Pipa Galvanis 2 inch	2	btg	300,000	600,000
Total Material						6,420,000
8	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	380	m	28,000	10,640,000
9	jasa	Boring Jalan	30	m	100,000	3,000,000
10	jasa	Penarikan Subduct HDPE	360	m	9,000	3,240,000
11	jasa	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	unit	250,000	250,000
12	jasa	installasi pipa galvanis 2 inch	2	btg	300,000	600,000
13	jasa	bobok lantai semen dan perbaikan kembali	5	m	150,000	750,000
14	jasa	Penarikan FO 6 core	380	m	9,000	3,420,000
15	jasa	Splacing dan otdr	4	core	45,000	180,000
16	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	1,000,000	1,000,000
17	jasa	Izin Galian BP Batam	1	ls	3,500,000	3,500,000
Total Jasa						26,580,000
Total Material & Jasa						33,000,000

Note: - Lama pekerjaan : 14 hari setelah terima PO

- Garansi : 90 hari

Demikian kami sampaikan dan terimakasih atas kerjasamanya.

Hormat kami

DAVID NADEAK

DIREKTUR

SPH Pembangunan jaringan backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda Kepri

PT Miracle Agung Sentosa
<ptmiracleagungsentosa@gmail.com>

To: Ferawaty Marpaung

Thu 1/25/2024 1:16 PM

Cc: Lia Martha Giyan Safitri

SPH Pembangunan jaringan ...
345 KB

Dear bu Fera,
Berikut kami kirimkan SPH Pembangunan jaringan backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda Kepri.

Terimakasih

Best Regard

David Nadeak

Judul	Pembangunan jaringan backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda Kepri
Tanggal	25 Jan 2024
Kode Referensi	JUST/24/0026

Vendor :CITRA INDOTAMA, CV

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Kabel Duct 6 core	380	m	10,000	4,750,000	4,750,000	3,800,000
2	Semen dan pasir	1	ls	500,000	500,000	500,000	500,000
3	Pipa Galvanis 2 inch	2	btg	400,000	800,000	800,000	800,000
4	Galian tanah kedalaman 80 cm	380	m	29,000	9,120,000	9,120,000	11,020,000
5	Boring Jalan	30	m	90,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000
6	Penarikan Subduct HDPE	360	m	12,000	2,880,000	2,880,000	4,320,000
7	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	unit	500,000	450,000	450,000	500,000
8	installasi pipa galvanis 2 inch	2	btg	500,000	400,000	400,000	1,000,000
9	bobok lantai semen dan perbaikan kembali	5	m	150,000	750,000	750,000	750,000
10	Penarikan FO 6 core	380	m	10,000	3,040,000	3,040,000	3,800,000
11	Splacing dan otdr	4	core	50,000	200,000	200,000	200,000
12	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	1,000,000	1,800,000	1,410,000	1,000,000
13	Izin Galian BP Batam	1	ls	3,500,000	2,500,000	2,000,000	3,500,000
Subtotal					29,890,000	29,000,000	33,890,000

Informasi Tambahan :	1. Lama pekerjaan: 14 Hari kerja
- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 14 hari	2. Pembayaran : max 30 hari setelah Invoice
- Termin Pembayaran :	3. Garansi 2 bulan
☐ DP 0 %	
☒ Termin-1 100 %	Garansi : 60 hari
☐ Termin-2 0 %	
☐ Retensi 0 %	

Vendor :SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Kabel Duct 6 core	380	m	10,000	4,560,000	4,560,000	3,800,000
2	Semen dan pasir	1	ls	500,000	1,100,000	1,100,000	500,000
3	Pipa Galvanis 2 inch	2	btg	400,000	760,000	760,000	800,000
4	Galian tanah kedalaman 80 cm	380	m	29,000	10,640,000	10,640,000	11,020,000
5	Boring Jalan	30	m	90,000	2,550,000	2,550,000	2,700,000

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
BERITA ACARA PENETAPAN VENDOR
 Kode : BAPV/24/0014

6	Penarikan Subduct HDPE	360	m	12,000	3,600,000	3,600,000	4,320,000
7	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	unit	500,000	350,000	350,000	500,000
8	installasi pipa galvanis 2 inch	2	btg	500,000	240,000	240,000	1,000,000
9	bobok lantai semen dan perbaikan kembali	5	m	150,000	750,000	750,000	750,000
10	Penarikan FO 6 core	380	m	10,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000
11	Splacing dan otdr	4	core	50,000	200,000	200,000	200,000
12	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
13	Izin Galian BP Batam	1	ls	3,500,000	2,000,000	2,000,000	3,500,000
Subtotal					31,550,000	30,550,000	33,890,000

Informasi Tambahan :
 - Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 12 hari
 - Termin Pembayaran :
☐ DP 0 %
☒ Termin-1 100 %
☐ Termin-2 0 %
☐ Retensi 0 %

1. Lama pekerjaan: 12 Hari kerja
 2. Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai
 3. Garansi : 90 hari

 Garansi : 90 hari

Vendor :PT MIRACLE AGUNG SENTOSA

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Kabel Duct 6 core	380	m	10,000	5,320,000	5,320,000	3,800,000
2	Semen dan pasir	1	ls	500,000	500,000	500,000	500,000
3	Pipa Galvanis 2 inch	2	btg	400,000	700,000	600,000	800,000
4	Galian tanah kedalaman 80 cm	380	m	29,000	10,640,000	10,640,000	11,020,000
5	Boring Jalan	30	m	90,000	3,000,000	3,000,000	2,700,000
6	Penarikan Subduct HDPE	360	m	12,000	3,600,000	3,240,000	4,320,000
7	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	unit	500,000	350,000	250,000	500,000
8	installasi pipa galvanis 2 inch	2	btg	500,000	700,000	600,000	1,000,000
9	bobok lantai semen dan perbaikan kembali	5	m	150,000	750,000	750,000	750,000
10	Penarikan FO 6 core	380	m	10,000	3,420,000	3,420,000	3,800,000
11	Splacing dan otdr	4	core	50,000	180,000	180,000	200,000
12	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
13	Izin Galian BP Batam	1	ls	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
Subtotal					33,660,000	33,000,000	33,890,000

Informasi Tambahan :
 - Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 14 hari
 - Termin Pembayaran :
☐ DP 0 %
☒ Termin-1 100 %
☐ Termin-2 0 %
☐ Retensi 0 %

1. Lama pekerjaan: 14 Hari kerja
 2. Garansi : 90 hari

 Garansi : 90 hari

Alasan Skip Quotation

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/supplier **CITRA INDOTAMA, CV** dengan vendor id **VDR21-0003** sebagai pelaksana pekerjaan **Pembangunan jaringan backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda Kepri** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 29,000,000**

Alasan penunjukan

- Harga lebih murah
- Lama pekerjaan: 14 Hari kerja
- Pembayaran : max 30 hari setelah Invoice
- Garansi 2 bulan

Catatan Direktur Operasional

Ok

Diajukan oleh,



FERAWATY MARPAUNG
Procurement Officer
DateTime : 2024-01-25 13:43:05

Diperiksa oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-01-25 17:12:49

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2024-01-25 17:41:47

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0016

Supplier Code : VOB-0003	Location Code : KBTM
Order Date : 25 January 2024	Reference : BAPV/24/0014-25 Jan 2024
Expect. Rcpt. Date : 05 February 2024	Shipment Method : FOB Batam
Payment Terms : Max30 Days	Page No. : 1 of 1

SUPPLIER

CITRA INDOTAMA, CV

Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1
Batam BT
Indonesia
TEL: 0778-395 000

DELIVER TO

KANTOR BATAM

PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	Pembangunan jaringan backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda Kepri Material				
1.	Kabel Duct 6 core	380 MTR	12,500.00	-	4,750,000.00
2.	Semen dan pasir	1 LS	500,000.00	-	500,000.00
3.	Pipa Galvanis 2 inch	2 BTG	400,000.00	-	800,000.00
	Jasa				
4.	Galian tanah kedalaman 80 cm	380 MTR	24,000.00	-	9,120,000.00
5.	Boring Jalan	30 MTR	90,000.00	-	2,700,000.00
6.	Penarikan Subduct HDPE	360 MTR	8,000.00	-	2,880,000.00
7.	Pemasangan ODP dan Terminasi	1 UNT	450,000.00	-	450,000.00
8.	installasi pipa galvanis 2 inch	2 BTG	200,000.00	-	400,000.00
9.	bobok lantai semen dan perbaikan kembali	5 MTR	150,000.00	-	750,000.00
10.	Penarikan FO 6 core	380 MTR	8,000.00	-	3,040,000.00
11.	Splasing dan otdr	4 COR	50,000.00	-	200,000.00
12.	Transportasi / Mobilisasi	1 LS	1,410,000.00	-	1,410,000.00
13.	Izin Galian BP Batam	1 LS	2,000,000.00	-	2,000,000.00
	Note:				
	- Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai				
	- Lama pekerjaan: 14 Hari kerja				
	- Garansi : 2 bulan				

 Abdullah Pratama Habibie Authorized Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 29,000,000.00
---	--	--


**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/24/0001**

Pembangunan jaringan backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda Kepri

Pada hari ini, Senin tanggal 12 Februari 2024 telah dilaksanakan Pembangunan jaringan backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda Kepri sesuai dengan No. PUO/24/0016 tanggal 25 Janurari 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			PO	REALISASI	
	Material				
1	Kabel Duct 6 core	MTR	380	380	
2	Semen dan pasir	LS	1	1	
3	Pipa Galvanis 2 inch	BTG	2	2	
	Jasa				
1	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	380	380	
2	Boring Jalan	MTR	30	30	
3	Penarikan Subduct HDPE	MTR	360	360	
4	Pemasangan ODP dan Terminasi	UNT	1	1	
5	installasi pipa galvanis 2 inch	BTG	2	2	
6	bobok lantai semen dan perbaikan kembali	MTR	5	5	
7	Penarikan FO 6 core	MTR	380	380	
8	Splacing dan otdr	COR	4	4	
9	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	
10	Izin Galian BP Batam	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			CV Citra Indotama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Senior FOO	 Eddy Naibaho Deputy CORO	 Timbul Nainggolan Chief Operational & Regulatory	  Daendels Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0028

Pembangunan jaringan backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda Kepri

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 12 February 2024

Purchase Order : PUO/24/0016
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Kabel Duct 6 core	MTR	380.00	380.00	
2.	Semen dan pasir	LS	1.00	1.00	
3.	Pipa Galvanis 2 inch	BATANG	2.00	2.00	
4.	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	380.00	380.00	
5.	Boring Jalan	MTR	30.00	30.00	
6.	Penarikan Subduct HDPE	MTR	360.00	360.00	
7.	Pemasangan ODP dan Terminasi	UNT	1.00	1.00	
8.	installasi pipa galvanis 2 inch	BATANG	2.00	2.00	
9.	bobok lantai semen dan perbaikan kembali	MTR	5.00	5.00	
10.	Penarikan FO 6 core	MTR	380.00	380.00	
11.	Splasing dan otdr	COR	4.00	4.00	
12.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
13.	Izin Galian BP Batam	LS	1.00	1.00	


Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 12 Feb 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui


Ibrahim


Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor,




**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**
BAL/24/0028

Pembangunan jaringan backhaul RS. Bhayangkara Batam Polda Kepri

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 12 February 2024

Purchase Order : PUO/24/0016
Page No. : 2






No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan								
Mengetahui,  Risna Uli Susanti Inventori Menyetujui,  Timbul Nainggolan, General Manager <table><tr><td colspan="2">IT-GRN 24/000025</td></tr><tr><td>Input & Check By</td><td>Posted By</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Risna Uli Susanti</td><td>Desmiati M.</td></tr></table>						IT-GRN 24/000025		Input & Check By	Posted By			Risna Uli Susanti	Desmiati M.
IT-GRN 24/000025													
Input & Check By	Posted By												
													
Risna Uli Susanti	Desmiati M.												

FOTO DOKUMENTASI RS BHAYANGKARA

Picture 1



Picture 2

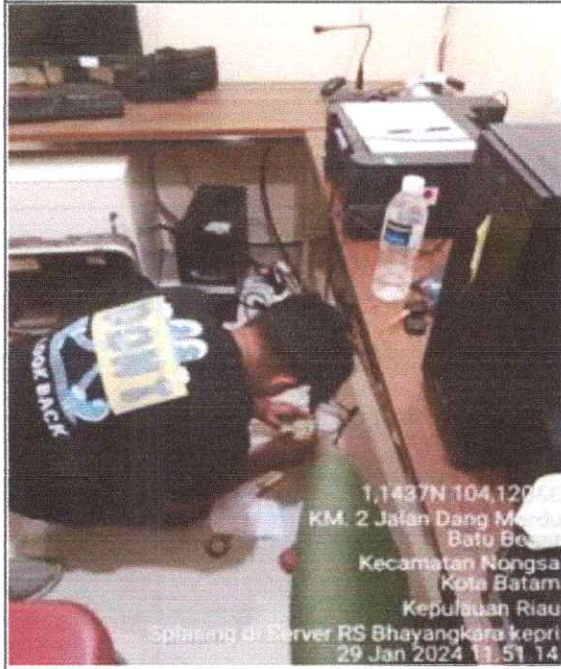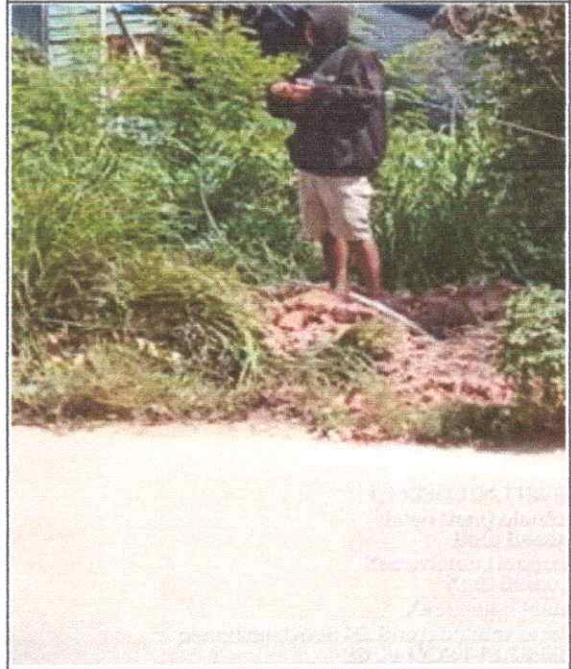

Picture 3



Picture 4


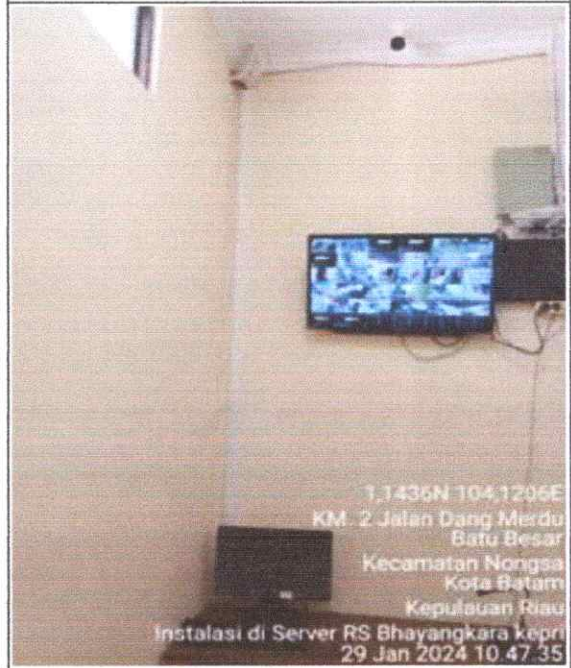


FOTO DOKUMENTASI RS BHAYANGKARA


Picture 1



Picture 2

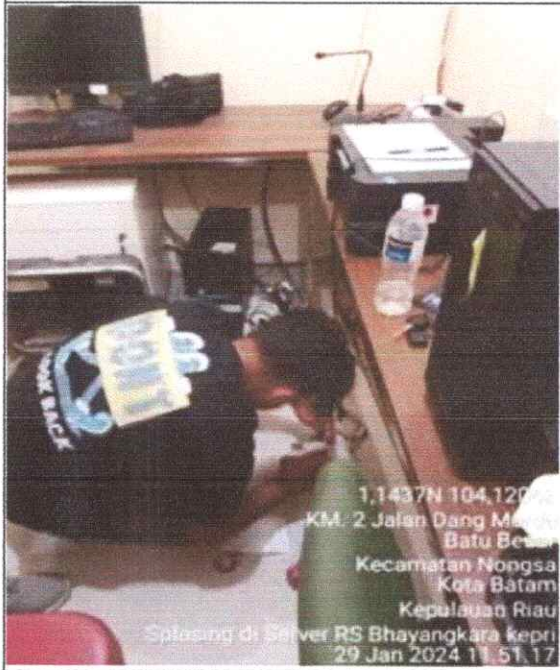

Picture 3

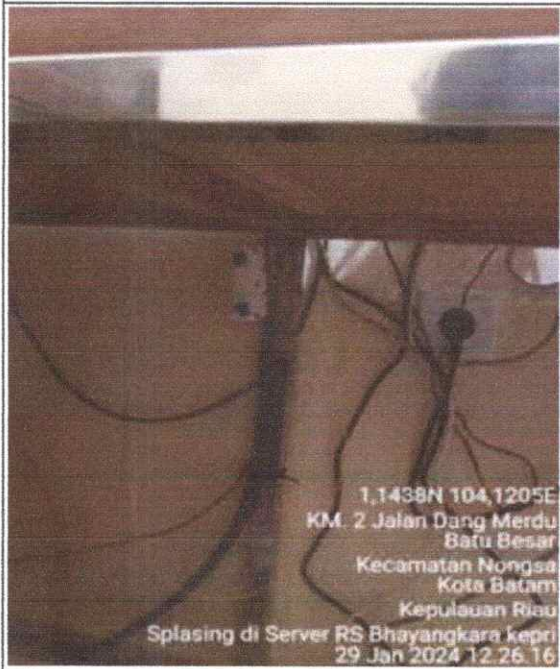

Picture 4



FOTO DOKUMENTASI RS BHAYANGKARA


Picture 1



Picture 2



Picture 3

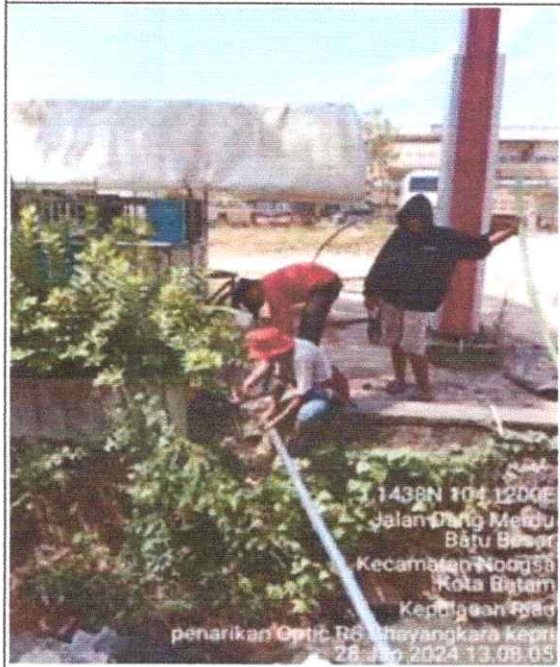

Picture 4



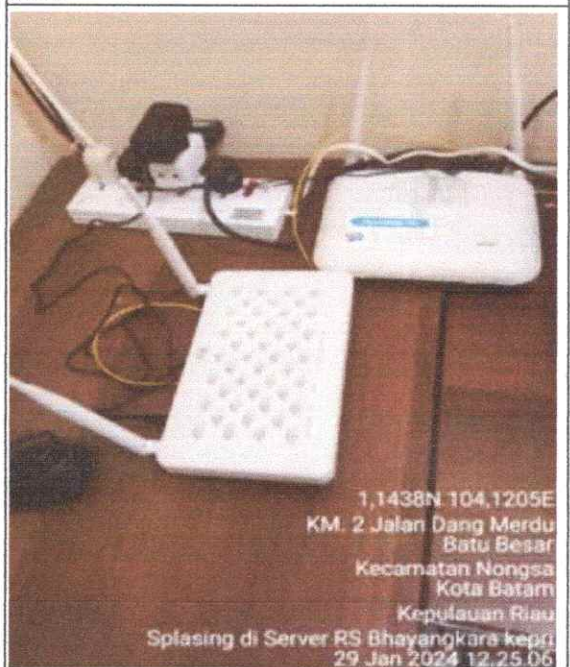


FOTO DOKUMENTASI RS BHAYANGKARA


Picture 1

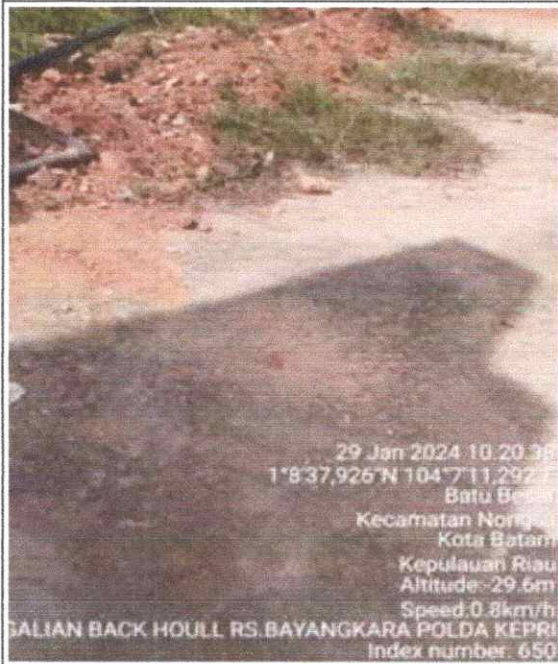

Picture 2

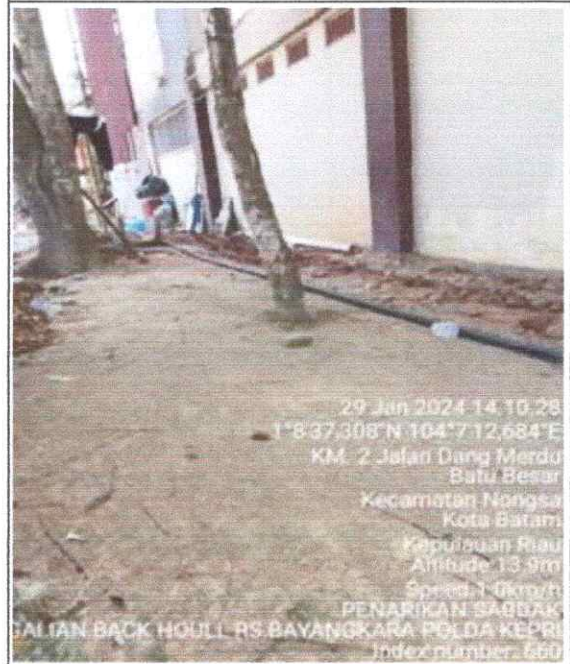

Picture 3

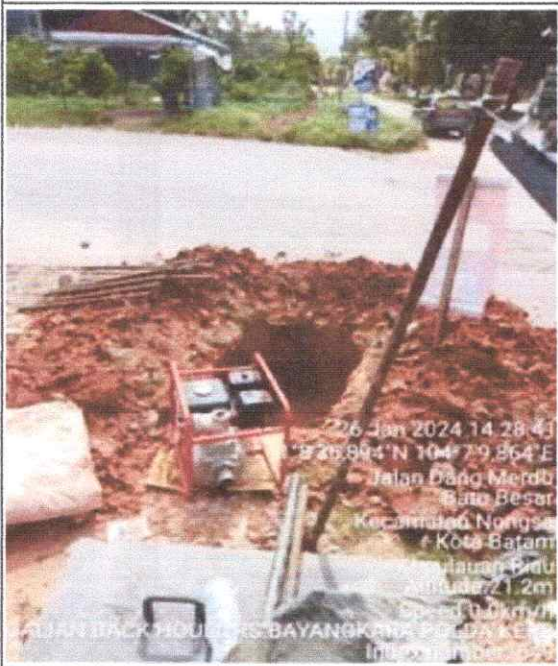

Picture 4



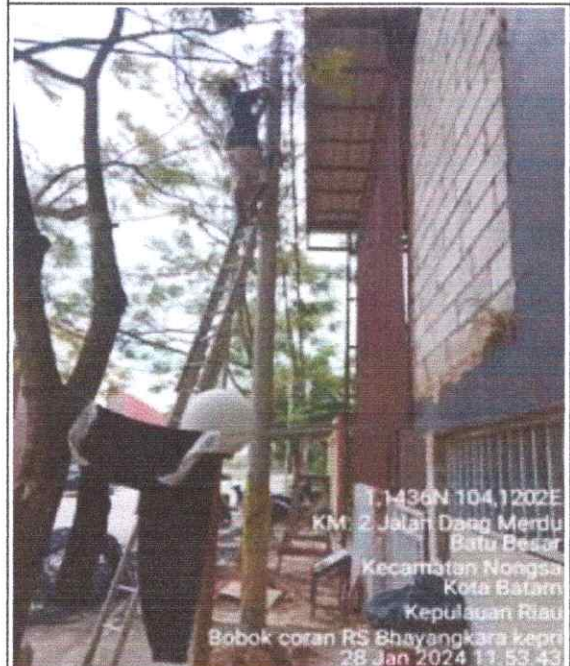


FOTO DOKUMENTASI RS BHAYANGKARA


Picture 1

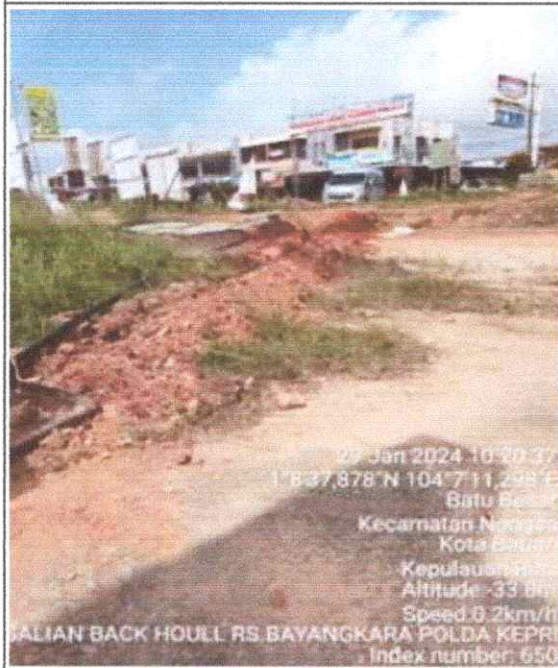

Picture 2

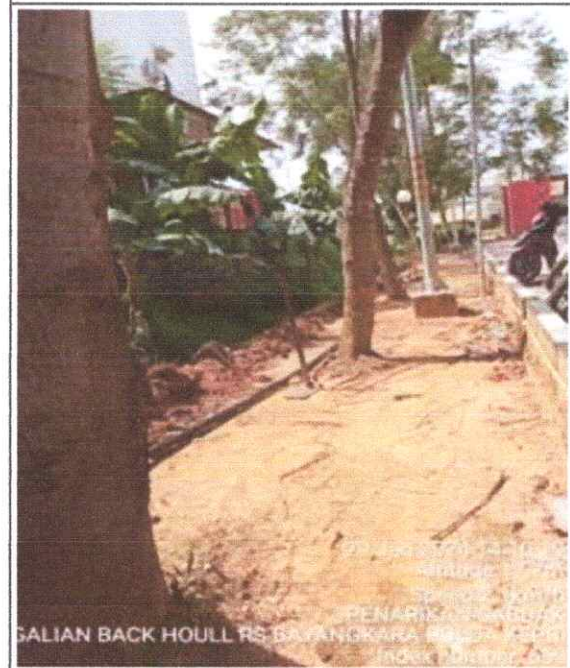

Picture 3

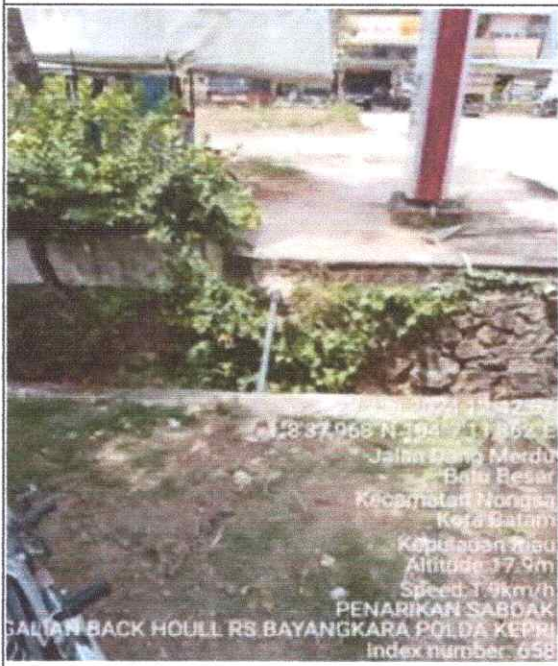

Picture 4



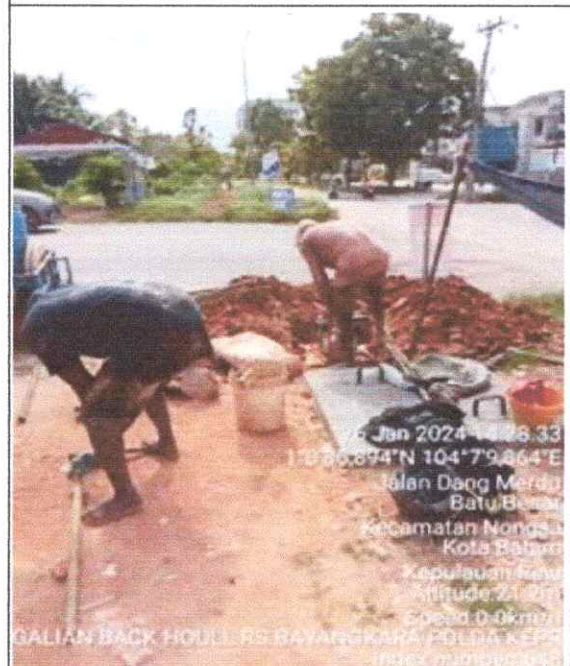


FOTO DOKUMENTASI RS BHAYANGKARA


Picture 1

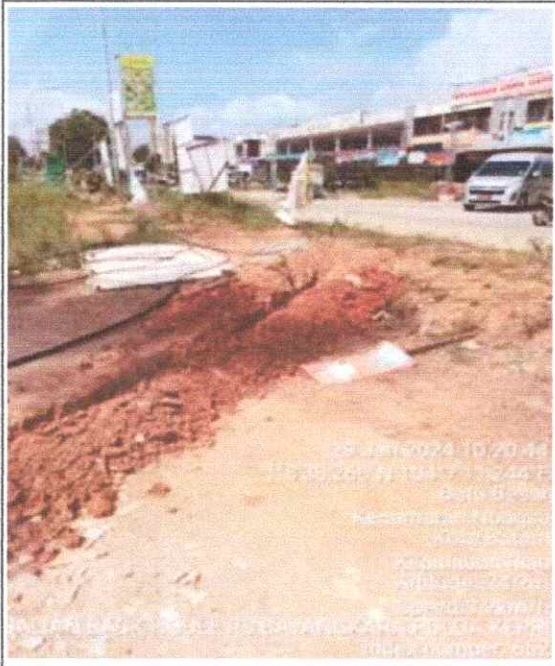

Picture 2

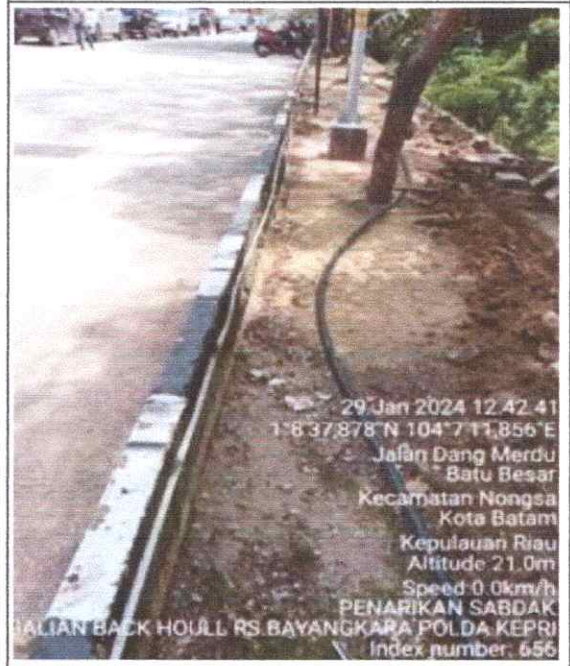

Picture 3

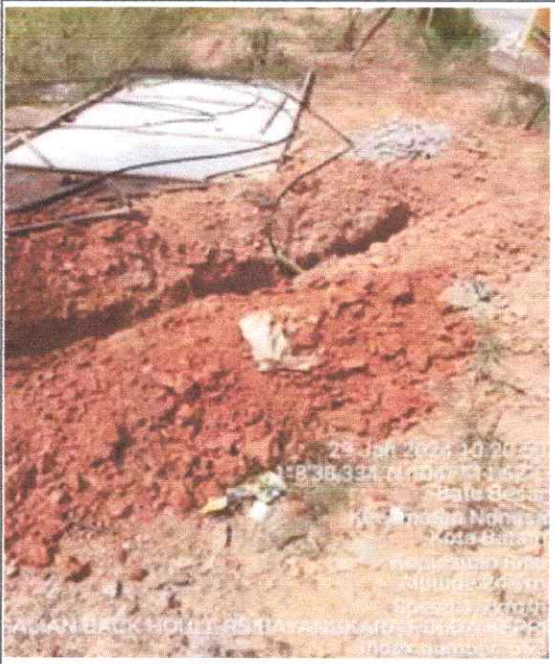


Picture 4




FOTO DOKUMENTASI RS BHAYANGKARA

Picture 1

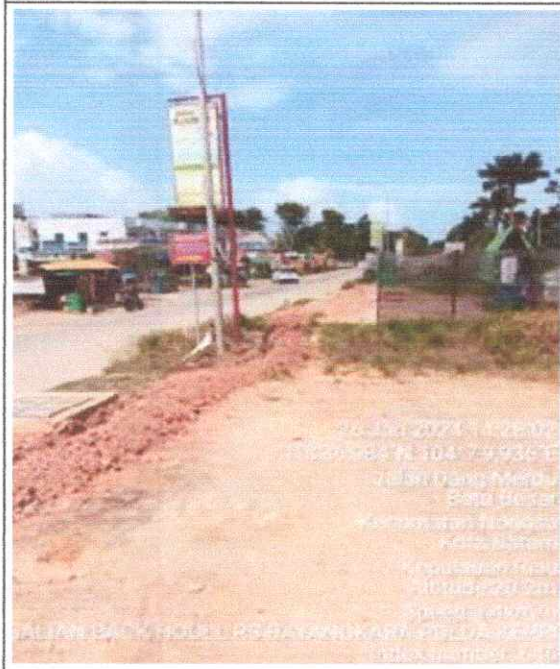

Picture 2

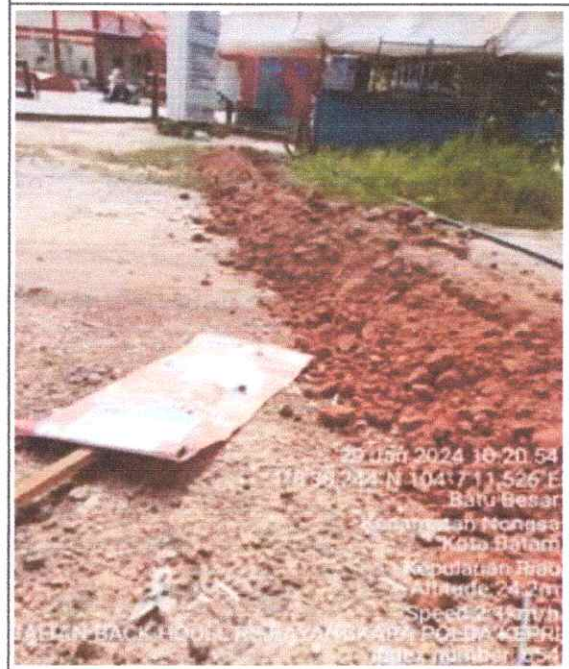

Picture 3



Picture 4

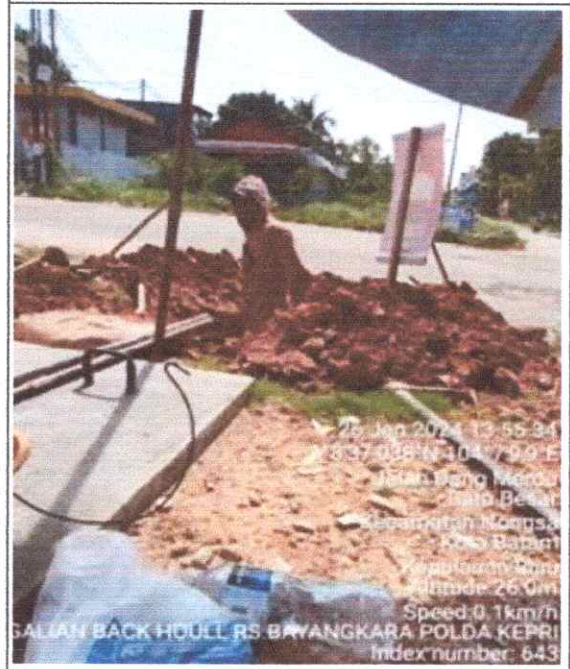


FOTO DOKUMENTASI RS BHAYANGKARA

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4

